

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 280103
REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL
MUNICIPIO: BONAÓ
DISTRITO MUNICIPAL: JUMA BEJUCAL


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de febrero de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
 2. Ing. Edward Acosta

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR MAMARÓ				148.50	2		297
TRAMO B	SECTOR LA GALLERA				168.35	2		336.7
TRAMO C	CALLE MONTE MARIA				144.85	2		289.7
TRAMO D	SECTOR PEÑA GÓMEZ				149.90	2		299.8
TRAMO E	CALLE 2DA				107.5	2		215
TRAMO F	CALLEJÓN DE TOLE				92.1	2		184.2
TRAMO G	EL BOLSILLO 1				24.4	2		48.8
TRAMO H	EL BOLSILLO CALLE PRINCIPAL				116.6	2		233.2
TRAMO I	EL BOLSILLO 2				258	2		516
TRAMO J	CALLEJÓN DE CHIN				193.9	2		387.8
TRAMO K	CALLE 2DA				254	2		508
TRAMO L	CALLE 4TA				23.1	2		46.2
TRAMO M	CALLE 5TA				81.9	2		163.8
TRAMO N	CALLE 3RA				201.7	2		403.4
TRAMO O	CALLE 6TA				64.3	2		128.6
TRAMO P	CALLE 7MA				142.2	2		284.4
TRAMO Q	CALLE LOS ROMEROS				755.9	2		1511.8
Total							0.00	5854.40

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,051,674.98
 Monto desembolsado RD\$ 5,051,674.98 (100%)
 Avance de obra 290.11%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL
MUNICIPIO: BONAÓ
DISTRITO MUNICIPAL: JUMA BEJUCAL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de febrero de 2023

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 5,854.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Se ejecutó esta obra por contrato.
2. Solo se ejecutaron contenes por demanda de los municipes.
3. Los contenes presentaban buena terminación visual al momento de la visita.

IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

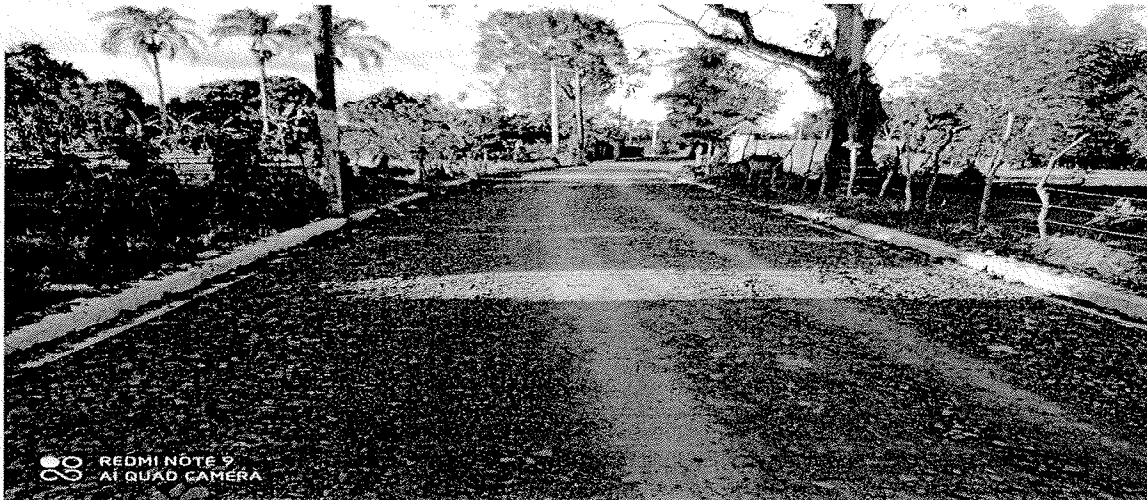

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico


ING. EDWARD ACOSTA
Técnico

