



LIGA MUNICIPAL  
-DOMINICANA-


SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 6 de mayo de 2022  
 1. Ing. Danilo Mercado  
 TÉCNICOS: 2. Elizabeth García

CODIGO: 280303  
 REGIÓN: CIBAO SUR  
 PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL  
 MUNICIPIO: PIEDRA BLANCA  
 DISTRITO MUNICIPAL: JUAN ADRIÁN

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CI (REFERENCIA SUPER COLMADO EL SANTIAGUERO)	16.90	0.70	1	16.90	1	11.83	16.9
TRAMO B		78.70	0.50	1	127.70	1	39.35	127.7
TRAMO C		0.00		1	17.30	1	0	17.3
TRAMO D		35.30	0.70	1	35.3	1	24.71	35.3
TRAMO E		4.20	0.88	1	42.2	1	3.696	42.2
TRAMO F		42.50	0.67	1	42.5	1	28.475	42.5
TRAMO G		50.00	0.67	1	101.4	1	33.5	101.4
Total							141.561	383.3

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA  
 Monto asignado RD\$ 2,963,494.03  
 Monto desembolsado RD\$ 1,481,747.02 50%  
 Avance de obra 38.16%



# LIGA MUNICIPAL -- DOMINICANA --

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR

PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL

MUNICIPIO: PIEDRA BLANCA

DISTRITO MUNICIPAL: JUAN ADRIÁN

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 6 de mayo de 2022



## REPORTE


A la fecha de 06/05/2022 se ha ejecutado 141.56 metros cuadrados de aceras y 383.30 metros lineales de contén, lo que corresponde al 38.16% del fondo asignado para este territorio.

## NOTAS



1. En uno de los tramos intervenido donde se tiene construido los contenes, pudimos observar que el material de relleno de la calle esta por encima del nivel de los contenes donde se hizo hincapié al respecto.

## IMÁGENES

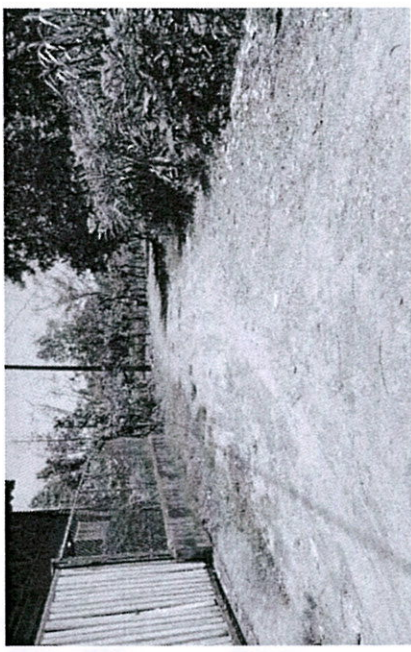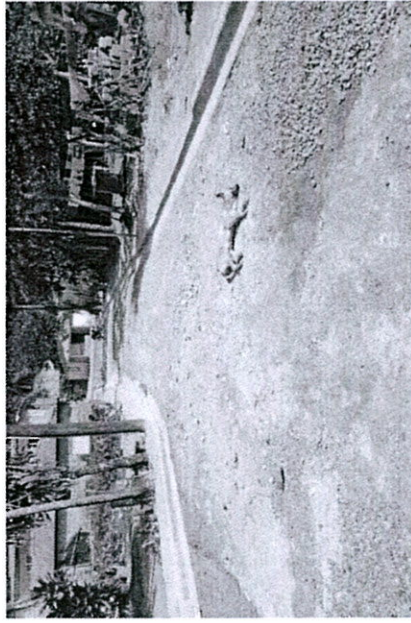



LIGA MUNICIPAL  
-- DOMINICANA --

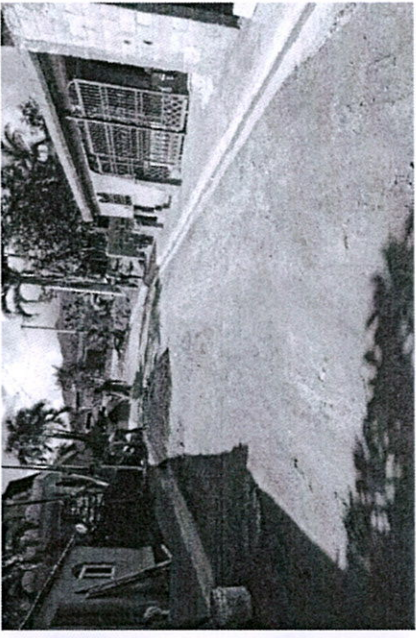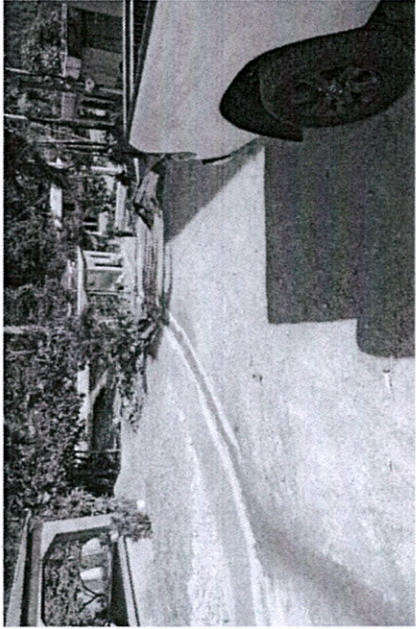

Suministra los datos de este reporte,

*Juan D. Mercado*  
ING. DANILO MERCADO  
Técnico

