



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 220503

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: SAN JUAN

MUNICIPIO: LAS MATAS DE FARFÁN

DISTRITO MUNICIPAL: CARRERA DE YEGUA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28/10/2022


1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	COPEYSANO	165.40	1.00	1	165.40	1	165.4	165.4
TRAMO B	INDEPENDENCIA	166.00	1.00	1	166.00	1	166	166
TRAMO C	INDEPENDENCIA	234.80	1.00	1	234.80	1	234.8	234.8
TRAMO D	COPEYSANO	95.30	1.00	1	95.30	1	95.3	95.3
TRAMO E	COPEYSANO	93.20	1.00	1	93.2	1	93.2	93.2
TRAMO F	COPEYSANO	15.60	1.00	1	22.9	1	15.6	22.9
TRAMO G	CARR.PRINCIPAL(Guayacan)	152.50	1.00	2	148.55	2	305	297.1
TRAMO H	CARR.PRINCIPAL(TABACAL)				125	2		250
Total							1075.30	1324.70

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,193,851.17
Monto desembolsado RD\$ 3,193,851.17 (100%)
Avance de obra 145.44%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28/10/2022

PROVINCIA: SAN JUAN

MUNICIPIO: LAS MATAS DE FARFÁN

DISTRITO MUNICIPAL: CARRERA DE YEGUA


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,075.30 metros cuadrados de aceras y 1,324.70 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. La obra se realizó por Contrato.
2. Este proyecto cumple con los estándares recomendado por el Programa.

IMÁGENES

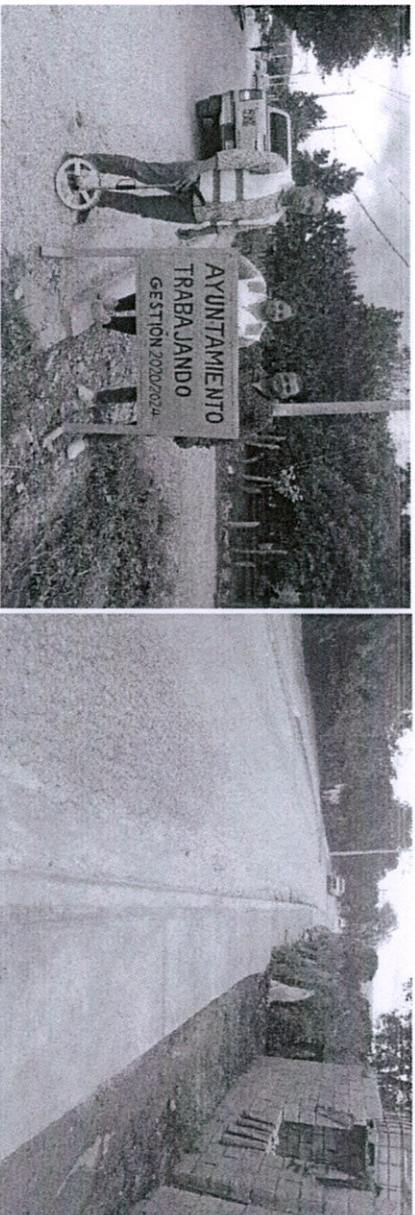





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

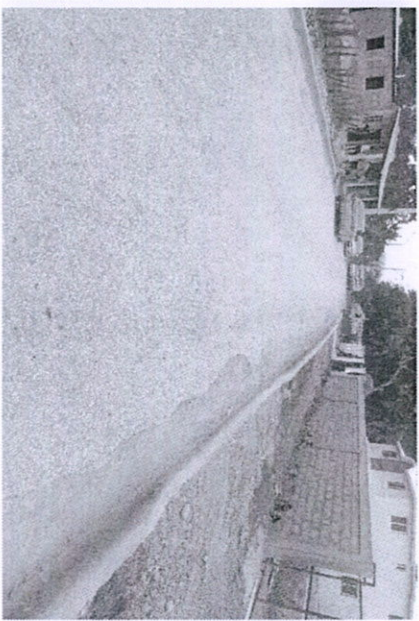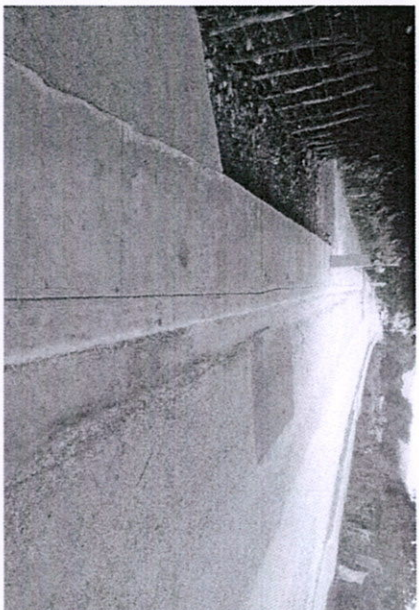

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


ING. DANILLO MERCADO
Técnico

