



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 290101

REGIÓN: HIGUAMO

PROVINCIA: MONTE PLATA

MUNICIPIO: MONTE PLATA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 26 de agosto de 2022


1. Ing. Asamin Ferreras

TÉCNICOS: 2. Ing. Félix Tavárez

| TRAMOS | NOMBRE DE LA CALLE | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m2) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|--------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TRAMO A | Calle 1 | | | | 187 | 2 | | 374 |
| TRAMO B | Cont. Calle 1 | | | | 59.7 | 2 | | 119.4 |
| TRAMO C | Calle 2 | | | | 42.4 | 2 | | 84.8 |
| TRAMO D | Cont. Calle 2 | | | | 40 | 2 | | 80 |
| TRAMO E | Calle 3 | | | | 150.1 | 2 | | 300.2 |
| TRAMO F | Cont. Calle 3 | | | | 150.1 | 2 | | 300.2 |
| TRAMO G | Calle 4 | | | | 189.5 | 2 | | 379 |
| TRAMO H | Cont. Calle 4 | | | | 122 | 2 | | 244 |
| TRAMO I | Calle 5 | | | | 69.5 | 2 | | 139 |
| TRAMO J | Calle principal | | | | 72 | 2 | | 144 |
| Total | | | | | | | 0 | 2164.6 |

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Monto asignado | RD\$ 5,447,208.17 |
| Monto desembolsado | RD\$ 2,723,604.09 (50%) |
| Avance de obra | 100.61% |



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 26 de agosto de 2022

PROVINCIA: MONTE PLATA

MUNICIPIO: MONTE PLATA

DISTRITO MUNICIPAL: -

REPORTE


A la fecha de 26/08/yyyy se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,164.60 metros lineales de contén, lo que corresponde al 100.61% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. En esta visita de inspección, pudimos observar que en el municipio de Monte Plata, solo van a construir contenes para aprovechar el programa de asfaltado.
2. Esta obra se está ejecutando vía gobierno local.
3. Los puntos de la coordenada fueron tomados por el gps del celular.


IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

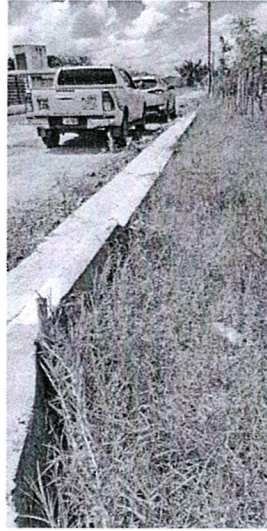



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

ING. ASAMÍN FERRERAS

Técnico

ING. FÉLIX TAVÁREZ

Técnico

