



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 290102

**REGIÓN:** HIGUAMO

**PROVINCIA:** MONTE PLATA

**MUNICIPIO:** MONTE PLATA

**DISTRITO MUNICIPAL:** DON JUAN

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 17 de mayo de 2023

1. Elizabeth García

**TÉCNICOS:** 2. Arq. Zunilda Del Rosario


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECCION FRIAS				10.40	1.00		10.40
TRAMO B	C/J. HECTOR DIAZ	209.38	0.96	1.00	260.70	1.00	200.98	260.70
TRAMO C	C/LUPERON SECTOR LA CASITA	329.90	1.04	1.00	329.90	1.00	342.30	329.90
TRAMO D	TRIPLE OZAMA	514.58	1.02	1.00	260.70	1.00	526.59	260.70
<b>Total</b>							<b>1,069.87</b>	<b>861.70</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,399,697.62

Monto desembolsado RD\$ 1,699,848.81 (50%)

Avance de obra 106.28%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN: HIGUAMO**

**FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17 de mayo de 2023**

**PROVINCIA: MONTE PLATA**

**MUNICIPIO: MONTE PLATA**

**DISTRITO MUNICIPAL: DON JUAN**



## **INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,069.87 metros cuadrados de aceras y 861.70 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### **NOTAS**




1. Esta obra se esta ejecutando por contrato.
2. Esta obra debido a la topografía del terreno se evidencia la colocación de bloques y vigas de amarre para contener el relleno.
3. Este proyecto se esta ejecutando con las especificaciones técnicas recomendada por el programa de aceras y contenes.

### **IMÁGENES**

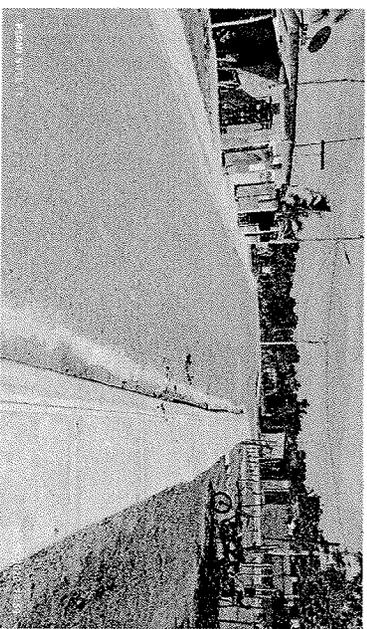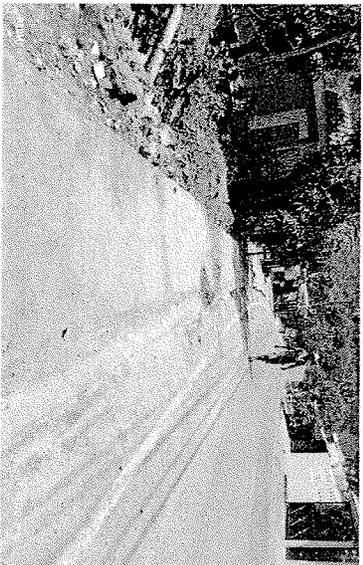



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

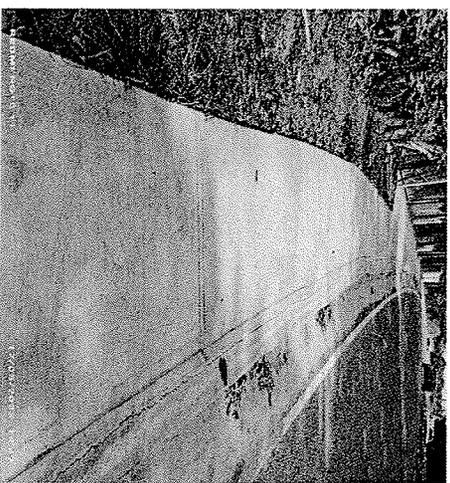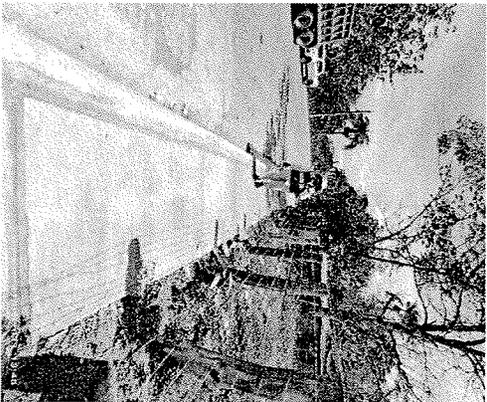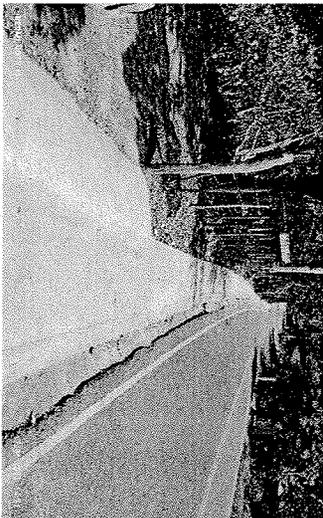

Suministra los datos de este reporte,

  
ELIZABETH GARCÍA  
Técnico

  
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO  
Técnico
