



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 290501

REGIÓN: HIGUAMO

PROVINCIA: MONTE PLATA

MUNICIPIO: PERALVILLO

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de noviembre de 2022

1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	FRENTE FERRECENTRO ALEXANDER	180.10	1.50	2	179.90	2	540.3	359.8
TRAMO B	SUNSO DIONICIO FRENTE A MATEA	98.70	0.61	2	98.70	2	120.414	197.4
TRAMO C	COMPRAVENTA JORGE DIONICIO	149.70	1.30	2	165.30	2	389.22	330.6
TRAMO D	FRANCISCO SANCHEZ	172.40	1.70	2	172.40	2	586.16	344.8
TRAMO E	ALREDEDOR DE LA IGLESIA CATÓLICA	120.60	0.90	2	120.6	2	217.08	241.2
Total							1853.17	1473.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,873,267.50

Monto desembolsado RD\$ 2,436,633.75 (50%)

Avance de obra 127.45%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de noviembre de 2022

PROVINCIA: MONTE PLATA

MUNICIPIO: PERALVILLO

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,853.17 metros cuadrados de aceras y 1,473.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. La obra se ejecuto por contrato y todos los trabajos fueron supervisados bajo la supervicion de la alcaldia.
2. El proyecto cumple con los estandares de calidad recomendados.
3. Observamos algunas secciones de tramos destruidos producto por camiones pesados, se nos informo que dichos tramos seran reparados.

IMÁGENES

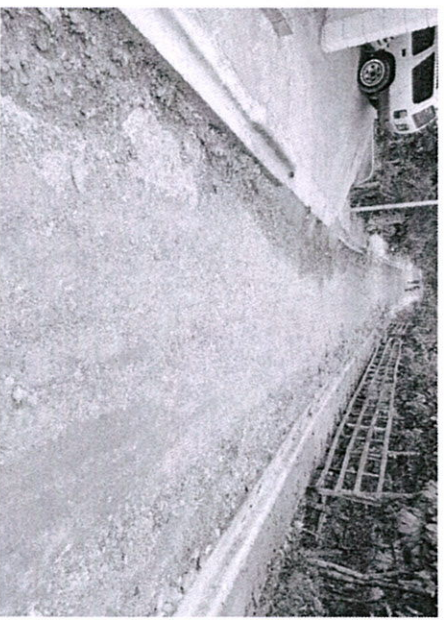



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

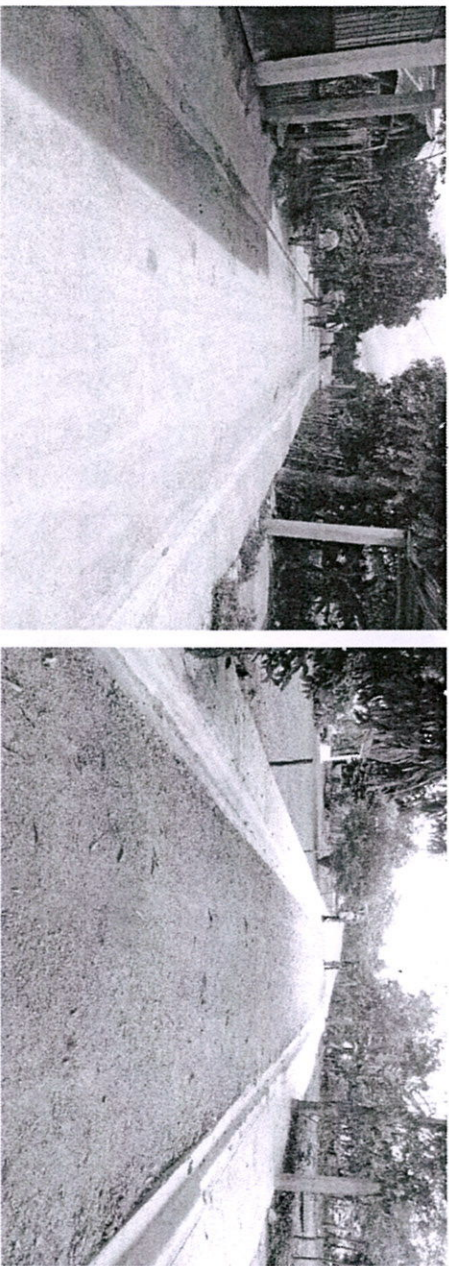

Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILO MERCADO
Técnico


CESAR DE LOS SANTOS
Técnico

