

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 300.102

REGIÓN: HIGUAMO

PROVINCIA: HATO MAYOR

MUNICIPIO: HATO MAYOR

DISTRITO MUNICIPAL: YERBA BUENA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16 de noviembre de 2022

1. Ing. Staylin Mendoza

TÉCNICOS: 2. Felipe Reyes


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LOS RAMIREZ	90.00	1.00	1.00	183.40	1.00	90.00	183.40
TRAMO B	CALLE DUARTE	32.40	1.00	1.00	32.40	1.00	32.40	32.40
TRAMO C	CALLE DUARTE	117.70	1.08	1.00	121.40	1.00	127.12	121.40
TRAMO D	CALLE DUARTE	206.60	1.17	1.00	211.10	1.00	241.72	211.10
TRAMO E	CALLE DUARTE	115.40	1.10	1.00	115.40	1.00	126.94	115.40
TRAMO F	CALLE DUARTE	146.30	1.30	1.00	146.30	1.00	190.19	146.30
TRAMO G	LOS RAMIREZ	82.80	1.00	1.00	178.40	1.00	82.80	178.40
Total							891.17	988.40

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,958,396.68

Monto desembolsado RD\$ 2,958,396.68 (100%)

Avance de obra 124.90%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16 de noviembre de 2022

PROVINCIA: HATO MAYOR

MUNICIPIO: HATO MAYOR

DISTRITO MUNICIPAL: YERBA BUENA

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 891.17 metros cuadrados de aceras y 988.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Esta obra fue ejecutada por contrato tantas las aceras como los contenes fuerin ejecutados de manera adecuada bajo los estandaras requeridos
2. tiene muy buena terminacion por lo que se pudo observa, y estos fueron ejecutados en dos calle de diferentes sectores: Los ramires y jibratal.
- 3.

IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

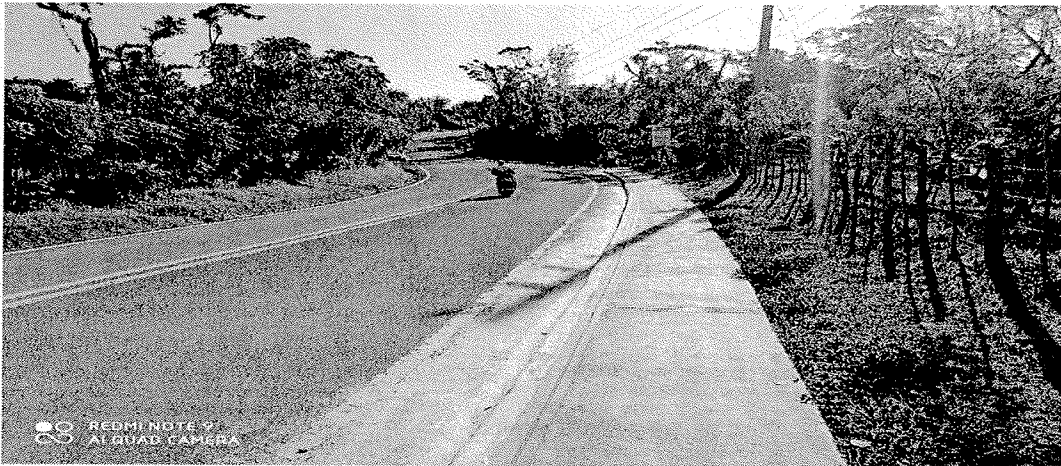

Suministra los datos de este reporte,



ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico



FELIPE REYES
Técnico

