

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 300201
REGIÓN: HIGUAMO
PROVINCIA: HATO MAYOR
MUNICIPIO: SABANA DE LA MAR
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 15 de junio de 2023

- TÉCNICOS:**
1. Ing. Staylin Mendoza
 2. Arq. Keilin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR PAJARITO	176.10	1.00	2.00	176.10	2.00	352.20	352.20
TRAMO B	SECTOR LAS 5 CASITAS (MAÑANERO)	535.45	1.02	2.00	351.80	2.00	1,093.67	703.60
TRAMO C	SECTOR LAS 5 CASITAS (MAÑANERO)	44.45	0.89	2.00	44.45	2.00	79.30	88.90
TRAMO D	SECTOR LAS 5 CASITAS (MAÑANERO)	178.70	1.00	2.00	178.70	2.00	357.40	357.40
TRAMO E	SECTOR LAS 5 CASITAS (MAÑANERO)	207.15	1.01	2.00	218.65	2.00	420.48	437.30
Total							2,303.05	1,939.40

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,094,890.30
Monto desembolsado RD\$ 2,047,445.15 (50%)
Avance de obra 195.17%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 15 de junio de 2023

PROVINCIA: HATO MAYOR

MUNICIPIO: SABANA DE LA MAR

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 2,303.05 metros cuadrados de aceras y 1,939.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Esta obra fue ejecutada en dos (2) sectores.
2. Las aceras y contenes se construyeron de manera conjunta y respetando el ancho recomendado.
3. Tanto las aceras como los contenes presentan una buena terminacion visual tanto en lo estetico como en la calidad
4. Los contenes presenta buena topografia, por lo cual no permite el estancamiento del agua en los mismos.

IMÁGENES

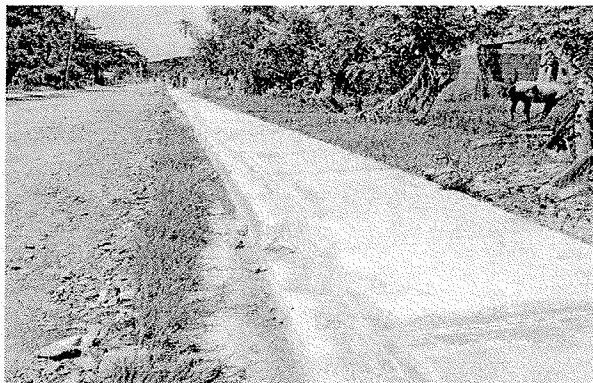





**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

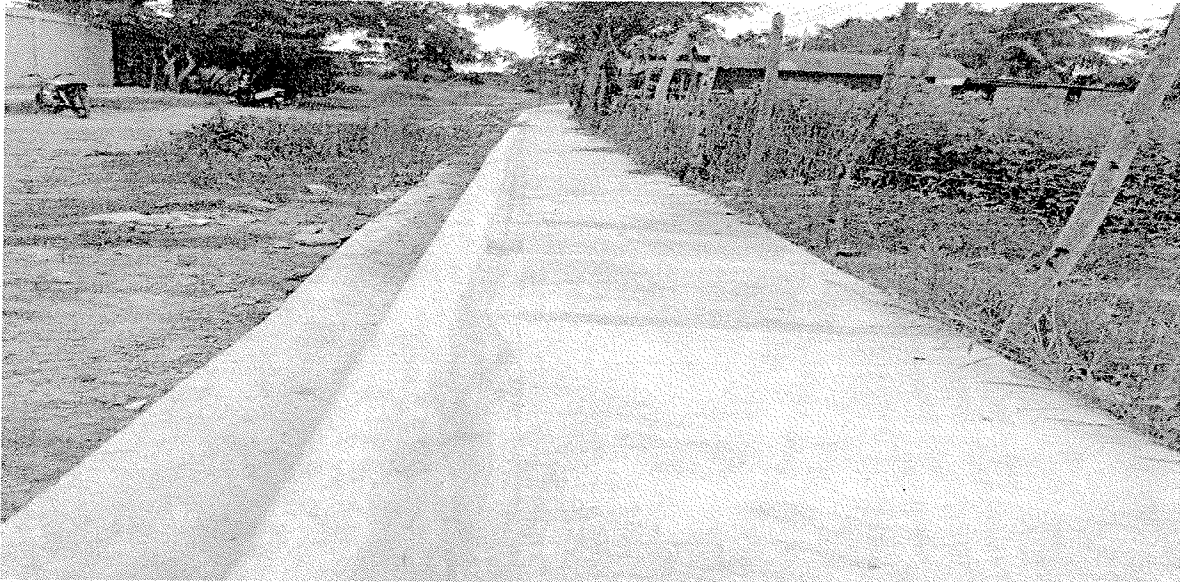

Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico


ARQ. KEILIN MORA
Técnico
