



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 310103
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: SAN JOSÉ DE OCOA
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE OCOA
DISTRITO MUNICIPAL: NIZAO-LAS AUYAMAS

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28-03-2023

TÉCNICOS:
 1. Ing. Edward Acosta
 2. Arq. Zunilda Del Rosario

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR: LA MATICA LA AUYAMA				279.10	1		279.1
TRAMO B	SECTOR: LA MATICA LA AUYAMA				114.90	1		114.9
TRAMO C	SECTOR: EL MACAO PARAJE - LA CUMBRE				414.10	1		414.1
TRAMO D	SECTOR: EL MACAO PARAJE - LA CUMBRE				80.90	1		80.9
TRAMO E	SECTOR: ARROYO SECO PARAJE - LA CUMBRE				319.70	1		319.7
TRAMO F	EL CALLEJÓN DE NIZAO				139.60	1		139.6
TOTAL							0.00	1348.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,909,266.83
 Monto desembolsado RD\$ 2,909,266.84 (100%)
 Avance de obra 119.26%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28-03-2023

PROVINCIA: SAN JOSÉ DE OCOA

MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE OCOA

DISTRITO MUNICIPAL: NIZAO-LAS AUYAMAS

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,348.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Los contenes construidos al momento de la visita cuentan con excelente calidad constructiva.
2. La totalidad de los fondos fuerón destinados para la construcción de contenes.
3. Al momento de la visita se evidenció que algunos tramos de contenes fueron destruidos por equipos pesados, por lo que se les rencomendo su pronta reparación o reconstrucción.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

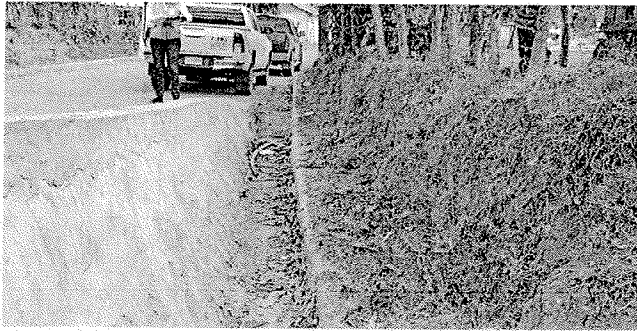

Suministra los datos de este reporte,

Edward A.

ING. EDWARD ACOSTA

Técnico

Zunilda del Rosario G.

ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico
