



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 310104

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: SAN JOSÉ DE OCOA

MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE OCOA

DISTRITO MUNICIPAL: EL PINAR

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28-03-2023

1. Ing. Edward Acosta

2. Arq. Zunilda Del Rosario

TÉCNICOS:


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	HACIA FEDELVA				87.10	1		87.1
TRAMO B	EUGENIA MANCEBO	68.10	0.87	1	106.50	1	59.378	106.5
TRAMO C	PARAJE RANCHO FRANCISCO				129.24	2		258.48
TRAMO D	SECTOR CAPRICHÓ - LA CIENAGA	332.20	0.85	1	554.60	1	281.979	554.6
<b>TOTAL</b>							<b>341.36</b>	<b>1006.68</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,011,756.24

Monto desembolsado RD\$ 1,505,878.12 (50%)

Avance de obra 100.62%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** VALDESIA

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 28-03-2023

**PROVINCIA:** SAN JOSÉ DE OCOA

**MUNICIPIO:** SAN JOSÉ DE OCOA

**DISTRITO MUNICIPAL:** EL PINAR



## **INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 341.36 metros cuadrados de aceras y 1,006.68 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## **NOTAS**



1. Las aceras y contenes construidas al momento de la visita cuentan con excelente calidad constructiva.
2. La mayor parte de los fondos fueron destinados a la construcción de contenes.
3. En el proceso constructivo de las aceras y contenes, tambien se han construido obras complementarias como canaletas y badenes.

## **IMÁGENES**

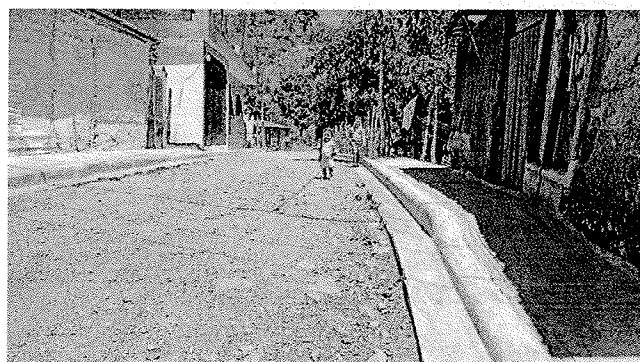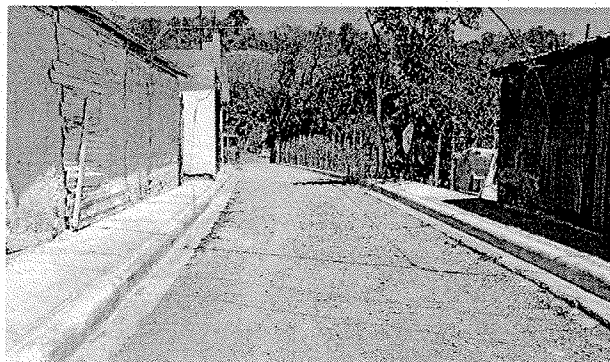



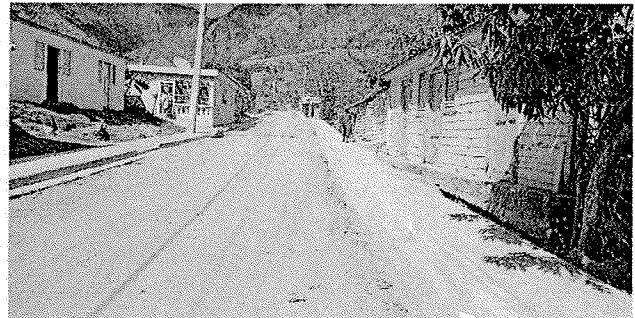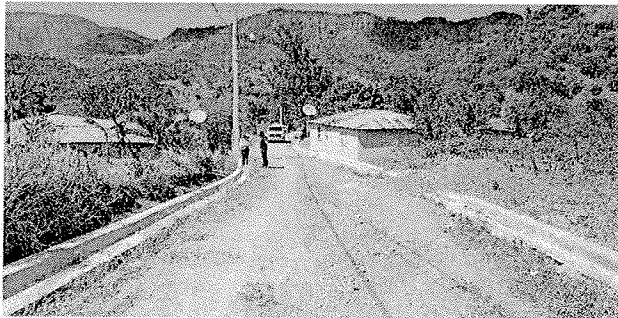

# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



*Suministra los datos de este reporte,*

  
ING. EDWARD ACOSTA  
Técnico

  
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO  
Técnico
