



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 320401

REGIÓN: OZAMA

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: BOCA CHICA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 24 de agosto de 2022

1. Ing. Asamín Ferreras

TÉCNICOS: 2. Ing. Staylin Mendoza


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ CACHIMBO	22.24	1.00	1	94.20	1	22.24	94.2
TRAMO B	C/ CACHIMBO	3.90	1.00	1	142.80	1	3.9	142.8
TRAMO C	C/ CACHIMBO	0.00	1.00	1	90.10	1	0	90.1
TRAMO D	C/ CACHIMBO				37.95	2		75.9
TRAMO E	C/ LAS AMERICA				243.8	2		487.6
TRAMO F	C/ LAS AMERICA				101.8	2		203.6
TRAMO G	C/ LAS AMERICA				49	2		98
TRAMO H	C/ LAS AMERICA				46.25	2		92.5
TRAMO I	C/ LAS AMERICA				48.9	2		97.8
TRAMO J	C/ RES. LA MILAGROSA				28.95	2		57.9
TRAMO K	C/ RES. LA MILAGROSA				57.7	2		115.4
TRAMO L	C/ RES. LA MILAGROSA				14.1	2		28.2
TRAMO M	C/ RES. LA MILAGROSA				30	2		60
TRAMO N	C/ RES. LA MILAGROSA				35.35	2		70.7
TRAMO O	C/ RES. LA MILAGROSA				23.2	2		46.4
TRAMO P	C/ RES. LA MILAGROSA				42	2		84
TRAMO Q	C/ FELIPE OZUNA	38.38	1.00	1	75.95	2	38.38	151.9
TRAMO R	C/ FELIPE OZUNA				129.8	1		129.8
TRAMO S	C/ BUFONES				106.2	2		212.4
TRAMO T	C/ MORENO				127.1	2		254.2
Total							64.52	2593.4

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 11,161,670.32

Monto desembolsado RD\$ 5,580,835.16 (50%)

Avance de obra 60.79%



LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 24 de agosto de 2022

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: BOCA CHICA

DISTRITO MUNICIPAL: -



REPORTE


A la fecha de 24/08/2022 se ha ejecutado 64.52 metros cuadrados de aceras y 2,593.40 metros lineales de contén, lo que corresponde al 60.79% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Se construyeron más metros líneas de contenes que metros cuadrados de aceras.
2. Los contenes presentan buena terminación visual.
3. Varios de los tramos de contenes tenían su muro cabezal con un espesor mayor al habitual y el ancho de su batea de 0.20 m, menor a lo recomendado.
4. Se construyeron varios imbornales con su respectivo filtrantes debido a la topografía de la zona, la cual no tiene un destino final para las aguas.

IMÁGENES

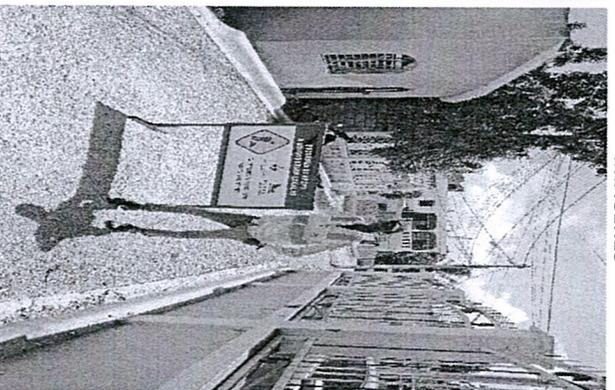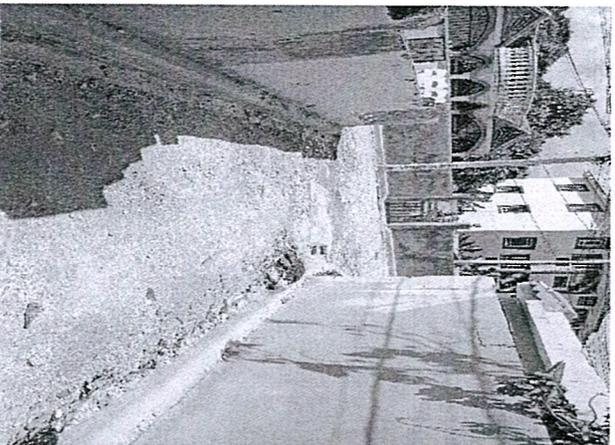



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

© 2011 LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA

Suministra los datos de este reporte,



ING. ASAMÍN FERRERAS
Técnico



ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico

