

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 030501

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BAHORUCO

MUNICIPIO: LOS RÍOS

DISTRITO MUNICIPAL: -


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17 de mayo de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE LOS GUANDULES				134.90	2.00		269.80
TRAMO B	CALLE EL FARO				94.20	2.00		188.40
TRAMO C	CALLE GUAYACANES DEL CERRO				88.10	1.00		88.10
TRAMO D	C/ BONIFACIO SIERRA				78.50	2.00		157.00
TRAMO E	C/CTC				399.00	1.00		399.00
TRAMO F	MARIO PEREZ				250.60	2.00		501.20
TRAMO G	C/ LAGO ENRIQUILLO	46.10	1.00	1.00	306.70	1.00	46.10	306.70
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							46.10	1,910.20

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,232,460.94
Monto desembolsado RD\$ 3,232,460.94 (100%)
Avance de obra 154.89%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BAHORUCO

MUNICIPIO: LOS RÍOS

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17 de mayo de 2023



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 46.10 metros cuadrados de aceras y 1,910.20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Este Gob. Local esta construyendo por administracion
2. La mayoría de tramos solo cuentan con coneres para incluir las calles en programa de asfaltado
3. Los contenes que esta realizando este Gob. Local cuentan con buena terminacion

IMÁGENES

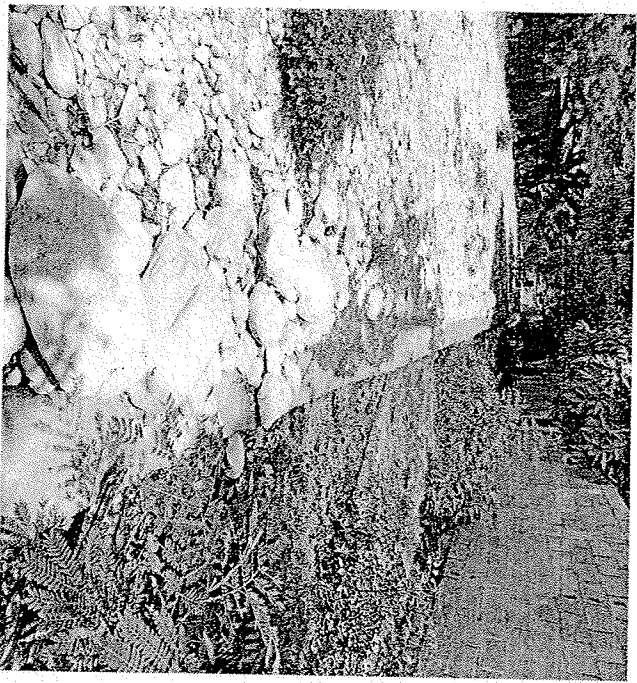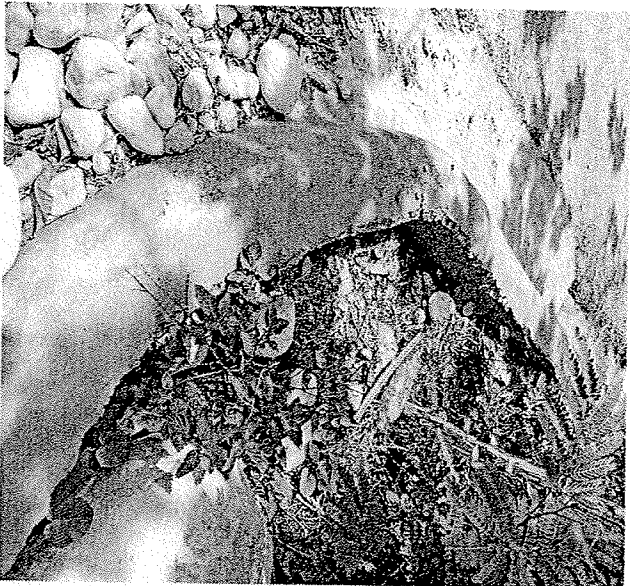




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

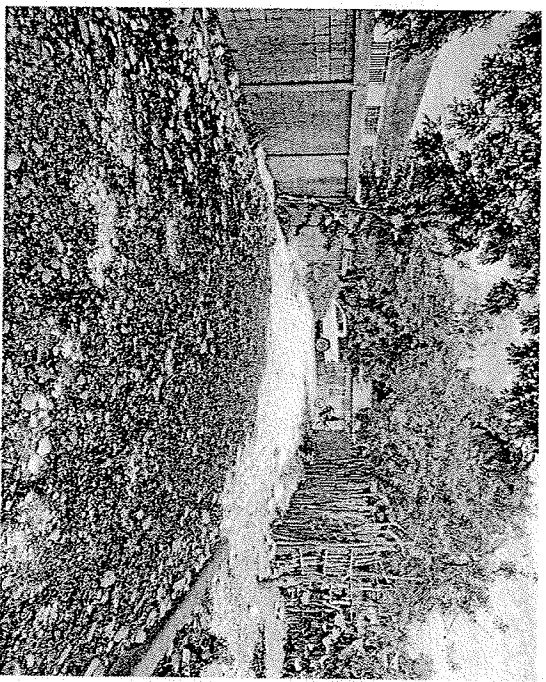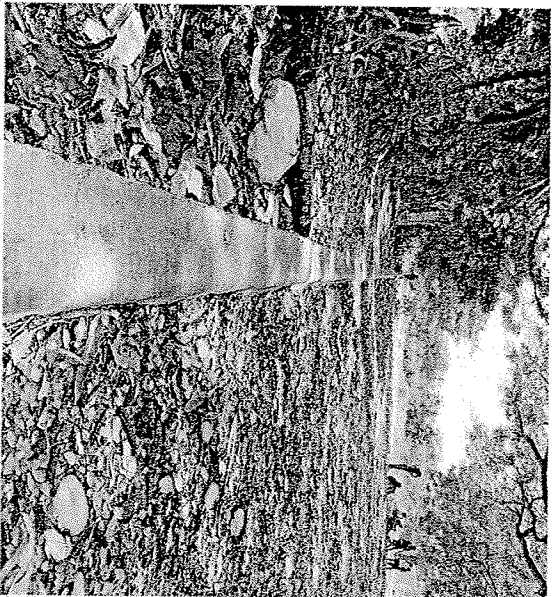

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDIRA RAMIREZ

Técnico


CESAR DE LOS SANTOS

Técnico

