



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020106
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: AZUA
MUNICIPIO: AZUA
DISTRITO MUNICIPAL: BARRERAS


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 27 de marzo de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
2. Ing. Staylin Mendoza


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (M)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRECTERA LOS NEGROS-BARRERA	515.50	1.00	2	515.50	2	1031	1031
Total							1031.00	1031.00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,862,956.81
Monto desembolsado RD\$ 1,431,478.41 (50%)
Avance de obra 139.07%



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

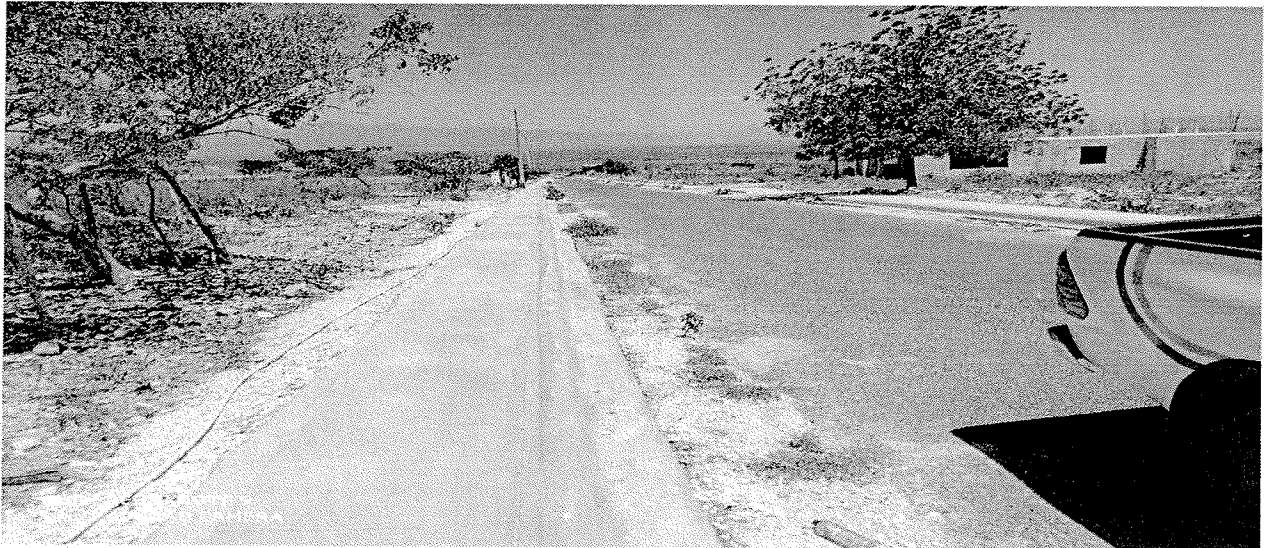

Suministra los datos de este reporte,

ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico

S. Staylin M.H.
ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico
