



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020501

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: PERALTA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 30 de mayo de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Rámirez
2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ La Mina, Sec. Carrizal	139.90	1.00	1.00	164.20	1.00	139.90	164.20
TRAMO B	C/ PRINCIPAL	145.60	1.00	2.00	145.60	2.00	291.20	291.20
TRAMO C	CALLE B	126.30	1.00	1.00	126.30	1.00	126.30	126.30
TRAMO D	CALLE C	692.40	1.00	1.00	692.40	1.00	692.40	692.40
TRAMO E		84.70	1.00	1.00	119.80	1.00	84.70	119.80
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1,334.50	1,393.90

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,261,259.34
Monto desembolsado RD\$ 2,130,629.67 (50%)
Avance de obra 124.53%



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIÁ

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: PERALTA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 30 de mayo de 2023



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,334.50 metros cuadrados de aceras y 1,393.90 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Este ayuntamiento esta construyendo por contrato
2. Estas aceras y contenes cumplen con lo recomendado por la LMD
3. Al momento de realizar este levantamiento la alcaldesa estuvo presente

IMÁGENES

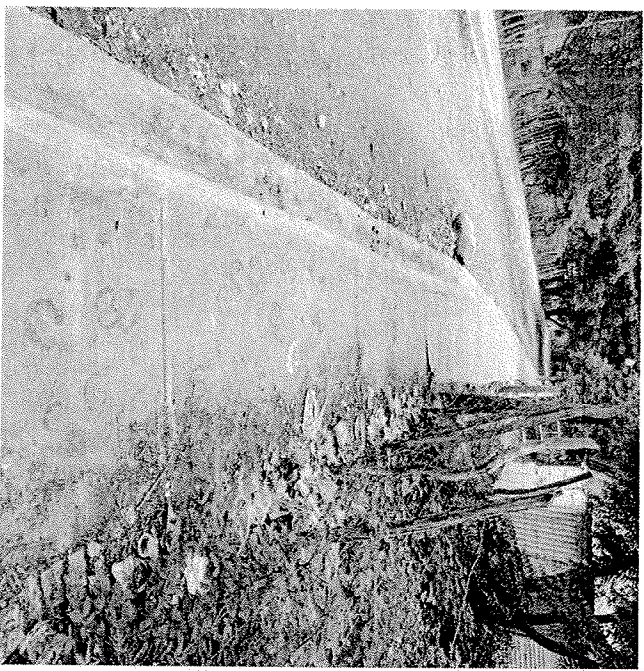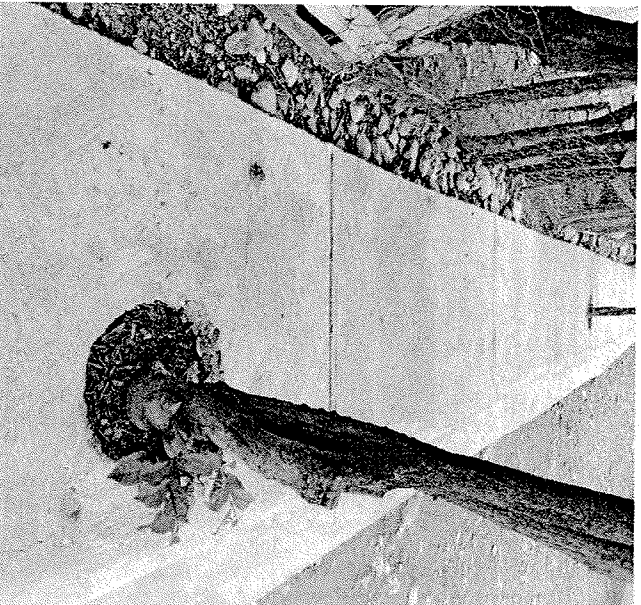





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

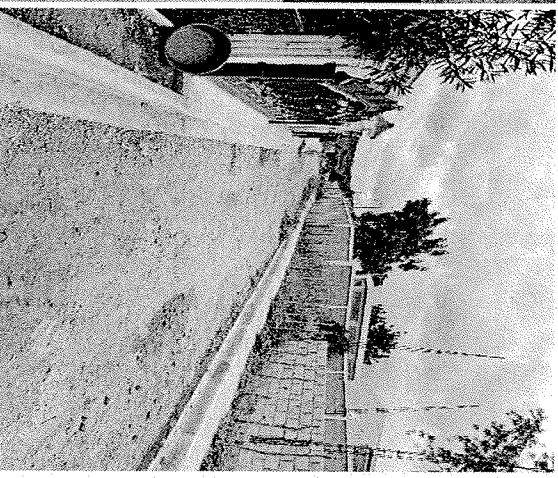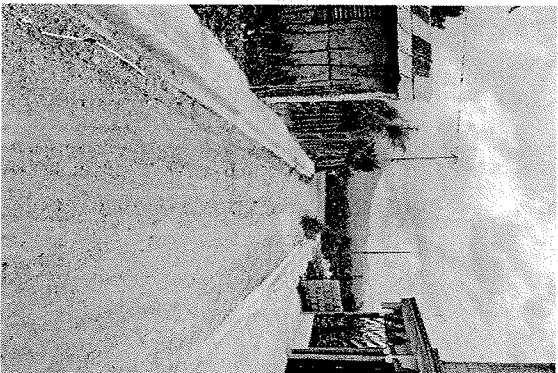

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico

