




**LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA**

Santo Domingo, D.N.
06 de julio de 2023


Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna 
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de obra de la ampliación del
cementerio en el D.M. San José de Matanza**

Mediante el informe presentado por el supervisor de la obra, Validamos que esta se encuentra en un avance del 89 % aproximadamente.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

29 de junio de 2023

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Maria trinidad Sánchez
Municipio nagua
Distrito Municipal San José de Matanza
Barrio y/o sector Las garzas

2. PROYECTO

Reformulado Construcción Nichos, Capilla y Acceso de Entrada Cementerio Las Garzas

Ubicación: Las Garzas. Distrito Municipal San José de Matanza

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA




LATITUD

19.213194

LONGITUD

-96.789986





LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

4. ALCANCE DEL PROYECTO

Construcción de 60 nichos, construcción de bóvedas privada para reubicar en otra área y así reorganizar la distribución, Construcción cubículos en plataforma fosa osamenta, Construcción calzada internas acceso a nichos en hormigón estampado, Construcción capilla fúnebre con porta ataúdes, Reconstrucción y ampliación entrada principal y muro perimetral

CONDICIONES DEL TERRENO


El cementerio está ubicado en la el sector las garzas, carretera el rincón, se encuentra en el área de la entrada a un nivel muy similar al nivel de la calle, luego el terreno va descendiendo hasta la parte de atrás, aproximadamente de entre 15 a 20 centímetros.

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

5. INFORME DE AVANCE



Al momento se encuentran realizado 60 nicho con dimensiones de 0.80 de ancho con profundidad de 2.27 de largo, Capilla es de 6.40x4.40 metros de ancho con una altura promedio de 2.82 metros con 4 ventanales, 2 de cada lado de 2.40x1.80 de ancho con columnas de 0.23x0.27, la plataforma de osamenta tiene 18 cubículos de 0.60x1 metro de profundidad, la bóvedas privadas se encuentra realizadas una fosa de 3.20x2.05 metros de 4 cubículos y otra fosa de 2.49x 2.17 metros de ancho con 2 cubículos realizado, restan por realizar 2 cubículos, 268.52 m2 de pañete de en verja frontal y un total de 133.3 m2 entre calzada internas acceso a nichos y acera peatonal

6. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

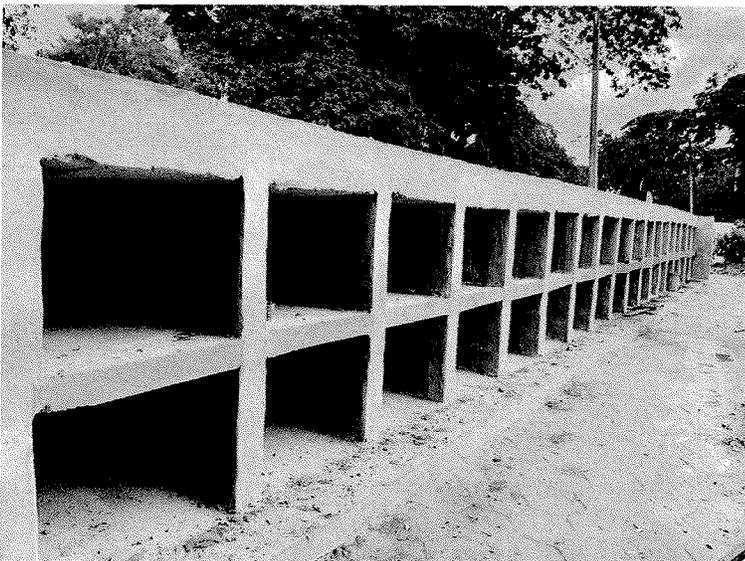




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

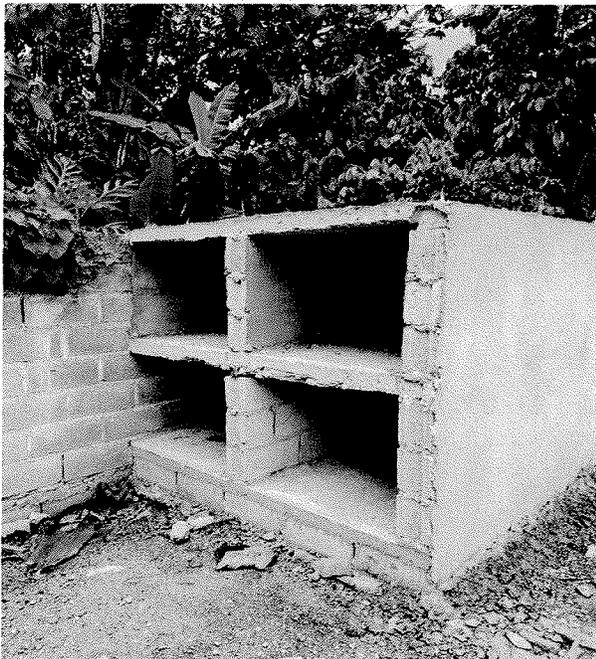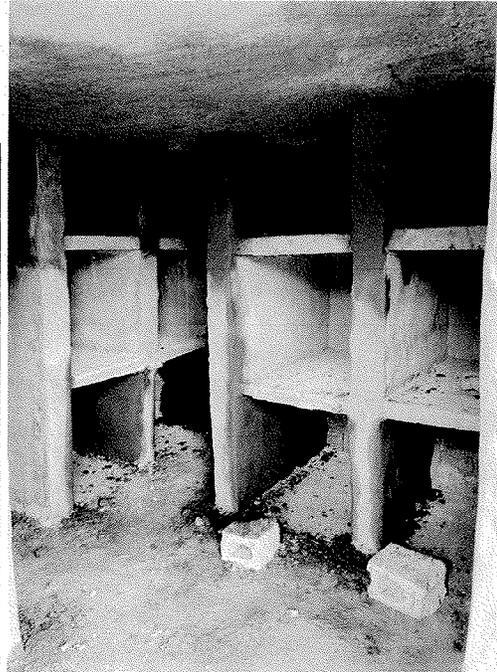



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

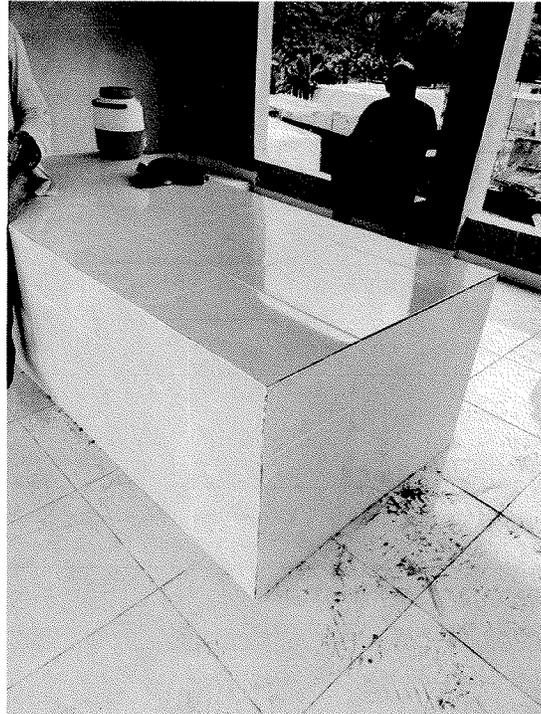



LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA



Nota: Dichas cubriciones deben estar validadas por el contratista y el Gobierno Local

8. OBSERVACIONES

Para completar los trabajos según volumetría de presupuesto restaría completar nichos privados, 11.64 m2 de acera, 5.44 m2 de Pañete en muro de nicho privado, mejorar terminaciones de los cantos existente, 11.48 m2 de Pañete en verja frontal, colocación puerta de hierro, pintura general, cal viva en los nichos, los muros de las jardineras están realizados solo le falta terminación pañete y paisajismo (plantas y tierra), artes gráficos y Letrero de obra.

9. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:



Julissa Muñoz Ortega
Codia: 25464
Cedula: 056-0148422-2
SUPERVISOR



Junior Alexis Espinosa
ALCALDE
distrital san José de Matanza

