



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020108
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: AZUA
MUNICIPIO: AZUA
DISTRITO MUNICIPAL: CLAVELLINA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de julio de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	AVE. BARTOLO BARCELÓ (FRENTE A LA ENTRADA DE VICTORINA)	84.60	2.00	2.00	72.25	2.00	338.40	144.50
TRAMO B	AVE. BARTOLO BARCELÓ	74.60	1.50	2.00	74.60	2.00	223.80	149.20
TRAMO C	SEC. LOS TRAMOJOS C/ 1ERA				66.50	2.00		133.00
TRAMO D	SEC. LOS TRAMOJOS C/ 2DA				80.25	2.00		160.50
TRAMO E	SEC. LOS TRAMOJOS C/ 3ERA	13.00	0.70	1.00	68.65	2.00	9.10	137.30
TRAMO F	SEC. LOS TRAMOJOS C/ 4TA				59.20	2.00		118.40
TRAMO G	SEC. LOS TRAMOJOS C/ 5TA				13.70	1.00		13.70
TRAMO H	SEC. LOS TRAMOJOS C/ 6TA				46.00	2.00		92.00
TRAMO I	SEC. LOS TRAMOJOS C/ 7MA				85.60	2.00		171.20
TRAMO J					63.40	2.00		126.80
Total							571.30	1,246.60

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,896,360.76
Monto desembolsado RD\$ 2,896,360.77 (100%)
Avance de obra 136.17%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de julio de 2023

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: AZUA

DISTRITO MUNICIPAL: CLAVELLINA



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 571.30 metros cuadrados de aceras y 1,246.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS




1. Este gob. Local está ejecutando por contrato.
2. Las aceras y contenes se observan de buena calidad.
3. El alcalde estuvo presente en el levantamiento.

IMÁGENES

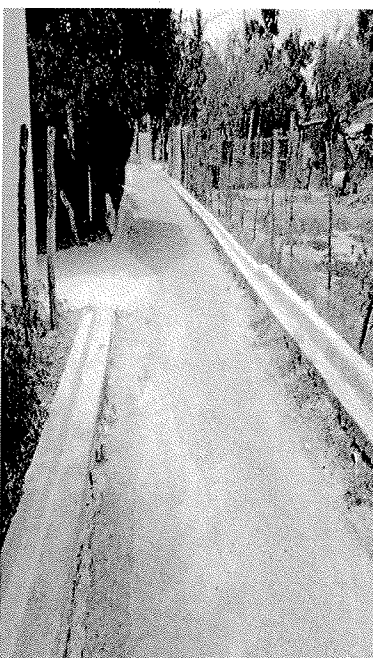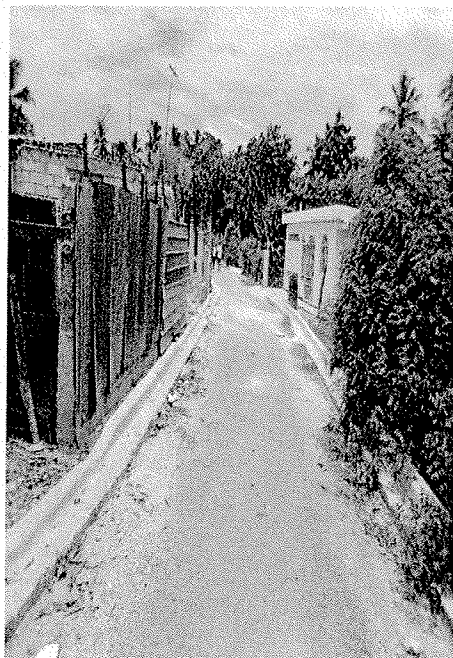



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

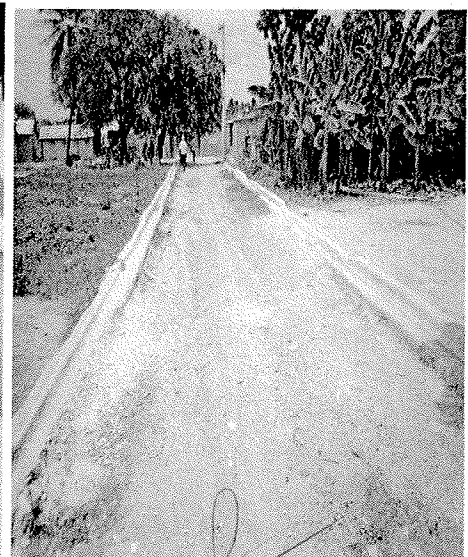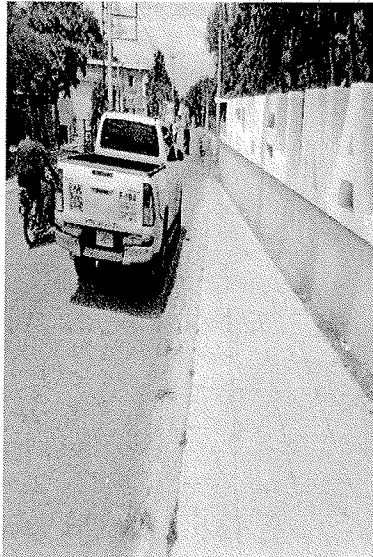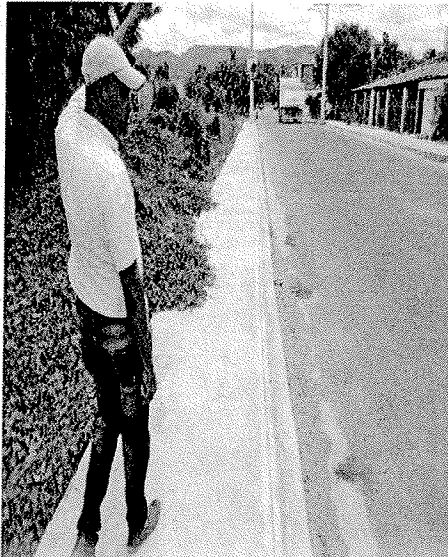

Suministra los datos de este reporte,

ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

CÉSAR DE LOS SANTOS

Técnico
