

Sto. Dgo. de Guzmán



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Santo Domingo, D.N.
10 de noviembre de 2022

Al: Ingeniero
Valentín Santos
Subsecretario de Infraestructuras
Su despacho

Via: Ingeniero
Nelson Peña
Director de Asesoría y Construcciones Municipales

Asunto: Informe de inspección en el Distrito Nacional del Programa de Aceras y Contenes

Muy cordialmente tenemos a bien informarle sobre el levantamiento realizado el día 4 de noviembre en los sectores de Gazcue, Piantini, Cristo Rey, Ensanche Espaillat, Los Girasoles, Los Ríos y María Auxiliadora, y en la fecha 11 de noviembre en los sectores de Honduras y el KM 7 ½, del Distrito Nacional.

Estas visitas se realizaron en compañía de los supervisores del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Arq. Ana Rodríguez y el Ing. Alejandro Cuevas. Estos nos informaron que el ayuntamiento lleva el proceso por contrato, teniendo el Distrito Nacional dividido en varios lotes con diferentes contratistas. Específicamente los sectores que se visitamos corresponden a los lotes 5,6,7 y 8.




Las especificaciones técnicas suministradas por el ayuntamiento a los contratistas son de utilizar hormigón industrial de 280 kg/cm² en aceras y 210 kg/cm² en contenes. En general las intervenciones conllevan demolición pues en la mayoría de los sectores las aceras y contenes están contruidos, pero en muy mal estado.

A continuación, describiremos los aspectos relevantes de las calles y sectores junto con las imágenes tomadas durante el levantamiento.


Informe técnico de levantamiento de inspección

SECTOR : LOS RIOS

En la intersección de las calles Juan María Lora y la Av. Los Próceres existe un drenaje sobre la acera provocando un desnivel en esta, lo que dificulta el paso del peatón. La ejecución de las aceras y contenes en este tramo resulta mas complejo por la existencia de negocios en el área peatonal.

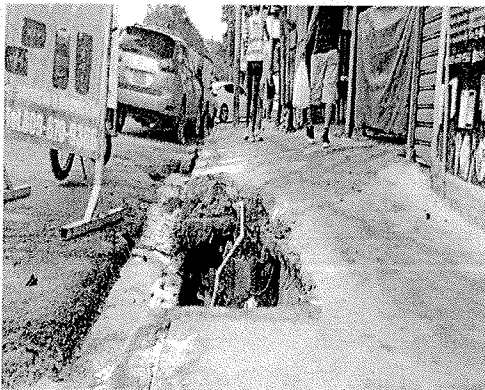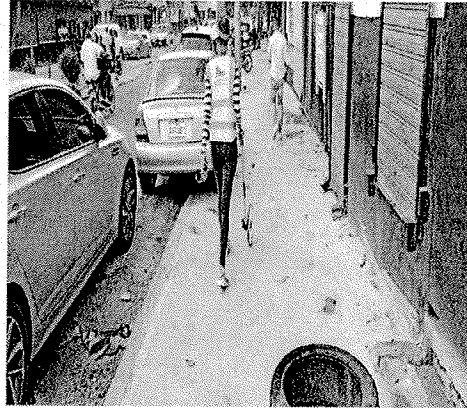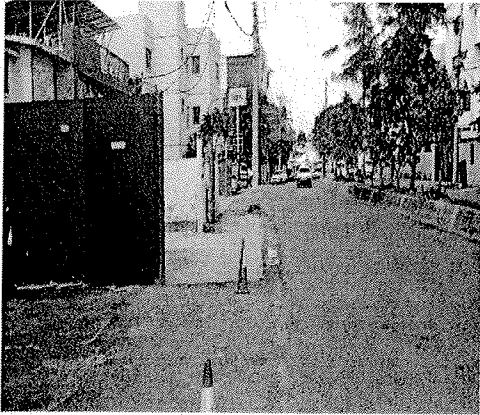

En los demás tramos demolidos y no realizados se debe tomar en cuenta que quedan por debajo del pavimento y de no tomarse las medidas adecuadas el agua inundaría las aceras.

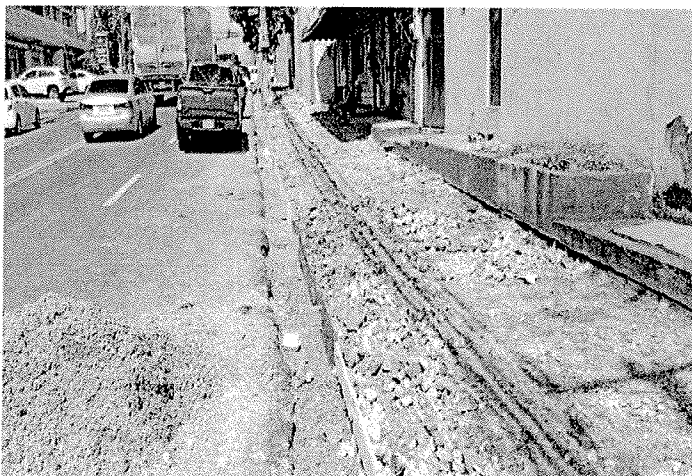


SECTOR: CRISTO REY



En los tramos ejecutados del referido sector, específicamente las calles Ortega y Gasset con Pedro Livio Cedeño, la calidad de los materiales y terminaciones cumplen con las especificaciones técnicas sugeridas para este trabajo.



SECTOR: MARIA AUXILIADORA



En la calle Manuela Diez, comprobamos que realizaron 34.90 m2 de demolición y relleno en las aceras. Las aceras y contenes en estos tramos tienen buena terminación.

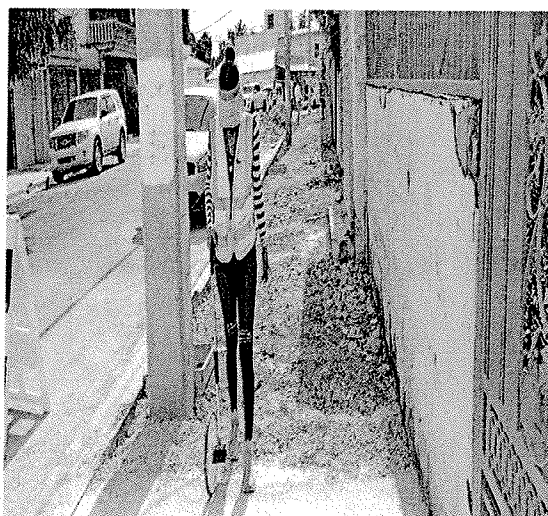

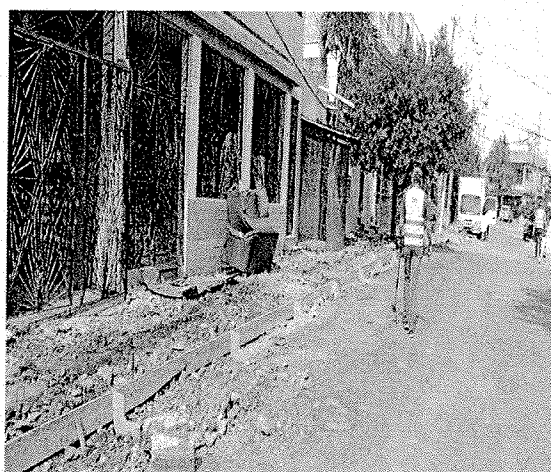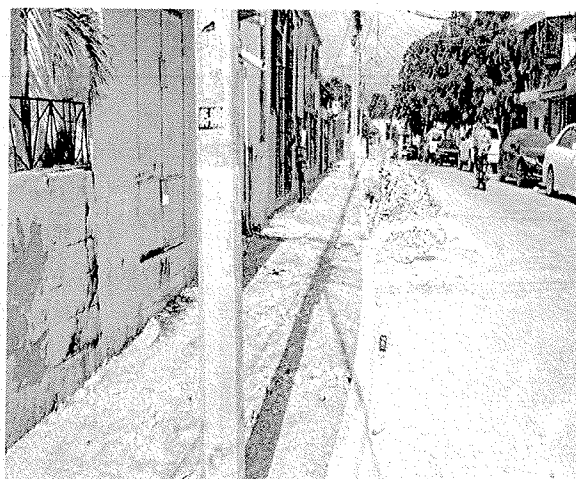

ENSANCHE ESPAILLAT.

En este sector esta programada la ejecución de aceras y contenes correspondiente al perímetro de la escuela Varias Luces. El total de aceras a intervenir es de 163.8 m2.

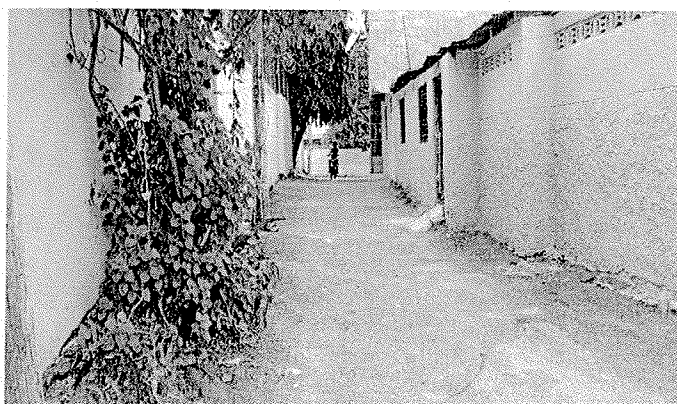
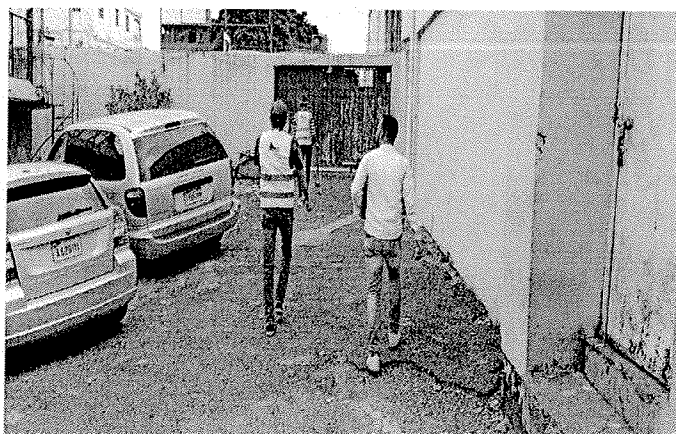


SECTOR PIANTINI

En este sector se presentan diferentes situaciones con la junta de vecinos. Esta sólo permite ejecutar un tramo a la vez, lo que disminuye el ritmo de trabajo.

Todo el concreto es vaciado utilizando hormigón industrial con fibra para evitar rotura por los vehículos que hacen un mal uso de ellas. Las áreas verdes y árboles se conservarán en todos los tramos.



En el tramo de la calle Federico Geraldino comprendido entre la Paseo de los locutores y la Av. Roberto Pastoriza, se realizó un vaciado que luego fue afectado en su terminación por una lluvia imprevista, por lo cual se sugirió realizar un resane en las aceras y contenes del lado este de la vía. En el lado oeste iniciaron los procesos de demolición de aceras y contenes existentes y su respectivo replanteo.

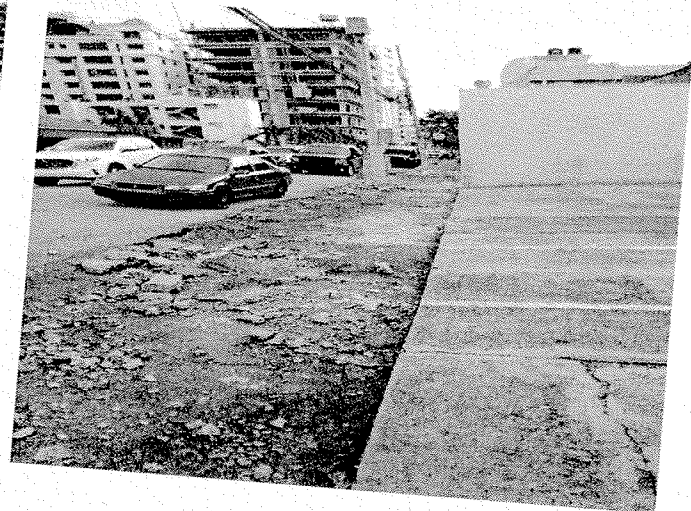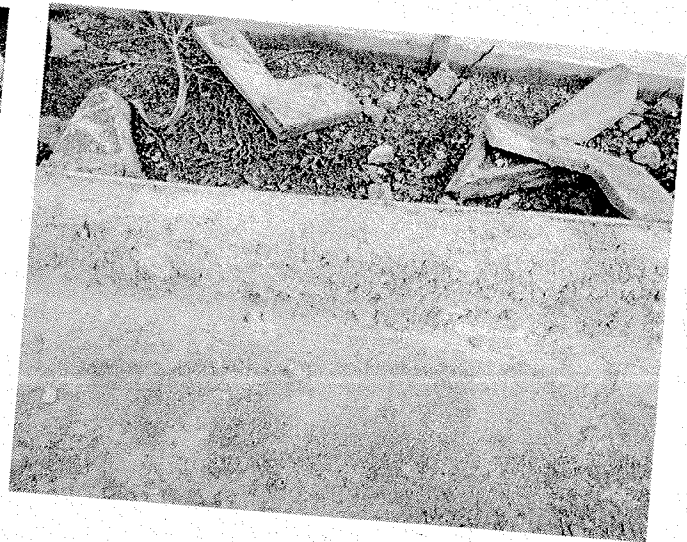


Al momento de la visita de la calle Porfirio Herrera con Av. Abraham Lincoln había una retro-pala haciendo limpieza. En esta parte la lluvia afectó el hormigón vaciado en aceras y contenes, siendo corregido en las aceras y quedando pendiente resanar los contenes.




En la calle Porfirio Herrera esquina calle Federico Geraldino, la supervisora del Ayuntamiento del Distrito Nacional nos informa que han tenido que hacer el vaciado en dos ocasiones a causa de las lluvias imprevistas, y a causa de peatones que transitan por la acera con el hormigón aún fresco haciendo caso omiso a las señalizaciones. Hay un tramo en esta vía en la que sólo se intervinieron las aceras faltando los contenes.

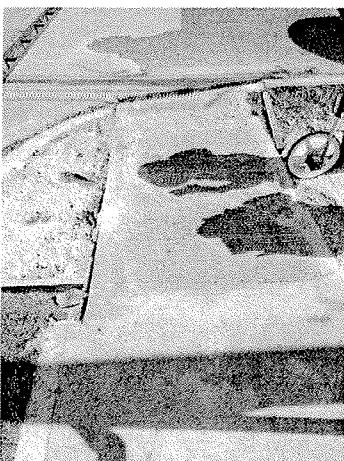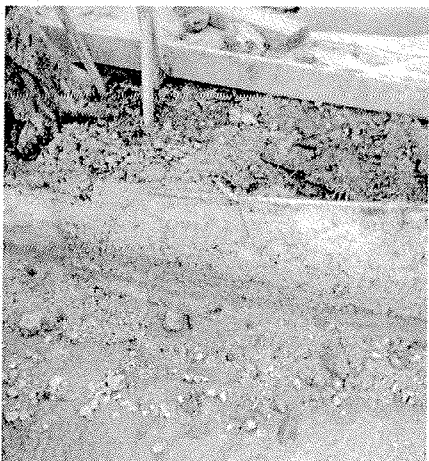

En la calle Freddy Prestol esquina calle David Ben-Gurión se hicieron reparaciones en tuberías de drenaje que fueron afectadas por el proceso de demolición y que no esta contempladas en el presupuesto. Se observó que la terminación y calidad es óptima.

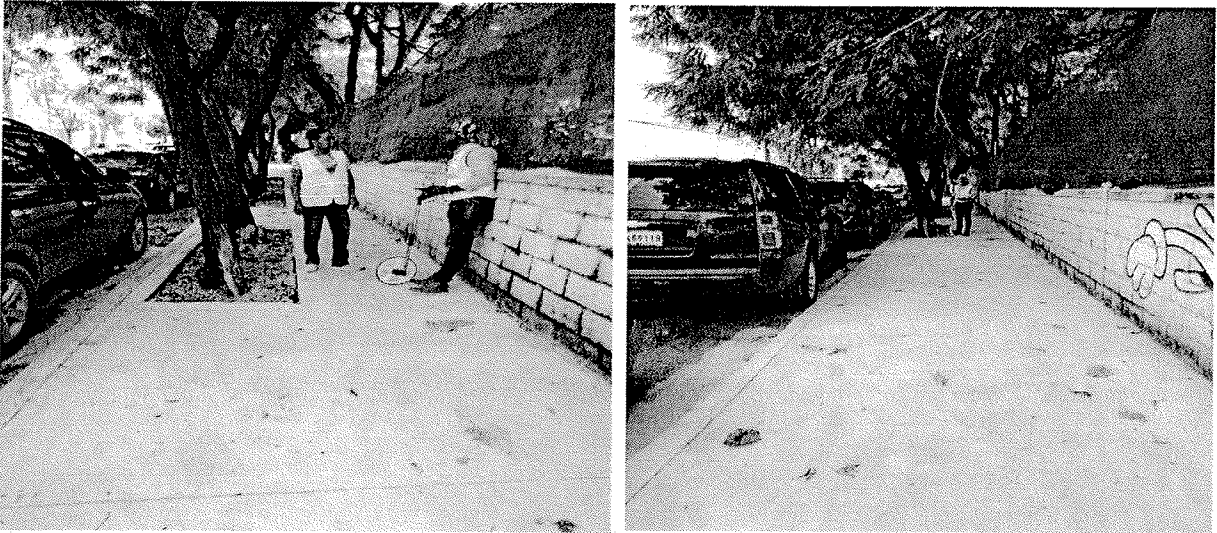

En la calle Manual de Jesús Troncoso esquina calle Héctor Inchaustegui se comprobó que los materiales utilizados en la terminación de aceras y contenes son de buena calidad, y el ancho de la acera de 2.5 m es adecuado para la zona.

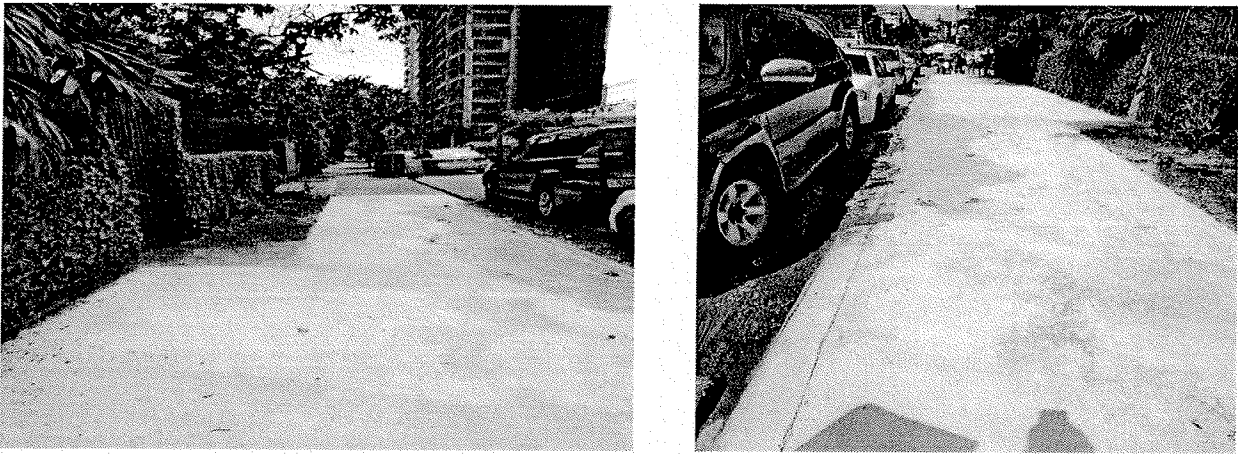

En las demás calles a intervenir en el referido sector no han iniciado el trabajo y le falta identificar cuales tramos en esa vía se ejecutarán.

SECTOR GAZCUE

En la Av. Bolívar se han ejecutado aceras y contenes, desde la esquina con la calle Dr. Delgado hasta la esquina de la calle Juan Isidro Jiménez. Esta vía es un área de mucho flujo vehicular y peatonal por ser un área comercial.

El ancho promedio de las aceras es de 2.5 m a 3 m, el cual es adecuado para el tipo de zona. Cuenta con todas las rampas de acceso vehicular y para discapacitados.


Se mantiene el área verde. Tanto las aceras y contenes fueron ejecutados adecuadamente y se aprecia una buena terminación.



En esto sector se va a intervenir la calle Pasteur desde la Av. George Washington hasta la Av. Bolívar. Tienen planificado iniciar en los próximos días.

KM 7 ½. PARQUE CORAL


Los trabajos en aceras y contenes han concluido. Sólo les falta limpieza general y retirar escombros. La terminación en las aceras es con escoba y cuentan con rampas de acceso para discapacitados. La calidad de materiales y la terminación es muy buena.

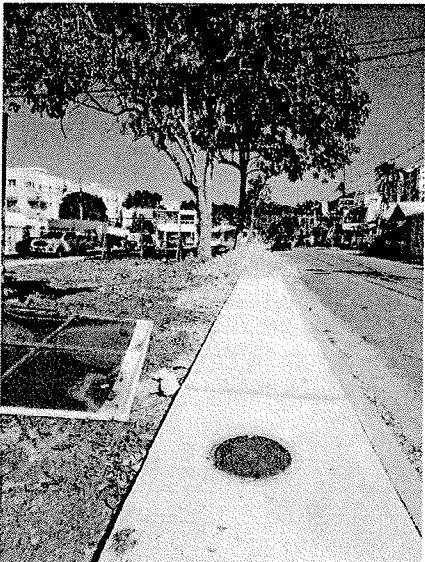

HONDURAS. Parque Honduras (Av. Italia)

Se hicieron todas las aceras exteriores e interiores del parque. Las aceras interiores no están contempladas en el presupuesto, pero serán incluidas en el metraje asignado al Distrito Nacional.

En los contenes se hicieron reparaciones y algunos tramos nuevos. Se mantuvieron todas las áreas verdes en las aceras y no se contemplaron rampas para discapacitados.

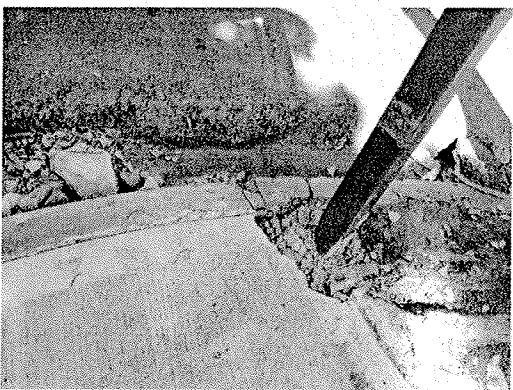

En conclusión, durante la visita de inspección comprobamos:


- Los anchos de las aceras cumplen con las recomendaciones de lugar.
- Existen adicionales como demoliciones, reparación de tuberías, podado y cortado de raíces y ramas.
- El hormigón es de alta resistencia entre 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2 y gran parte vaciado con hormigonera utilizando fibra como aditivo para obtener mayor resistencia ante el uso de las aceras y contenes por vehículos.
- Se ha implementado en la mayor parte de los tramos visitados los accesos para discapacitados.
- La terminación en general es de buena calidad y cumple con las especificaciones técnicas recomendadas.

Las informaciones plasmadas en este documento, trata sobre los avances del Programa de Aceras y Contenes en el Distrito Nacional a la fecha 08 de noviembre.

Sin otro particular,




Ing. Richard Cabrera
Técnico




Ing. Félix Tavarez
Técnico




Arq. Yarissa Pérez
Técnico



Elizabeth García
Técnico



Arq. Keilin Mora
Técnico



Ing. Stephany Castro
Técnico



CODIGO: 010101

REGIÓN: OZAMA

PROVINCIA: DISTRITO NACIONAL

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de noviembre de 2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Félix Tavárez
2. Elizabeth García
3. Arq. Kellin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ CNEL JUAN MARIA LORA	233.10	2.57	2	233.10	2	1198.134	466.2
TRAMO B	C/ ORT. GASET CON PORC. LIVO SEDAÑO	600.56	3.14	2	600.56	2	3771.5168	1201.12
TRAMO C	C/ EUSEBIO MANZUETA ESQ. ALBERT THOMAS	175.30	2.55	2	175.30	2	894.03	350.6
TRAMO D	CALLE K				86.00	2		172
TRAMO E	C/ DOMINGO SABIO				82.8	2		165.6
TRAMO F	C/ MANUELA DIEZ				125.9	1		125.9
TRAMO G	CALLE B							
TRAMO H	FEDERICO GERALDINO ESQ. PASEO LOS LOCUTORES	30.90	1.72	1	96.4	1	53.148	96.4
TRAMO I	PORFIRIO HERRERA	638.65	1.00	1	164.7	1	638.649	164.7
TRAMO J	FREDY PRESTOI	199.92	1.00	1	104	1	199.92	104
TRAMO K	HECTOR INCHAUSTEGUI	7.40	1.80	1	7.4	1	13.32	7.4
TRAMO L	MANUEL DE JESUS TROACOSO	77.25	1.00	1	20	1	77.25	20
TRAMO M	AV. BOLIVAR	1,151.69	1.00	1	437.73	1	1151.6946	437.73
TRAMO N	PARQUE CORAL KM 7 I-2	164.10	1.50	1	164.1	1	246.15	164.1
TRAMO O	PARQUE HONDURAS AV. ITALIA (EXTERIOR DEL PARQUE)	173.73	2.50	1			434.32	
TRAMO P	PARQUE HONDURAS AV. ITALIA (INTERIOR DEL PARQUE)	202.13	1.70	1	164.4	1	343.52	164.4
TRAMO Q								
TRAMO R								
Total							9021.75	3650.15

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$107,269,401.46

Monto desembolsado RD\$107,269,401.46 (100%)

Avance de obra 19.52%



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de noviembre de 2022

PROVINCIA: DISTRITO NACIONAL

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 04/11/2022 se ha ejecutado 9,021.75 metros cuadrados de aceras y 3,650.15 metros lineales de contén, lo que corresponde al 19.52% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS




1. En este levantamiento se observó que la mayoría de los tramos tienen una calidad óptima y el ancho de aceras es la adecuada de acuerdo a lo recomendado.
2. En los diferentes sectores inspeccionados solo algunos tramos se han ejecutado.
3. En el sector de Los Girasoles no se pudo hacer levantamientos por que no fue posible identificar los tramos intervenidos.
4. En el Caliche de Cristo Rey y Piantini, varios tramos de las aceras construidas se vieron afectadas por las lluvias, dañando la terminación.
5. Todas las intervenciones visitadas en el Distrito Nacional conllevan demoliciones de aceras y contenes en mal estado.
6. Toda las obras visitadas son ejecutadas por contrato.

IMÁGENES

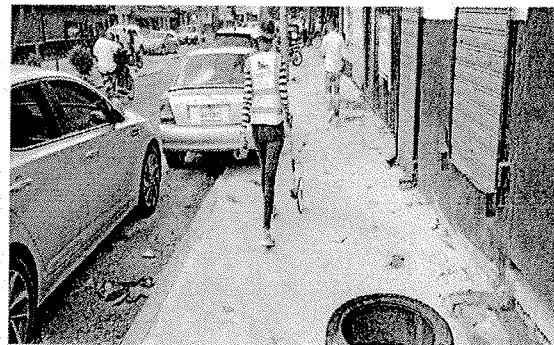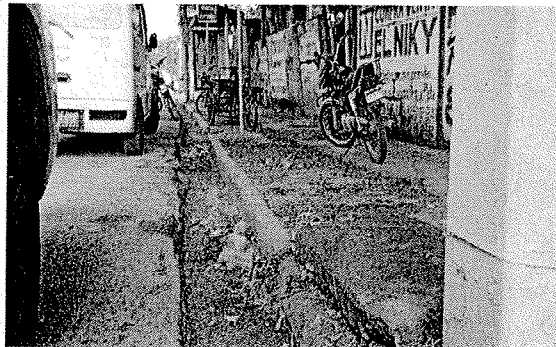



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

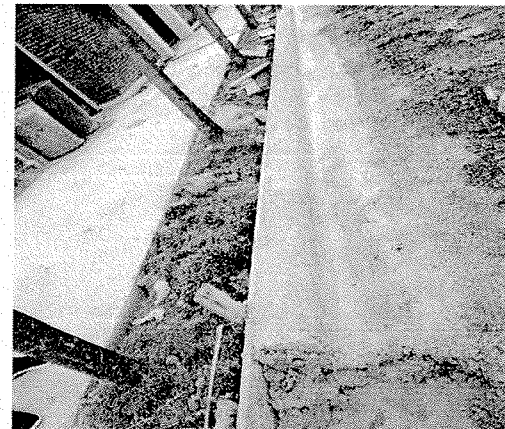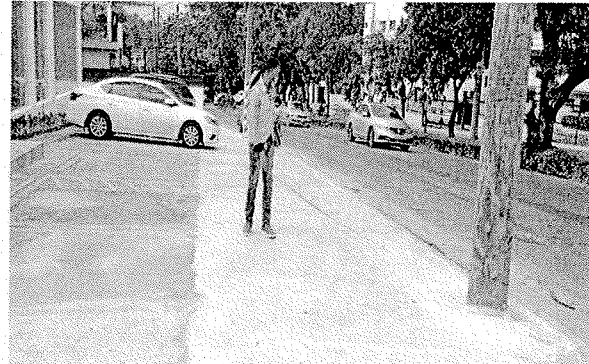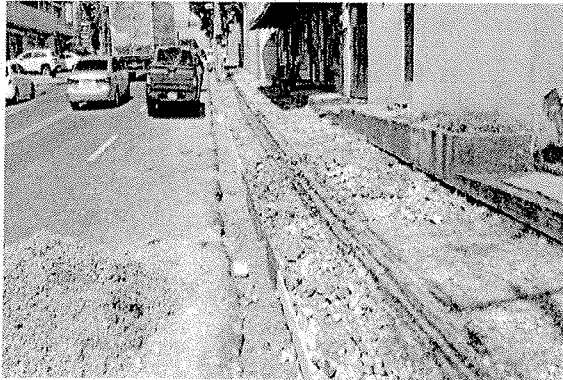




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —


Suministra los datos de este reporte,


ING. FÉLIX TAVÁREZ
Técnico


ELIZABETH GARCÍA
Técnico


ARQ. KENLIN MORA
Técnico


ING. RICHARD CABRERA
Técnico


ING. STEPHANNY CASTRO
Técnico


ARQ. YARIISA PEREZ
Técnico



Santo Domingo, D.N.
7 de abril de 2022

A: Ing. Camila Moya Lugo y Arq. Yariisa Pérez
Liga Municipal Dominicana

Asunto: Respuesta a "Informe de Revisión Ficha Identificación de Proyectos"

Muy cortésmente, le hacemos entrega de las revisiones solicitadas.

En relación al referido informe sobre revisión de la ficha de identificación, fueron verificadas y atendidas las solicitudes corrigiendo cada uno de los puntos citados a continuación:

- Coordinadas (longitud y latitud).
- Confirmación de distancia entre puntos.
- Corrección de la repetición de algunos puntos.
- Reordenamiento de las columnas de ancho de calle y longitud.

En cuanto a la mención de las evidencias fotográficas suministradas, hacemos constar que parte de los tramos de aceras y contenes seleccionados para ser intervenidos presentan gran deterioro debido al desgaste y la deformación que han causado los árboles en los puntos citados, creando así espacios de difícil tránsito para el peatón.

Cabe destacar que el Distrito Nacional posee espacios urbanizados en la gran mayoría de su territorio y que, por lo antes mencionado, una importante cantidad de aceras y contenes se encuentran en muy mal estado, por esta razón es necesario e indispensable realizar las partidas de demolición de las mismas y por consiguiente los botes de los escombros producidos.

Muy atentamente,



Ing. Johan Santiago
Director Mantenimiento y Obras Comunitarias
Alcaldía del Distrito Nacional

Tramos	Nombre De La Calle	INICIO		FINAL		ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE ACERAS (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD				
Circunscripción C1									
Tramo 1	Km 7 1/2 - Parque Coral	18.438101	-69.954302	18.438120	-69.954155	1.7	75	127.5	75
Tramo 2	Km 7 1/2 - Parque Coral	18.438120	-69.954155	18.438790	-69.954485	1.7	75	127.5	75
Tramo 3	Km 7 1/2 - Parque Coral	18.438101	-69.954302	18.438837	-69.954346	1.7	20	34	20
Tramo 4	Km 7 1/2 - Parque Coral	18.438790	-69.954485	18.438120	-69.954155	1.7	20	34	20
Tramo 5	Parque Restauradores C/Juan De La Cruz	18.457739	-69.967806	18.457205	-69.966714	1.8	82	147.6	77.8
Tramo 6	Parque Restauradores C/ Esteban Adames	18.456884	-69.967843	18.457188	-69.966687	1.8	90	162	85
Tramo 7	Parque Restauradores C/Olegario Tenares	18.456885	-69.967837	18.457748	-69.967818	1.8	90	162	85
Tramo 8	Parque Renacimiento , Calle Miguel Angel	18.445466	-69.964168	18.445755	-69.963397	1.9	487	925.3	83.3

Tramo 9	Parque Honduras-Avenida Italia	18.449421	-69.935706	18.448826	-69.935248	1.7	80	136	75
Tramo 10	Parque Honduras-Calle 6	18.448826	-69.935248	18.449142	-69.934862	1.7	52	88.4	49
Tramo 11	Parque Honduras-Calle 5	18.449731	-69.935281	18.449142	-69.934862	1.7	80	136	75
Tramo 12	Parque Honduras-Calle Ciudad De Heredia Consta Rica	18.449421	-69.935706	18.449731	-69.935281	1.7	55	93.5	52
Tramo 13	Ensanche Quisqueya: Ubicación Club Metropolitano (Los Pica piedras)	18.464811	-69.952445	18.465232	-69.951211	2.4	199	477.6	199
Tramo 14	Ensanche Quisqueya: Ubicación Club Metropolitano (Los Pica piedras)	18.465679	-69.952737	18.466057	-69.951570	2.25	190	427.5	190
Tramo 15	Ensanche Quisqueya: Ubicación Club Metropolitano (Los Pica piedras)	18.466057	-69.951570	18.465684	69.952761	2.15	210	451.5	210

Ubicación: Piantini									
Tramo 16	Calles Lic. Porfirio Herrera	18.478014	-69.944169	18.478304	-69.943758	1.3	50	65	50
Tramo 17	Calles Lic. Porfirio Herrera	18.478201	-69.944590	18.478310	-69.943989	1.9	60	114	60
Tramo 18	Calles Lic. Porfirio Herrera	18.478492	-69.943319	18.478791	-69.942400	1.7	102	173.4	102
Tramo 19	Rafael Augusto Sánchez	18.471574	-69.934471	18.471460	-69.934601	2	18	36	18
Tramo 20	Rafael Augusto Sánchez	18.471222	-69.935095	18.471087	-69.935341	2	30	60	30
Tramo 21	Rafael Augusto Sánchez	18.470840	-69.935826	18.470431	-69.936684	2	101	202	101
Tramo 22	Rafael Augusto Sánchez	18.470851	-69.935688	18.471708	-69.934037	2	198	396	198
Tramo 23	Rafael Augusto Sánchez	18.470184	-69.937174	18.470054	-69.937421	2	30	60	30
Tramo 24	Rafael Augusto Sánchez	18.470130	-69.937141	18.469961	-69.937477	2	40	80	40
Tramo 25	Rafael Augusto Sánchez	18.469803	-69.937913	18.469659	-69.938202	1.8	35	63	35
Tramo 26	Rafael Augusto Sánchez	18.469710	-69.937971	18.469527	-69.938312	1.8	40	72	40
Tramo 27	Pablo Neruda	18.472207	-69.937787	18.472375	-69.937874	1.3	21	27.3	21

Tramo 28	Pablo Neruda	18.472183	-69.937749	18.472006	-69.937677	1.5	20	30	20
Tramo 29	Pablo Neruda	18.472518	-69.938618	18.472630	-69.938380	1.4	27	37.8	27
Tramo 30	Andrés Julio Aybar	18.470947	-69.937847	18.470854	-69.938034	1.8	22	39.6	22
Tramo 31	Andrés Julio Aybar	18.470970	-69.937800	18.471018	-69.937691	1.8	12	21.6	12
Tramo 32	Andrés Julio Aybar	18.471050	-69.937679	18.471123	-69.937587	1.8	10	18	10
Tramo 33	Andrés Julio Aybar	18.471314	-69.937231	18.471449	-69.936984	1.8	28	50.4	28
Tramo 34	Andrés Julio Aybar	18.471497	-69.936885	18.471619	-69.936641	1.8	30	54	30
Tramo 35	Andrés Julio Aybar	18.471782	-69.936201	18.471917	-69.935957	2.6	28	72.8	28
Tramo 36	Andrés Julio Aybar	18.471490	-69.936764	18.471508	-69.936730	2.2	4.8	10.56	4.8
Tramo 37	Andrés Julio Aybar	18.471444	-69.936869	18.471451	-69.936860	1.2	1.2	1.44	1.2
Tramo 38	Andrés Julio Aybar	18.471706	-69.936467	18.471715	-69.936444	1.6	1.2	1.92	1.2
Tramo 39	Jacinto Mañón	18.479386	-69.942998	18.479238	-69.943498	1.8	53.3	95.94	53.3
Tramo 40	Jacinto Mañón	18.479594	-69.942368	18.479556	-69.942518	1.8	18	32.4	18
Tramo 41	Francisco Lavandier	18.477809	-69.942902	18.477825	-69.942850	1.4	5.5	7.7	5.5
Tramo 42	Francisco Lavandier	18.477848	-69.942659	18.477862	-69.942590	0.8	7	5.6	7
Tramo 43	Francisco Lavandier	18.477714	-69.943077	18.477732	-69.943048	1.3	3	3.9	3
Tramo 44	Francisco Lavandier	18.477640446353472,	-69.943447	18.477660	-69.943381	1.3	7	9.1	7
Tramo 45	Francisco Lavandier	18.477442	-69.943924	18.477461	-69.943847	1.9	7	13.3	7

Tramo 46	Poncio Savater	18.478201	-69.944590	18.478128	-69.944509	0.3	5	1.5	5
Tramo 47	Filomena Gómez De Cova	18.479071	-69.936518	18.478555	-69.936335	2.5	40	100	40
Tramo 48	Filomena Gómez De Cova	18.478435	-69.936096	18.477538	-69.935663	2.5	23.1	57.75	23.1
Tramo 49	Filomena Gómez De Cova	18.481041	-69.937640	18.480959	-69.937591	1.6	8	12.8	8
Tramo 50	Filomena Gomez De Cova	18.481000	-69.937559	18.480840	-69.937469	1	20	20	20
Tramo 51	Filomena Gómez De Cova	18.480606	-69.937400	18.480339	-69.937246	1.5	33.2	49.8	33.2
Tramo 52	Filomena Gómez De Cova	18.476395	-69.934974	18.476976	-69.935346	1.5	77.6	116.4	77.6
Tramo 53	Filomena Gómez De Cova	18.480085	-69.937034	18.479916	-69.936954	1.5	23.1	34.65	23.1
Tramo 54	Filomena Gómez De Cova	18.475411	-69.934521	18.475799	-69.934736	1.5	46.6	69.9	46.6
Tramo 55	Manuel De Jesús Troncoso	18.468485	-69.636944	18.468802	-69.937117	2.12	38	80.56	38
Tramo 56	Manuel De Jesús Troncoso	18.468592	-69.936929	18.468558	-69.936924	1.77	2.8	4.956	2.8
Tramo 57	Manuel De Jesús Troncoso	18.469247	-69.937367	18.469271	-69.937377	0.9	1.7	1.53	1.7

Tramo 58	Manuel De Jesús Troncoso	18.468445	-69.936938	18.468520	-69.936942	1.8	6	10.8	6
Tramo 59	Manuel De Jesús Troncoso	18.468322	-69.936869	18.468395	-69.936872	0.3	5	1.5	5
Tramo 60	Manuel De Jesús Troncoso	18.468222	-69.936860	18.468220	-69.936775	0.8	3	2.4	3
Tramo 61	Manuel De Jesús Troncoso	18.469230	-69.937352	18.469281	-69.937372	1.4	5	7	5
Tramo 62	Manuel De Jesús Troncoso	18.469505	-69.937445	18.469320	-69.937348	1.4	25	35	25
Tramo 63	Manuel De Jesús Troncoso	18.470086	-69.937765	18.470159	-69.937819	0.9	10	9	10
Tramo 64	Manuel De Jesús Troncoso	18.470879	-69.938295	18.471165	-69.938454	1.39	35	48.65	35
Tramo 65	Manuel De Jesús Troncoso	18.471349	-69.938461	18.471411	-69.938529	0.7	9	6.3	9
Tramo 66	Manuel De Jesús Troncoso	18.473102	-69.939520	18.473140	-69.939544	0.9	3.5	3.15	3.5
Tramo 67	Manuel De Jesús Troncoso	18.468511	-69.936878	18.468657	-69.936974	1.39	20	27.8	20
Tramo 68	Manuel De Jesús Troncoso	18.471749	-69.938775	18.472511	-69.939211	1.39	96	133.44	96
Tramo 69	Manuel De Jesús Troncoso	18.471778	-69.938710	18.471997	-69.938829	1.39	30	41.7	30

Tramo 70	Manuel De Jesús Troncoso	18.471296	-69.938444	18.471411	-69.938516	1.39	15	20.85	15
Tramo 71	Manuel De Jesús Troncoso	18.473174	-69.939501	18.473353	-69.939615	2.7	22	59.4	22
Tramo 72	Federico Geraldino	18.480285	-69.941017	18.480225	-69.940987	0.3	7	2.1	7
Tramo 73	Federico Geraldino	18.472913	-69.936880	18.472975	-69.936938	0.3	7	2.1	7
Tramo 74	Federico Geraldino	18.473788	-69.937471	18.474010	-69.937590	2	25	50	25
Tramo 75	Federico Geraldino	18.473510	-69.937037	18.473256	-69.937075	3	23	69	23
Tramo 76	Federico Geraldino	18.480254	-69.940997	18.480278	-69.941013	2.3	4	9.2	4
Tramo 77	Federico Geraldino	18.473096	-69.937003	18.473523	-69.937232	1.3	53	68.9	53
Tramo 78	Federico Geraldino	18.472781	-69.936902	18.473111	-69.937078	1.8	40	72	40
Tramo 79	Federico Geraldino	18.475180	-69.938181	18.475678	-69.938430	3	60	180	60
Tramo 80	Federico Geraldino	18.479144	-69.940216	18.479323	-69.940481	3	28	84	28
Tramo 81	Federico Geraldino	18.478712	-69.940261	18.478577	-69.940135	1.8	20	36	20
Tramo 82	Federico Geraldino	18.475630	-69.938459	18.475462	-69.938370	2.2	20	44	20
Tramo 83	Federico Geraldino	18.467999	-69.934134	18.467927	-69.934097	2.6	9	23.4	9
Tramo 84	Max Henríquez Ureña 83	18.472596	-69.937014	18.472512	-69.937175	2.3	20	46	20
Tramo 85	Max Henríquez Ureña 82	18.473120	-69.935991	18.473158	-69.935917	1.8	9	16.2	9

Tramo 86	Max Henríquez Ureña	18.474450	-69.941001	18.474375	-69.941159	1.8	18	32.4	18
Tramo 87	Max Henríquez Ureña 82	18.472393	-69.937295	18.472526	-69.937052	2.3	30	69	30
Tramo 88	Max Henríquez Ureña 82	18.475030	-69.939834	18.474904	-69.940088	1.8	28	50.4	28
Tramo 89	Max Henríquez Ureña 82	18.474387	-69.941252	18.474387	-69.941240	0.3	1.5	0.45	1.5
Tramo 90	Max Henríquez Ureña 81	18.471705	-69.938786	18.471483	-69.939208	1.68	50	84	50
Tramo 91	Proyecto -3	18.476570	-69.939748	18.476689	-69.939796	1.8	10	18	10
Tramo 92	Miguel Ángel Báez Díaz	18.473534	-69.938220	18.473493	-69.938432	0.9	3	2.7	3
Tramo 93	Miguel Ángel Báez Díaz	18.473997	-69.938724	18.473793	-69.938601	1.3	25	32.5	25
Tramo 94	Abraham Lincoln	18.481064	-69.938951	18.480810	-69.938825	6	31	186	31
Tramo 95	Abraham Lincoln	18.477921	-69.937043	18.477371	-69.936775	6	44	264	44
Tramo 96	Abraham Lincoln	18.479543	-69.937972	18.479299	-69.937820	6	30.8	184.8	30.8
Tramo 97	Abraham Lincoln	18.480042	-69.938204	18.479952	-69.938169	6	7.2	43.2	7.2
Tramo 98	Abraham Lincoln	18.476676	-69.936304	18.476236	-69.936082	6	58.7	352.2	58.7
Tramo 99	Abraham Lincoln	18.477921	-69.937043	18.477371	-69.936775	6	63	378	63
Tramo 100	Josemaría Escrivá	18.473758	-69.939828	18.473935	-69.939578	1.8	30	54	30

Tramo 101	Josemaría Escrivá	18.473934	-69.939724	18.473965	-69.939638	1.8	9	16.2	9
Tramo 102	Gustavo Mejía Ricart	18.474686	-69.935940	18.474752	-69.935773	1	18	18	18
Tramo 103	Gustavo Mejía Ricart	18.474653	-69.935842	18.474694	-69.935768	0.8	8	6.4	8
Tramo 104	Gustavo Mejía Ricart	18.474323	-69.936531	18.474297	-69.936484	1	1	1	1
Tramo 105	Gustavo Mejía Ricart	18.474751	-69.935881	18.474708	-69.935834	0.7	1	0.7	1
Tramo 106	Gustavo Mejía Ricart	18.474534	-69.936236	18.474513	-69.936259	2.35	2.7	6.345	2.7
Tramo 107	Gustavo Mejía Ricart	18.475401	-69.934531	18.475266	-69.934783	1.5	29	43.5	29
Tramo 108	Gustavo Mejía Ricart	18.475123	-69.935092	18.475211	-69.934907	1.5	21	31.5	21
Tramo 109	Héctor Inchaustegui	18.475257	-69.939407	18.475307	-69.939332	0.8	9	7.2	9
Tramo 110	Héctor Inchaustegui	18.475313	-69.939432	18.475325	-69.939392	1.6	4	6.4	4
Tramo 111	Héctor Inchaustegui	18.475267	-69.939406	18.475283	-69.939379	0.3	3	0.9	3
Tramo 112	Héctor Inchaustegui	18.474746	-69.940384	18.474798	-69.940302	1.7	6	10.2	6
Tramo 113	Héctor Inchaustegui	18.475304	-69.939425	18.475329	-69.939360	0.8	7	5.6	7
Tramo 114	Héctor Inchaustegui	18.476192	-69.937714	18.476240	-69.937609	1.6	10	16	10
Tramo 115	Héctor Inchaustegui	18.475809	-69.938452	18.476084	-69.937907	1.6	68	108.8	68

Tramo 116	Héctor Inchaustegui	18.475614	-69.938793	18.475496	-69.939033	1.6	28	44.8	28
Tramo 117	Héctor Inchaustegui	18.476463	-69.937156	18.476528	-69.937024	1.6	15	24	15
Tramo 118	Prol. Fantino Falco	18.474808	-69.937938	18.474875	-69.937704	1.66	7.1	11.786	7.1
Tramo 119	Prol. Fantino Falco	18.475159	-69.937342	18.475266	-69.937030	2.9	10	29	10
Tramo 120	Prol. Fantino Falco	18.475206	-69.937021	18.475206	-69.936620	1.6	9	14.4	9
Tramo 121	Prol. Fantino Falco	18.474932	-69.938011	18.474919	-69.937957	1.2	4	4.8	4
Tramo 122	Prol. Fantino Falco	18.475669	-69.936097	18.475468	-69.936481	0.3	40	12	40
Tramo 123	José Amado Soler	18.477279	-69.940177	18.477324	-69.940088	0.9	10	9	10
Tramo 124	José Amado Soler	18.477183	-69.940224	18.477189	-69.940233	1	1.1	1.1	1.1
Tramo 125	José Amado Soler	18.477215	-69.940404	18.477002	-69.940690	0.9	35	31.5	35
Tramo 126	José Amado Soler	18.476694	-69.941289	18.476697	-69.941311	0.3	2	0.6	2
Tramo 127	José Amado Soler	18.476646	-69.941322	18.476666	-69.941308	0.6	3	1.8	3
Tramo 128	José Amado Soler	18.476404	-69.942038	18.476535	-69.941997	2.5	8	20	8
Tramo 129	José Amado Soler	18.476400	-69.942228	18.476268	-69.942292	2.5	16	40	16
Tramo 130	José Amado Soler	18.476356	-69.942287	18.476305	-69.942311	2.5	5.7	14.25	5.7
Tramo 131	José Amado Soler	18.476112	-69.942517	18.476228	-69.942367	2.5	20.4	51	20.4

Tramo 132	José Amado Soler	18.476698	-69.941365	18.476803	-69.941140	2.5	25	62.5	25
Tramo 133	José Amado Soler	18.475852	-69.942927	18.475789	-69.943055	2.5	14	35	14
Tramo 134	Freddy Prestol Castillo	18.468614	-69.933828	18.468672	-69.938290	1.5	5	7.5	5
Tramo 135	Freddy Prestol Castillo	18.469199	-69.938596	18.469210	-69.938579	0.6	2	1.2	2
Tramo 136	Freddy Prestol Castillo	18.469571	-69.938714	18.470022	-69.938986	1.9	60	114	60
Tramo 137	Freddy Prestol Castillo	18.468998	-69.938475	18.469202	-69.938591	2.7	25	67.5	25
Tramo 138	Calle 2a	18.476694	-69.942932	18.476577	-69.942888	0.3	14	4.2	14
Tramo 139	Calle 2a	18.476436	-69.942750	18.476278	-69.942656	1.4	20	28	20
Tramo 140	Calle 2a	18.475595	-69.942337	18.475696	-69.942403	0.8	14	11.2	14
Tramo 141	Paseo Dolmen	18.477869	-69.940470	18.477826	-69.940516	0.6	5	3	5
Tramo 142	Paseo Dolmen	18.477332	-69.940936	18.477303	-69.940934	0.3	1.2	0.36	1.2
Tramo 143	Winston Churchill	18.477434	-69.944310	18.477505	-69.944324	6	6.4	38.4	6.4
Tramo 144	Winston Churchill	18.471226	-69.940696	18.471278	-69.940765	2.7	7.5	20.25	7.5
Tramo 145	Winston Churchill	18.471344	-69.940821	18.471359	-69.940832	0.2	1.8	0.36	1.8
Tramo 146	Winston Churchill	18.477479	-69.944199	18.477553	-69.944302	1	10	10	10
Tramo 147	Winston Churchill	18.477395	-69.944241	18.477406	-69.944246	0.25	0.4	0.1	0.4
Tramo 148	Winston Churchill	18.475450	-69.943087	18.475389	-69.943063	2.4	7.1	17.04	7.1

Tramo 149	Winston Churchill	18.471345	-69.940809	18.471396	-69.940842	3.1	6.4	19.84	6.4
Tramo 150	Luis Escoto Gómez	18.478545	-69.934269	18.478236	-69.935061	1.5	90.9	136.35	90.9
Tramo 151	Luis Escoto Gómez	18.478575	-69.934139	18.478629	-69.933925	1.5	22.2	33.3	22.2
Tramo 152	Luis Escoto Gómez	18.479069	-69.932692	18.479128	-69.932495	1.5	24.85	37.275	24.85
Tramo 153	El Cayao	18.478266	-69.933463	18.478352	-69.933293	1.5	43.4	65.1	43.4
Tramo 154	El Cayao	18.478536	-69.932705	18.478579	-69.932603	1.5	20	30	20
Tramo 155	El Cayao	18.478579	-69.932603	18.478685	-69.932344	1.5	18	27	18
Tramo 156	El Cayao	18.478099	-69.934024	18.478156	-69.933836	1.5	1.7	2.55	1.7
Tramo 157	Fernando Escobar	18.477801	-69.932595	18.477712	-69.932971	1.5	41.5	62.25	41.5
Tramo 158	Agustín Lara	18.477563	-69.933922	18.477879	-69.933987	2.5	33.6	84	33.6
Tramo 159	Agustín Lara	18.478115	-69.934033	18.478540	-69.934165	1.5	49	73.5	49
Tramo 160	Agustín Lara	18.478614	-69.934248	18.479532	-69.934551	1.5	106.7	160.05	106.7
Tramo 161	Pablo Casals	18.477957	-69.932340	18.478387	-69.932321	1.7	47.7	81.09	47.7
Tramo 162	Pablo Casals	18.479160	-69.932298	18.478898	-69.932302	1.5	25.7	38.55	25.7
Tramo 163	Pablo Casals	18.479669	-69.932262	18.479843	-69.932284	2.5	21.5	53.75	21.5
Tramo 164	Pablo Casals	18.479979	-69.932298	18.480149	-69.932360	2.5	21	52.5	21
Tramo 165	Víctor Garrido Puello	18.468101	-69.936470	18.468120	-69.936437	1.3	6	7.8	6
Tramo 166	Víctor Garrido Puello	18.469485	-69.933813	18.469516	-69.933776	2.65	4.5	11.925	4.5

Tramo 167	Roberto Pastoriza	18.468053	-69.934117	18.468114	-69.934128	2	2	4	2
Tramo 168	Roberto Pastoriza	18.467129	-69.936103	18.467258	-69.935833	2.96	33	97.68	33

Avenidas Circunscripción 1									
Tramo 197	Ubicación: Av. Bolívar, Tramo entre Calle Delgado hasta Av. Lincoln	18.470510	-69.897578	18.462952	-69.928821	3.41705	1314	4490.0037	1314
Tramo 198	Ubicación: Av. Pasteur, tramo entre La Av. George Washington hasta la Av. Simón Bolívar	18.463107	-69.896521	18.469785	-69.900552	3.065	677.18	2075.5567	677.18

Circunscripción 2									
Tramo 169	Ortega Y Gasset Ubicación: desde La Pedro Livio Cedeño hasta C/ Félix E. Mejía	18.493722	-69.921662	18.497469	-69.921906	2.25	401	902.25	401

Tramo 170	Ortega Y Gasset Ubicación: Desde C/Félix E. Mejía hasta C/34	18.497469	-69.921906	18.498478	-69.921956	2.25	106	238.5	106
Tramo 171	Ortega Y Gasset Ubicación: Desde C/34 hasta Av. Nicolás De Ovando	18.498478	-69.921956	18.499360	-69.922020	1.6	90	144	90
Tramo 172	Ortega Y Gasset Ubicación: Desde la Pedro Livio Cedeño hasta C/ Rafael A. Pichardo	18.493722	-69.921662	18.495608	-69.921814	3	203	609	203
Tramo 173	C/ Rafael A. Pichardo hasta C/ Félix E. Mejía	18.495608	-69.921814	18.497469	-69.921906	2.2	206	453.2	206
Tramo 174	Ortega Y Gasset Ubicación: C/ Félix E. Mejía hasta C/ 34 A	18.497469	-69.921906	18.498478	-69.921956	2.2	106	233.2	106
Tramo 175	Ortega Y Gasset Ubicación: C/ 34 A hasta Av. Nicolás De Ovando	18.498478	-69.921956	18.499360	-69.922020	6.53	90	587.7	90

Tramo 179	El Caliche de Cristo Rey – Av. Reyes Católicos - El Caliche Cristo Rey –Av. Reyes Católicos - Acera Norte desde Arzobispo Romero, Isleta Central	18.505532	-69.925585	18.505607	-69.925571	2	200	400	200
Tramo 180	Av. Coronel Juan María Lora Fernández, Tramo desde Av. Los Próceres hasta La Av. República De Colombia	18.483872	-69.967296	18.500476	-69.958615	2	4100	8200	4100
Ubicación : Mirador De Los Girasoles									
Tramo 181	Calle Rafael Ureña	18.511807	-69.989529	18.515077	-69.988439		694	0	694
Tramo 182	Hermana Patricia Mirabal	18.514529	-69.989000	18.514486	-69.988539		55.8	0	55.8
Tramo 183	Minerva Mirabal	18.514800	-69.988777	18.514850	-69.988039		65.8	0	65.8
Tramo 184	Guarocuya	18.514370	-69.988496	18.514573	-69.987553		82.8	0	82.8
Tramo 185	Respaldo Joaquín Balaguer	18.514745	-69.987938	18.514911	-69.987257		60	0	60

Tramo 186	Pablo Neruda	18.513528	-69.988530	18.513488	-69.988159		64	0	64
-----------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	--	----	---	----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Circunscripción C3									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Ubicación : María Auxiliadora									
Tramo 187	Calle J	18.493561	-69.887757	18.497143	-69.886423	2.5	295.5	738.75	295.5
Tramo 188	Calle Domingo Sabio desde Calle Eusebio Manzuela Hasta la Calle C	18.492189	-69.886718	18.496797	-69.887780	2.2	485.7	1068.54	485.7
Tramo 189	Calle B	18.495263	-69.889859	18.496045	-69.888616	2.95	240	708	240
Tramo 190	Calle Eusebio Manzuela desde Albert Thomas hasta la Calle K	18.491987	-69.887103	18.493137126664706,	-69.885478	2.5	384	960	384
Tramo 191	Calle K	18.492662	-69.887032	18.493816	-69.885385	1.8	348	626.4	348
Tramo 192	Calle Manuela Diez desde Albert Thomas hasta la Calle A	18.492748	-69.887754	18.494330	-69.885460	3.1	528	1636.8	528
Tramo 193	Calle A	18.490738	-69.888852	18.490051	-69.888334	1.5	410	615	410


Ubicación : Ensanche Espaillet									
Tramo 194	Escuela Varias Luces (Calle Interior J)	18.504377	-69.889783	18.504683	-69.889992	1.5	60	90	60
Tramo 195	Escuela Varias Luces (Callejón Lateral)	18.504683	-69.889992	18.504920	-69.889576	1.5	45	67.5	45
Tramo 196	Escuela Varias Luces (Callejón Interior)	18.504683	-69.889992	18.504920	-69.889576	1.5	108	162	108


Fotografías de las calles a intervenir

Anexar imágenes de las calles donde se construirá aceras y/o contenes.


Fotos en Circunscripción 1

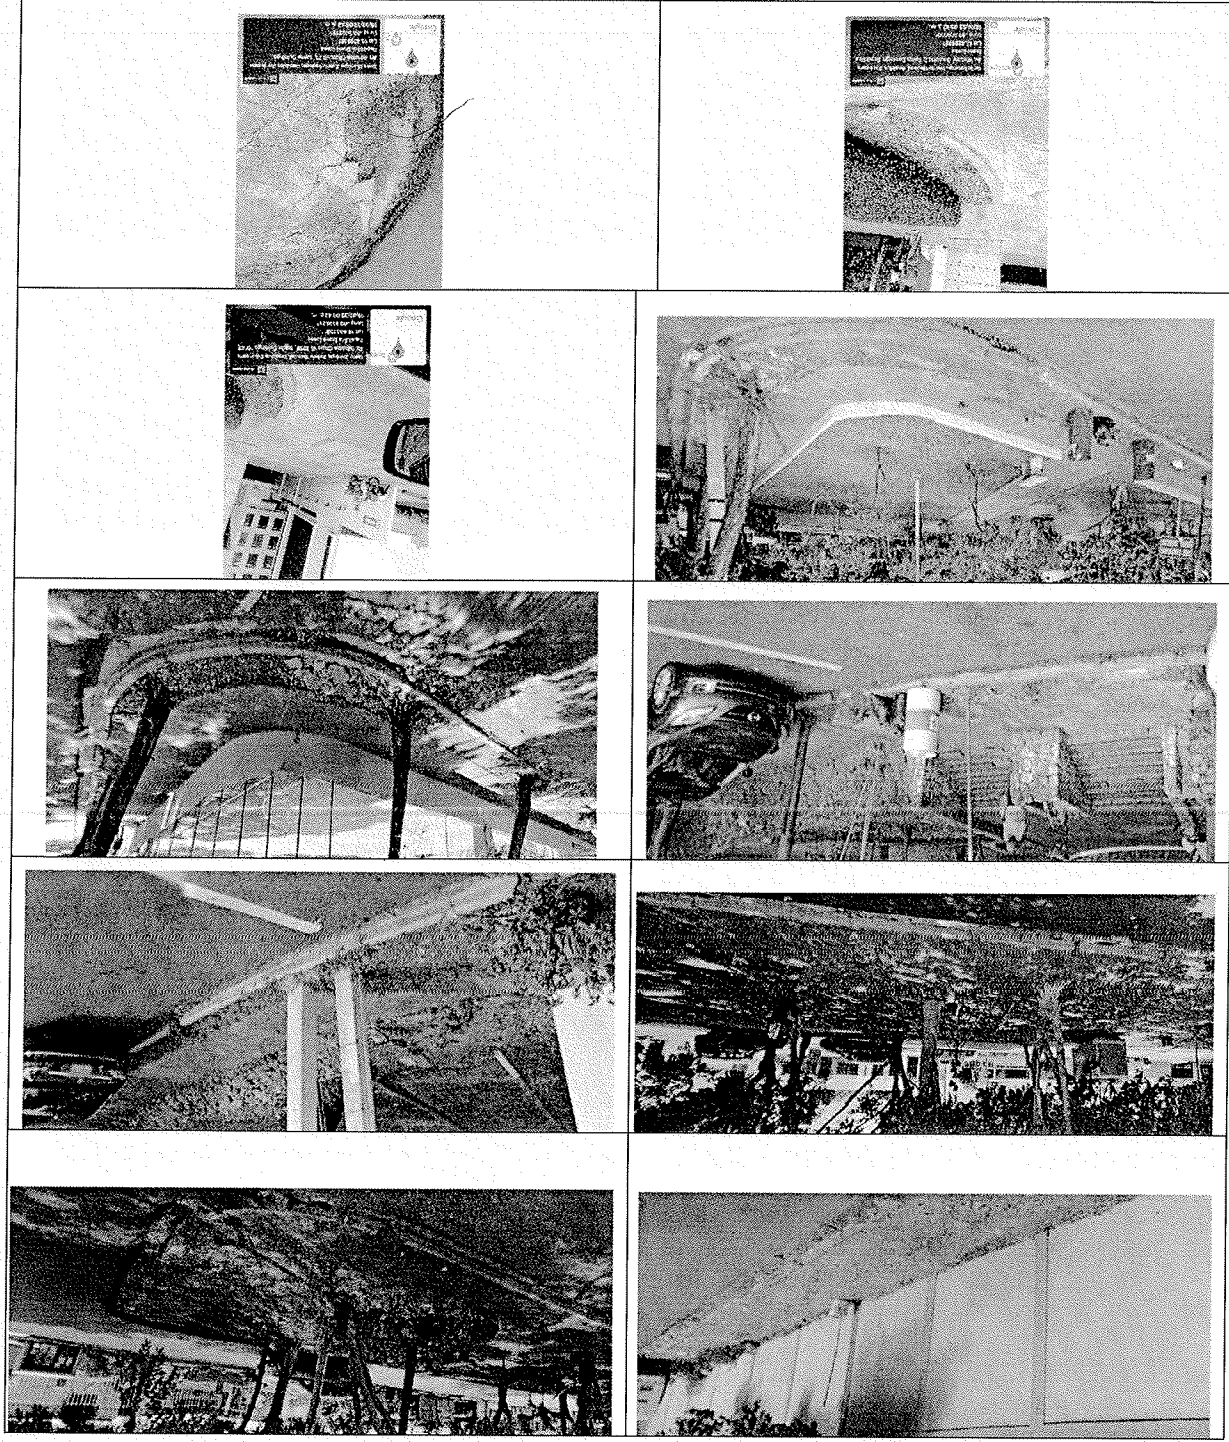





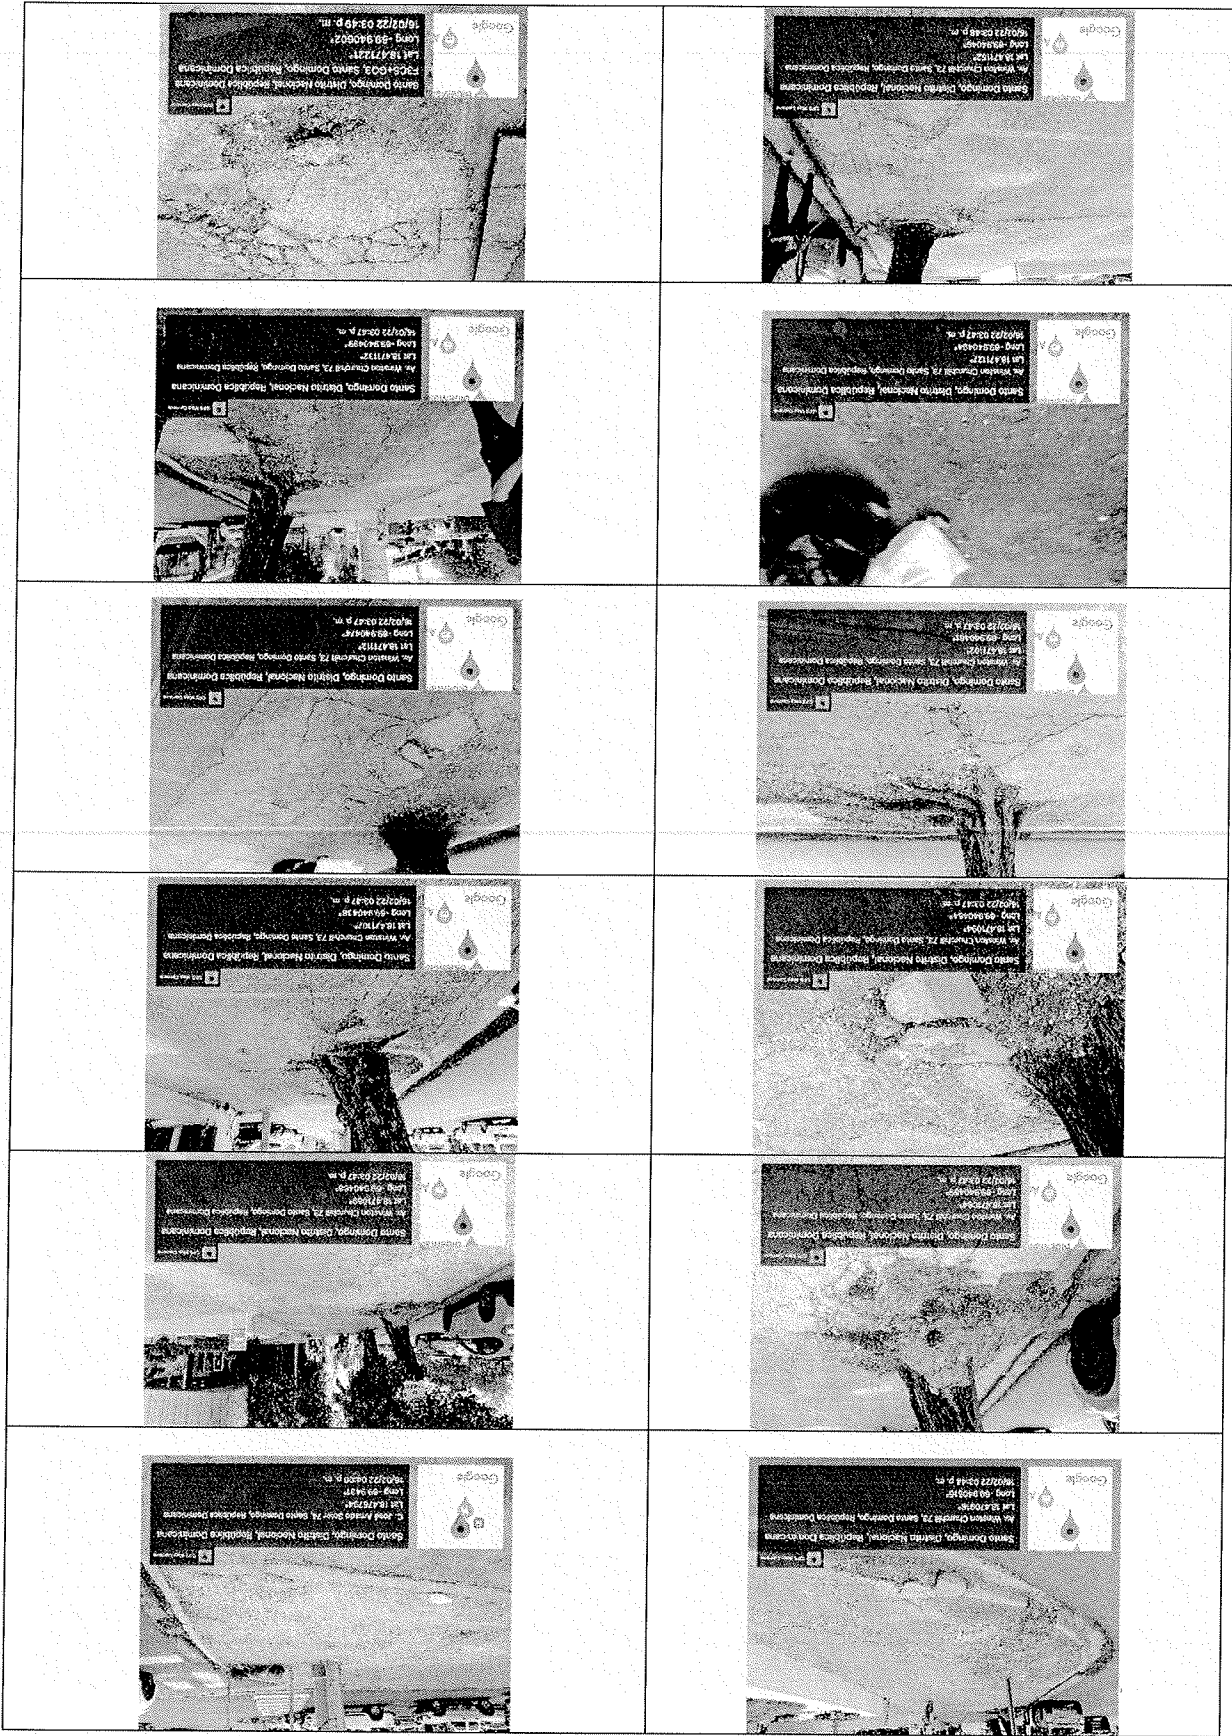


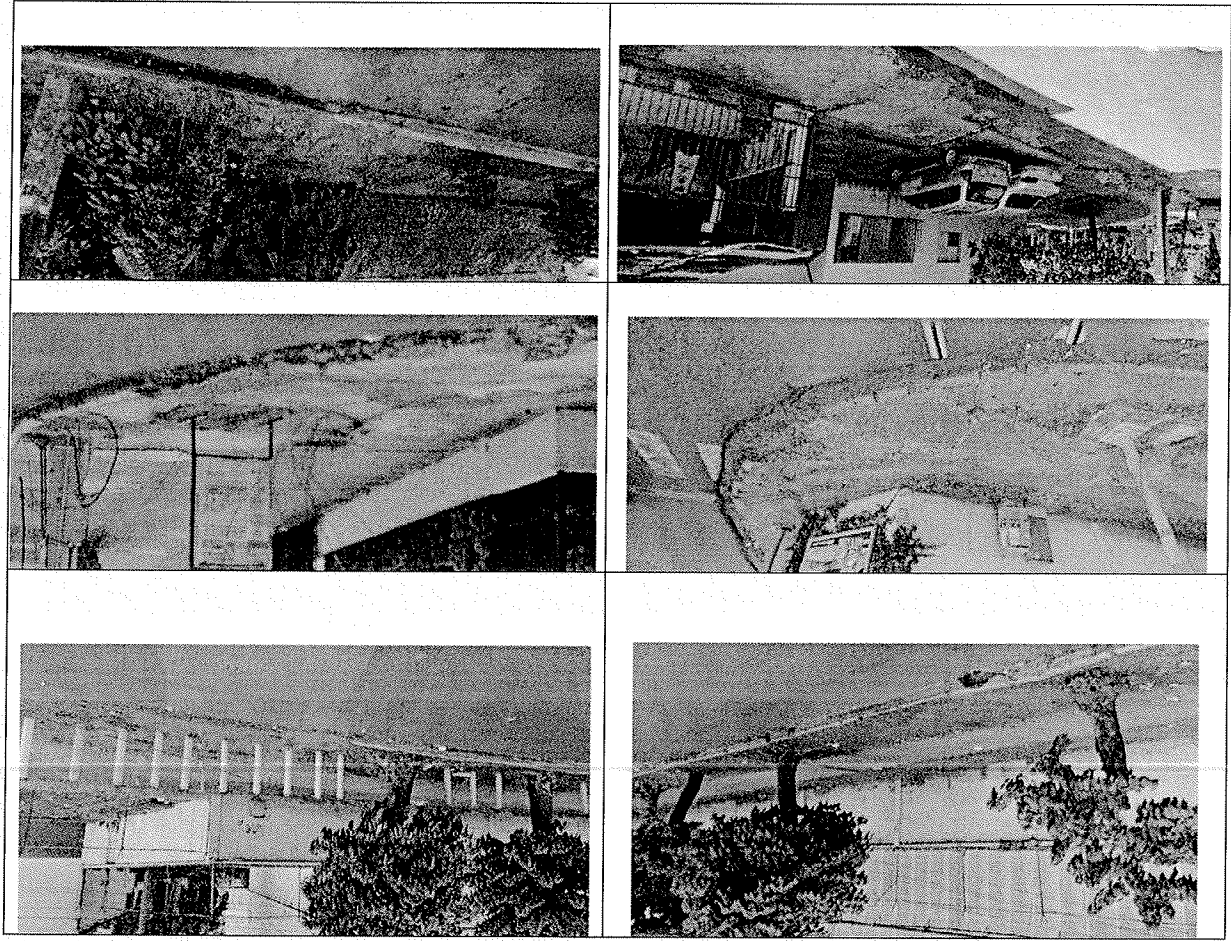


Fotos en Circunscripción 2

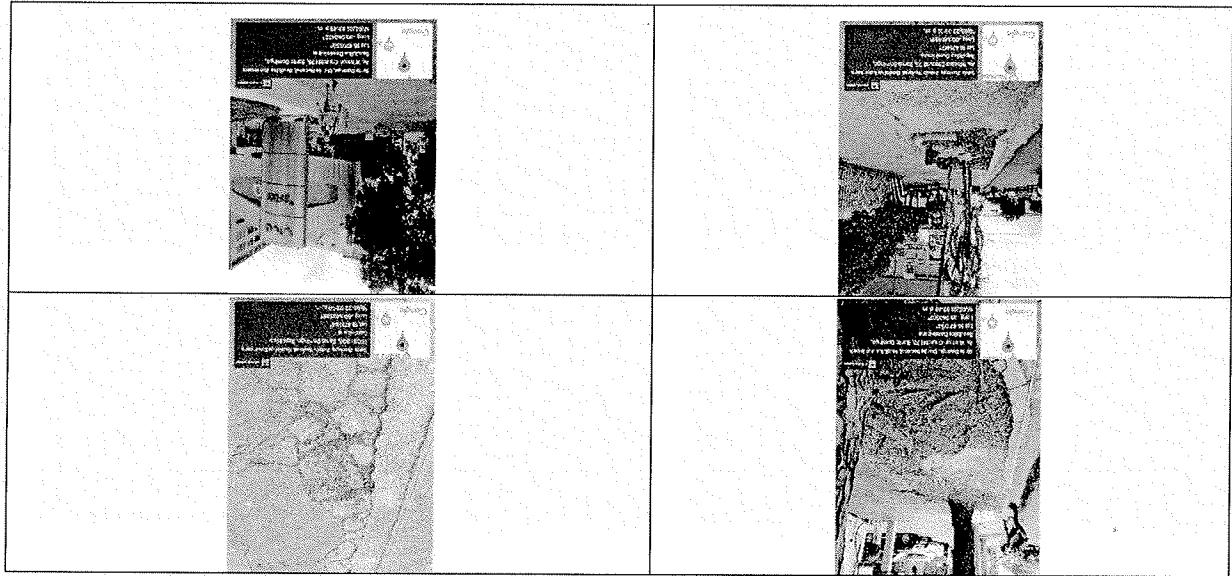

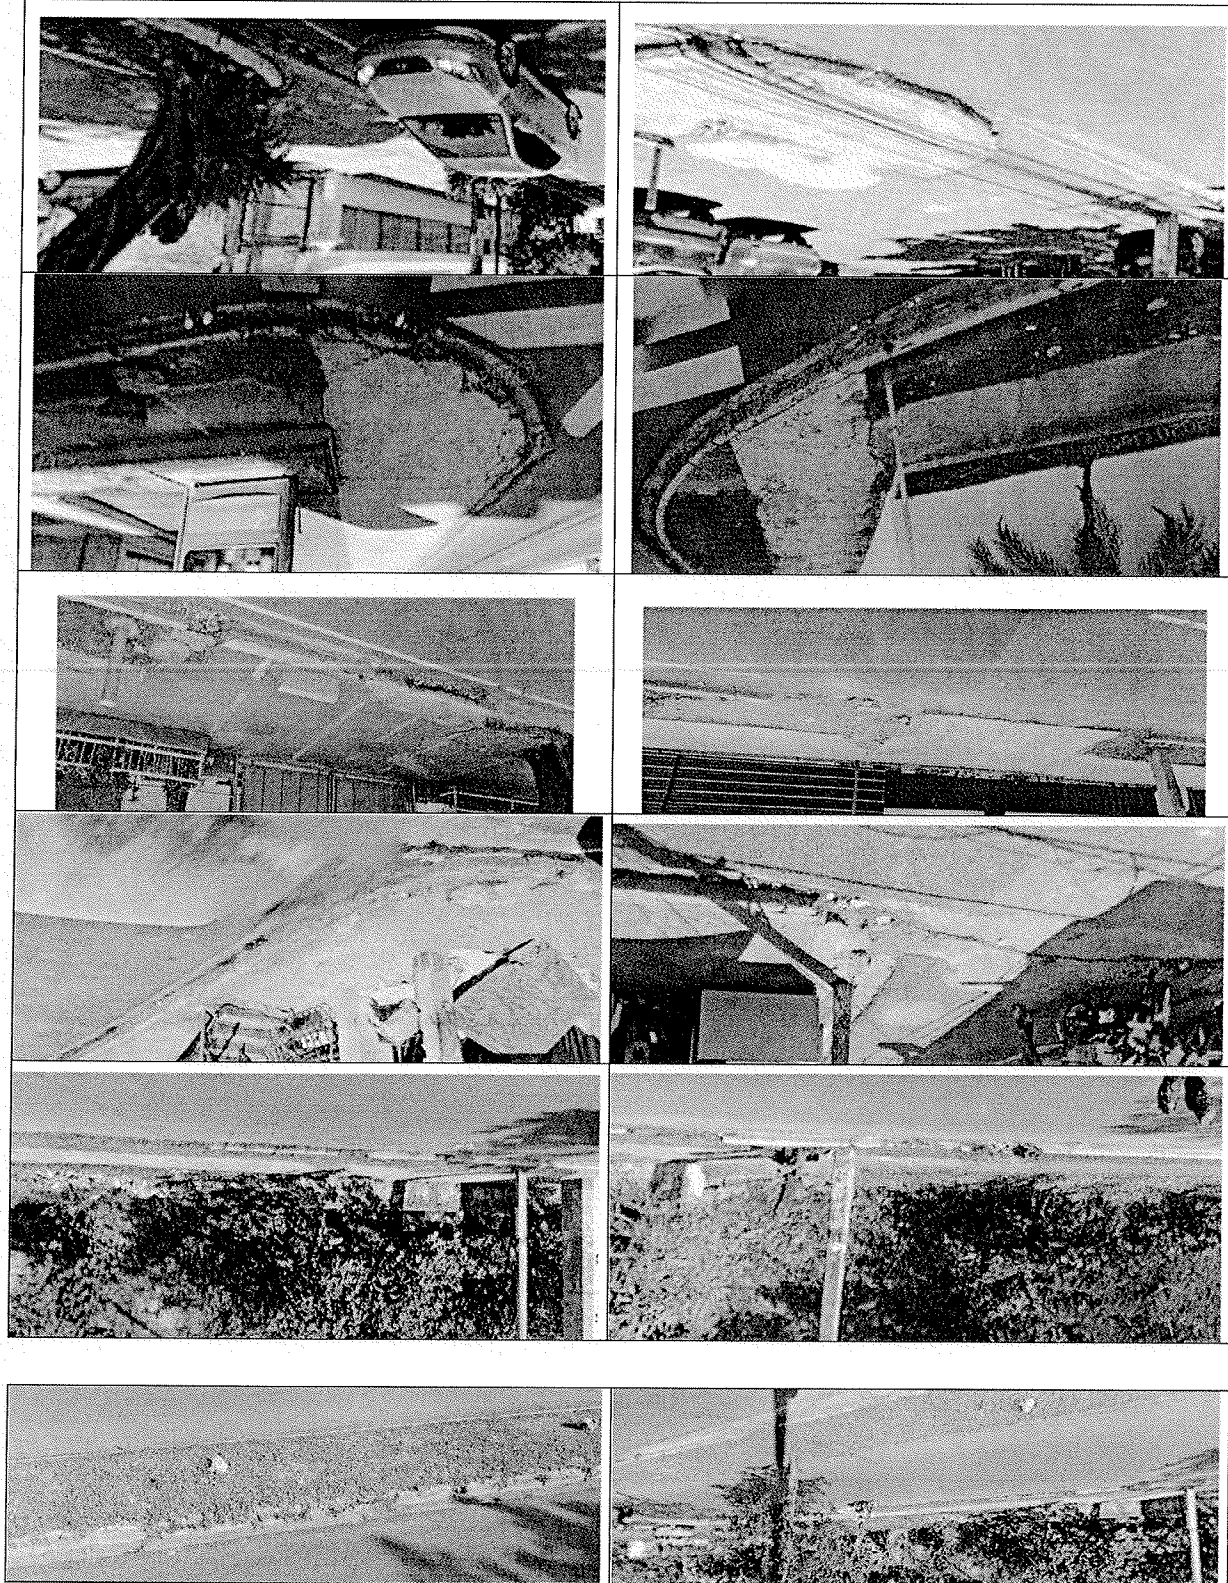


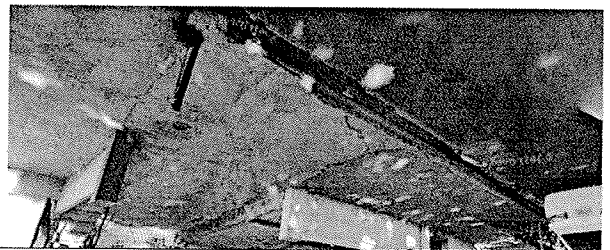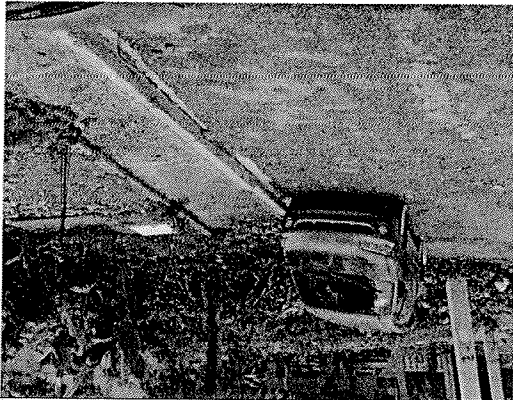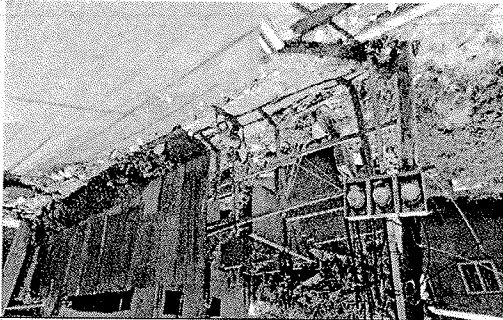

Fotos en Circunscripción 3

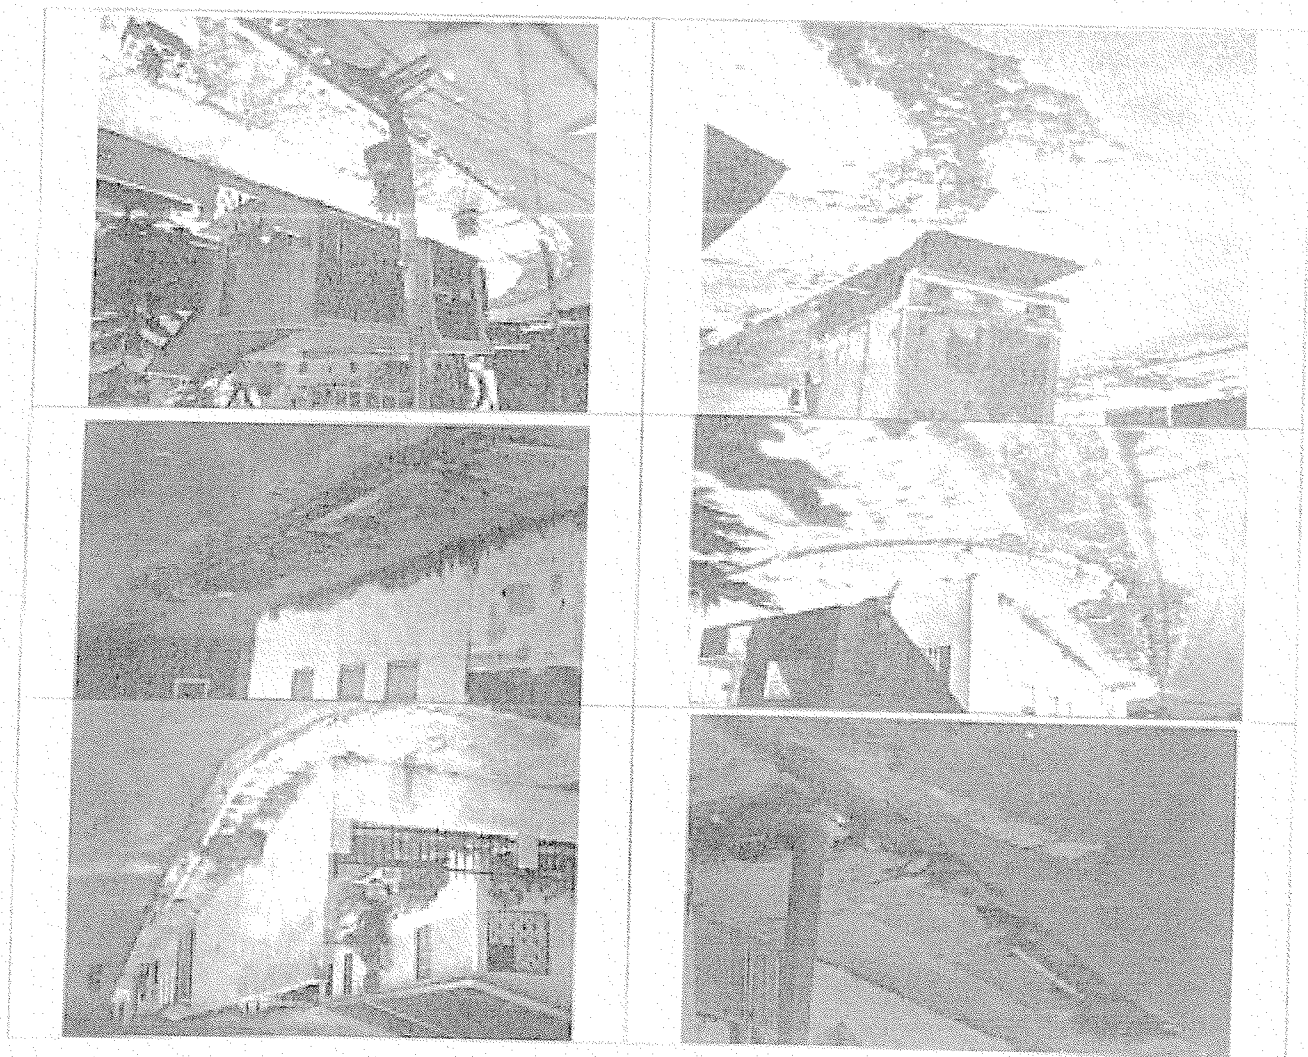

Valida y aprueba los datos suministrados.


Ing. Johan Santiago

Director de Mantenimiento y Obras Comunitarias
Alcaldía de Santo Domingo De Guzmán, Distrito Nacional.

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
