

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 060505
REGIÓN: CIBAO NORDESTE
PROVINCIA: DUARTE
MUNICIPIO: VILLA RIVA
DISTRITO MUNICIPAL: BARRAQUITO


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de mayo de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
2. Elizabeth García

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE MAMA TINGO				149.70	2		299.4
TRAMO B	CALLE LIBERTAD				155.60	2		311.2
TRAMO C	CALLE VICTOR OZORIO				121.15	2		242.3
TRAMO D	CALLE HINOSENCIO ESTEVEZ				119.65	2		239.3
TRAMO E	CALLE GREGORIO RIVAS				67.70	2		135.4
TRAMO F	CALLE GREGORIO LUPERON				194.85	2		389.7
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							0.00	1617.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,906,230.11
Monto desembolsado RD\$ 2,906,230.11 (100%)
Avance de obra 149.05%

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: VILLA RIVA

DISTRITO MUNICIPAL: BARRAQUITO

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,617.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Esta obra fueron ejecutadas por contrato
2. Por demanda de la comunidad y debido al mal estado de la calle, solo se ejecutaron contenes para la habilitación de la mayor cantidad posible de calles.
3. En relación a la ejecución de los contenes en este caso, esta presenta muy buena terminación y replanteo topográfico

IMÁGENES




Técnico

ING. STAYLIN MENDOZA






Técnico

ELIZABETH GARCÍA



Suministra los datos de este reporte,

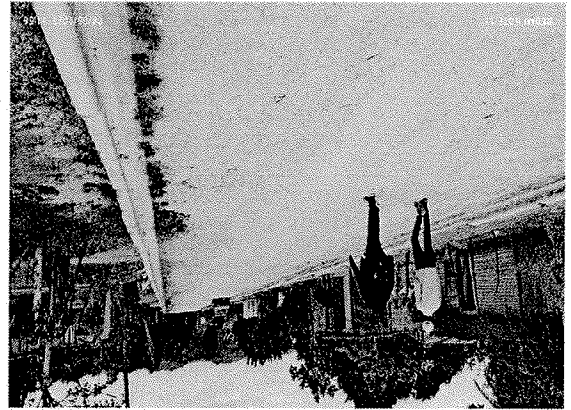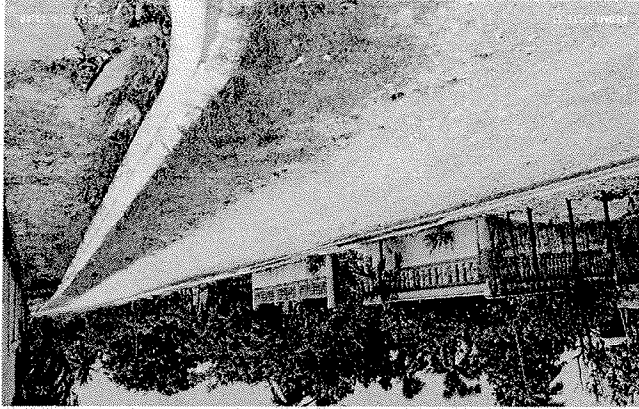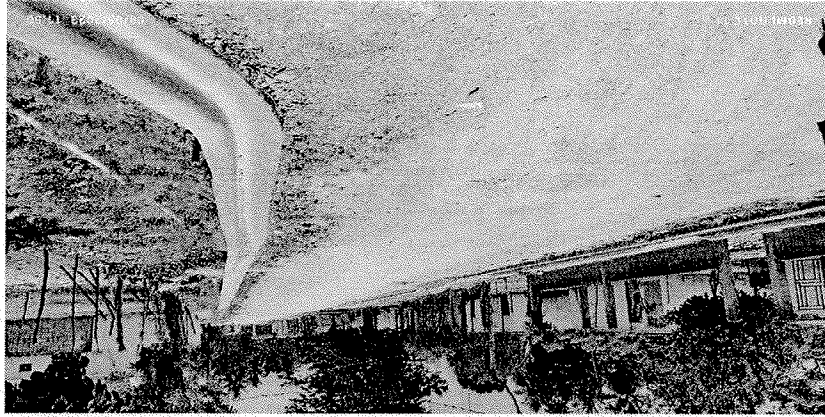

LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

