

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

09/11/2022

Informe Técnico

Asunto: Construcción de aceras y contenes.

La Constructora **GREEN COSTA CONTRACTORS S.R.L** estuvo llevando a cabo la construcción de aceras y contenes en los barrios El Bronx (616.6 mts) y Barrio Hospital (445.8 mts) del Municipio de Río San Juan, la misma bajo supervisión de la **División de Planeamiento Urbano**.

En el transcurso de los días se ha podido percibir y comprobar que el **Proyecto Licitación por Comparación de Precios, Ref. AMRSJ-CP-CCC-2022-0002** ha tenido un rendimiento óptimo, alcanzando el día de hoy un **100% del trabajo**, en términos más exactos, ha construido **1062.64 ml** de aceras y contenes como lo estipulado en el contrato, culminando exitosamente el proyecto.

En la ejecución de la construcción de las aceras y contenes se generaron algunos adicionales debido a que movieron alambradas en zonas que las aceras no contaban con el ancho requerido. En otras zonas se tuvo que colocar material de relleno y concreto de limpieza debido a que era zona pantanosa.

Hay algunos puntos en los que la acera cuenta con unos centímetros menos que lo estipulado (1mt), debido a que al momento del trazado de las calles no se tuvo en consideración el ancho mínimo de la acera y los dueños de los solares construyeron sus casas al límite de la propiedad.

ING. ANTONY RODRIGUEZ SALAZAR

Enc. De La División de Planificación y Programación


Nombre, tramos, longitud, latitud, ancho y datos georreferenciales de las aceras intervenidas.

ACERAS Y CONTENES POR TRAMOS									
TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		ANCHO DE LA CALLE (m)	LONGITUD DE LA CALLE (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD				
Tramo A	Calle Secundaria/ Barrio New York Chiquito	70°04'48"W	19°38'15"N	70°04'47"W	19°38'18"N	5.00	150,00	150,00	150,00
Tramo B	Calle Principal/ Barrio New York Chiquito	70°04'45"W	19°38'18"N	70°04'47"W	19°38'14"N	6.00	475,00	475,00	475,00
Tramo C	Calle Inocencio Martínez./ Barrio del Hospital	70°04'32"W	19°37'55"N	70°04'19"W	19°37'52"N	6.00	374,00	374,00	374,00
Tramo D	Calle Roberto Tucker. / Barrio del Hospital	70°04'20"W	19°38'06"N	70°04'22"W	19°38'07"N	7.00	75,00	75,00	75,00

A continuación, se muestran las imágenes apreciándose los tramos intervenidos ya culminados.

Tramo A: Calle Secundaria/ Barrio New York Chiquito.

Tramo B: Calle Principal/ Barrio New York Chiquito.

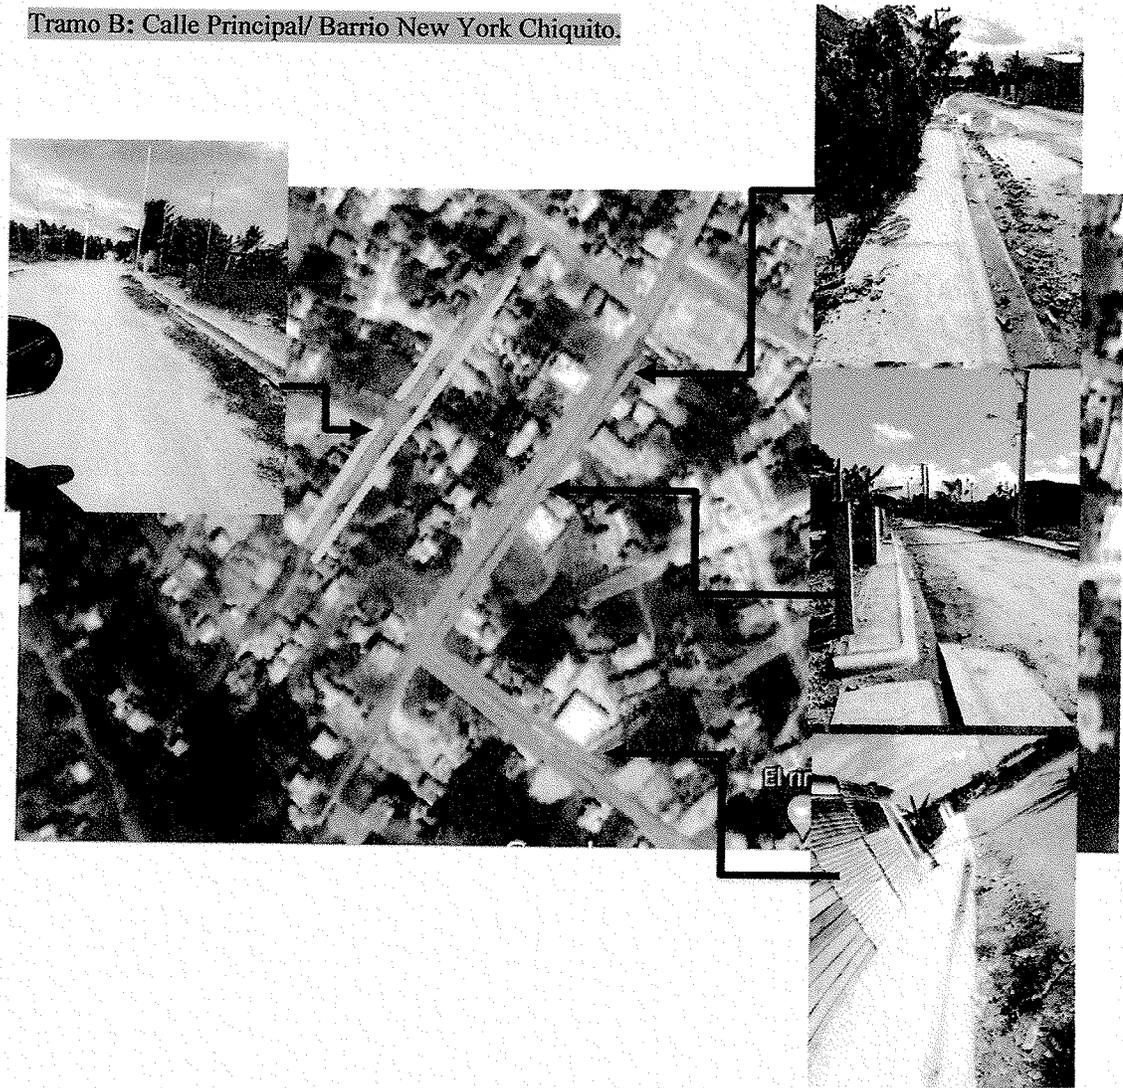

Tramo C: Calle Inocencio Martínez. / Barrio del Hospital

