



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE  
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: HERMANAS MIRABAL  
MUNICIPIO: SALCEDO  
DISTRITO MUNICIPAL: N/A  
BARRIO Y/O SECTOR:

SALIDA AL MUNICIPIO DE VILLA TAPIA, DIRECCION NORTE-SUR, AV. MANOLO TAVARES  
JUSTO, SECTOR EL CHUCHO, MUNICIPIO SALCEDO HERMANAS MIRABAL

2- UNIDAD EJECUTORA ( Marque con una X)

- a. Gobierno Local   
b. Contratista

Razón Social: CARLOS ARTURO BLOISE  
RNC ó Cédula: 055-0040394-3

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ( Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:  
b. Incluye demoliciones de tramos: X  
c. Incluye badenes: X  
d. Otros:


DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.  
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	MANOLO TAVAREZ JUSTO DERECHA AL NORTE-SUR	350903	2142339	350841	2142020	310.00	1.80	310.00	558.00	310.00
Tramo B	MANOLO TAVAREZ JUSTO IZQUIERDA AL NORTE-SUR	350913	2142328	350856	2142024	267.20	2.10	267.20	561.12	267.20
Tramo C										
Tramo D	AMBOS LADOS DE LA CALLE MANOLO TAVAREZ JUSTO, EL ANCHO DE LAS ACERAS SE PRESENTA MUY VARIABLE DE ACUERDO AL ESPACIO DEJADO POR LOS COMERCIOS Y SE PROCEDIO A HACER UN PROMEDIO EN ACUERDO CON EL CONTRATISTA Y EL ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO.									
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



2.75:3  
5.1119.12  
5-577.2

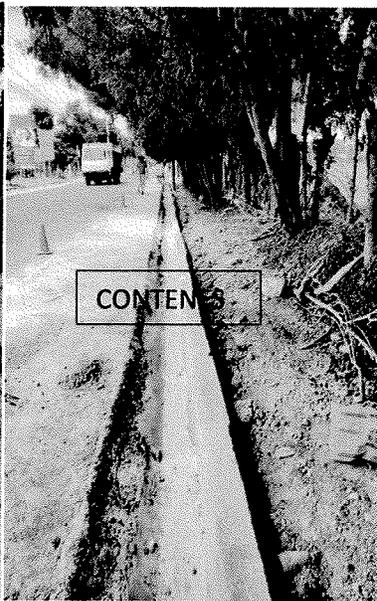

CONTENES



COMPACTADO

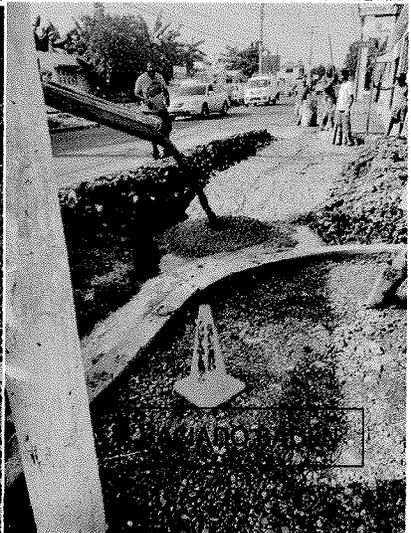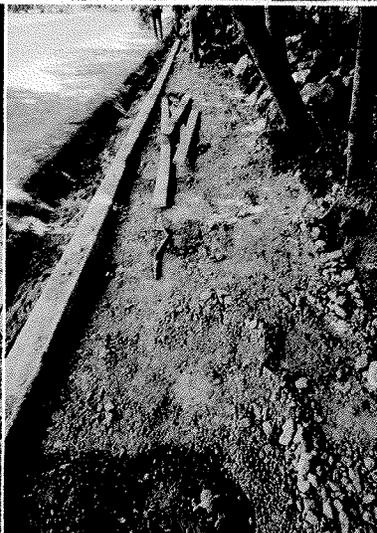




PREPARADO PARA ACERA



ACERA TERMINADA



ESTAMPADO

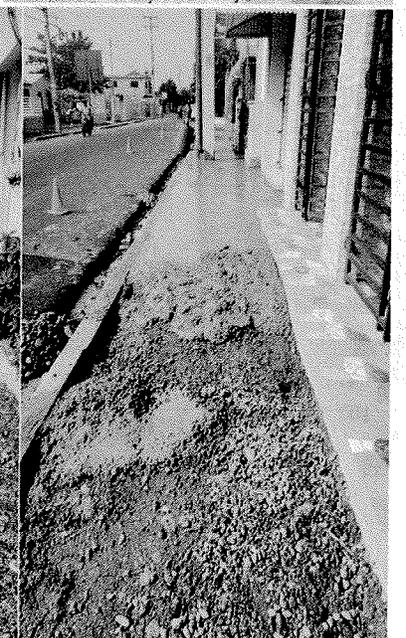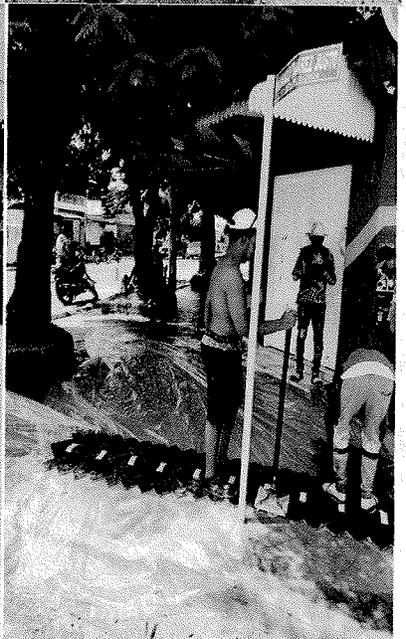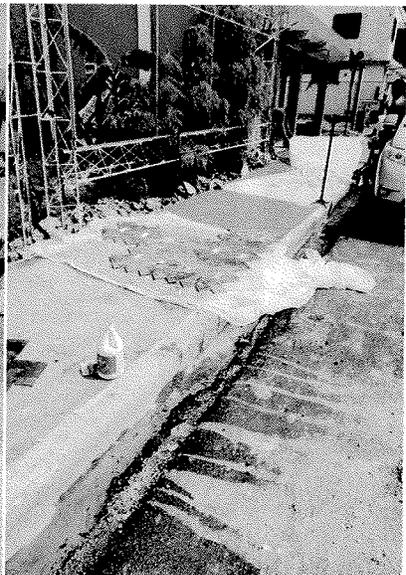

## 5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Reconstrucción Aceras y Contenes Av. Manolo Tavarez Justo, desde calle Cruz Torribio, hasta la calle Fe Ortega, Aceras estampadas Hormigon industrial (E= 0.10mt) 180kg/cm2, Contenes de 0.30 M de telfo hormigon simple 180kg/cm2,vaciado en sitio. Demolicion de aceras y contenes pre-existentes.

## 6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

*FOTOS A NEXAS*

**Suministra los datos de este reporte el Supervisor,**

**NOMBRE COMPLETO:**

*Julio Cesar Espinoza M.*

**FIRMA:**

*[Firma manuscrita]*

**CÉDULA:**

*0560014007-2*

**CODIA:**

*8831*

**FECHA DE LA VISITA**

**TÉCNICA:**

*12/07/2023*

**Valida y aprueba los datos suministrados,**

*[Firma manuscrita]*  
Firma y sello  
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

