

**LIGA MUNICIPAL
-- DOMINICANA --**

Santo Domingo, D.N.
29 de noviembre de 2023

Al:

Ingeniero

Valentín Santos García

Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía:

Ingeniero

Nelson D. Peña Luna

Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto:

Remisión de informe de avance de ejecución de obra de la ampliación de un Cementerio en el Municipio de Villa González.

Tengo a bien dirigirme a usted con atención al informe presentado por el supervisor asignado a la ampliación de un cementerio en el municipio de Villa González, Luego de haber revisado cada detalle del mismo validamos que esta se encuentra en un avance del 55 % aproximadamente.

Para su conocimiento y fines de lugar,



Stephany Castro
Stephany Castro de la Cruz

Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales

Viernes, 17 de noviembre de 2023

INFORME DE OBRA


1. LOCALIZACIÓN

Provincia	Santiago
Municipio	Villa González
Distrito Municipal	N/A
Barrio y/o sector	N/A

2. PROYECTO

Ampliación Del Cementerio El Fermín

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

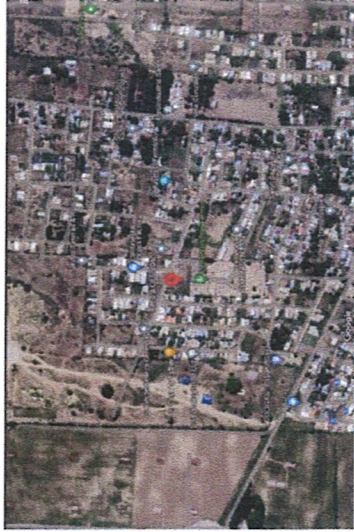

LATITUD

19.549574



LONGITUD

70.789611

4. ALCANCE DEL PROYECTO

En El Siguiente Proyecto Se Pretende Construir de 58 mtl de longitud de **lateral derecho**, 76 mtl de longitud del **lado frontal** y 54 mtl de longitud de **lateral izquierdo** de muros de 6", 10 líneas de blocks sobre el nivel del piso y 3 por debajo de nivel del piso, con viga en la parte superior del muro y columnas divisora de (0.3x0.3), aprox. 2.8 mt de separación y entre columnas. Se pretende construir 195 nichos, los cuales ya están replanteados con su varillaje. Ya se realizó la demolición de 350 mt2 de paredes existente que obstruía con la construcción del proyecto. También la demolición de 233 mt2 aceras deterioradas. Corte de capa vegetal, Relleno compactado (Incluye suministro y colocación). Construcción de 660 mtl de contén para proteger los nichos y para circulación de agua pluvial. Construcción de Puerta de hierro entrada principal según diseño. Construcción de Fosa común de 24mt de ancho por 2.9mt de largo por 24 de profundidad y Remodelación de oficina.

5. CONDICIONES DEL TERRENO



Villa González es un municipio ubicado al pie de la ladera sur de la Cordillera Septentrional, a 14 kilómetros al noroeste de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Tiene una extensión territorial de 104.13 km² y limita al norte con el municipio de Altamira de la Provincia Puerto Plata, al sur con el Distrito municipal La Canela del municipio de Santiago, al este con el municipio de Santiago y al oeste con el Municipio de Villa Bisonó. El 70% de la superficie del municipio es llana y el resto es montañoso. Sus suelos son profundos, sueltos, fértiles, de mediana retención de humedad y ricos en potasio. El terreno donde se está localizado la ampliación del cementerio, se encuentra en un nivel o elevación por debajo de la calle principal lo cual hubo con intervenir con relleno, nivelación y compactación.

6. INFORME DE AVANCE

N/A

7. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



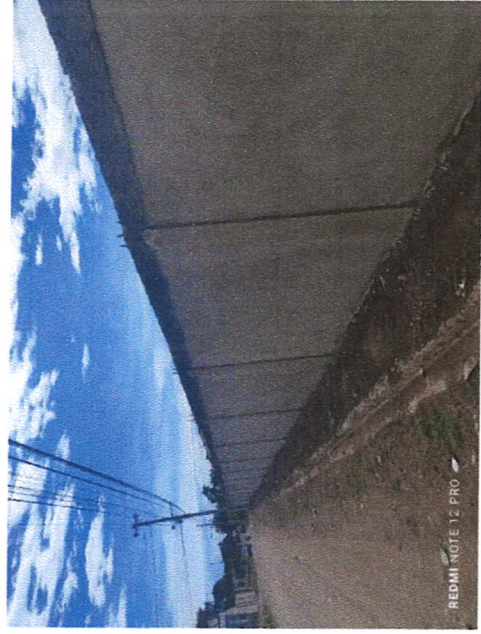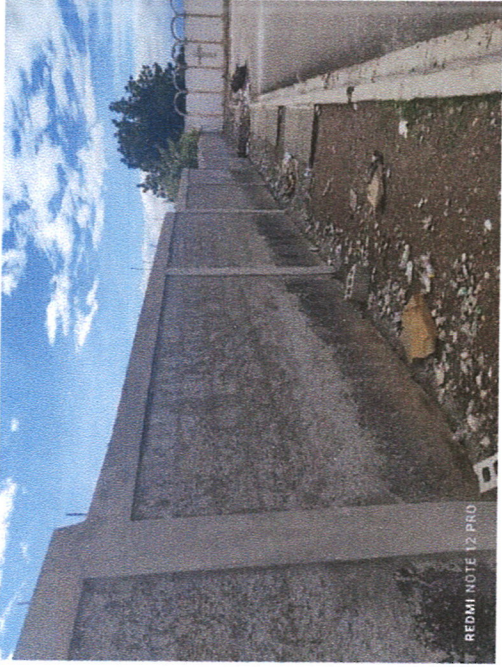



8. OBSERVACIONES

El proyecto se encuentra en un 55% de su ejecución.

9. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:


Yorvi Manuel Hernández A

Yorvi Manuel Hernández

Codia: 43218

Cedula: 402-2464086-8

SUPERVISOR



Cesar Álvarez

Cesar Álvarez

ALCALDE
