

LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 310102

REGIÓN: VALDESA

PROVINCIA: SAN JOSÉ DE OCCA

MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE OCCA

DISTRITO MUNICIPAL: LA CIÉNAGA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17 de abril de 2023

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Sec. Tito c/ ramoncto	269.64	1.00	1	270.20	1	269.64	270.2
TRAMO B	Calle Emilio	56.00	0.75	1	56.00	1	42	56
TRAMO C	Calle Blanco	163.82	1.00	1	184.00	1	163.82	184
TRAMO D	Calle de Euri	137.30	1.00	1	132.50	1	137.3	132.5
TRAMO E	Calle Yavita	88.40	1.00	1	75.7	1	88.4	75.7
TRAMO F	C/1ERA				20.40	1		20.4
TRAMO G	C/2DA	15.80	0.65	2	15.80	2	20.54	31.6
TRAMO H	C/3ERA	48.10	0.85	1	48.10	2	40.885	96.2
TRAMO I	C/4TA	111.50	0.65	1	82	2	72.475	164
TRAMO J	C/5TA				33.6	2		67.2
Total							835.06	1097.80


AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,054,270.36

Monto desembolsado RD\$ 3,054,270.36 (100%)

Avance de obra 127.72%

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: SAN JOSÉ DE OCOA

MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE OCOA

DISTRITO MUNICIPAL: LA CIÉNAGA


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 835.06 metros cuadrados de aceras y 1,097.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Esta junta municipal construyó por contrato.
2. Esta cumple con las normas recomendadas.
3. Fueron ejecutadas ambas partidas tanto aceras como contenes.

IMÁGENES

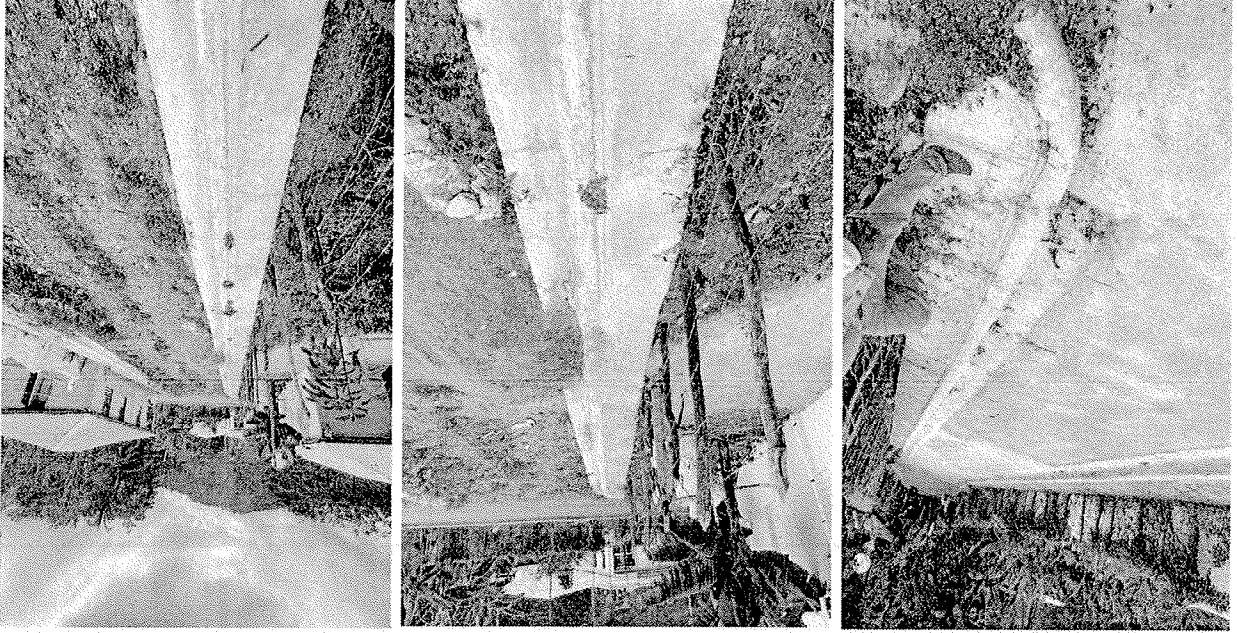




Técnico
CÉSAR DE LOS SANTOS

Técnico
ING. ANA INDHIRA RAMÍREZ

Suministra los datos de este reporte,

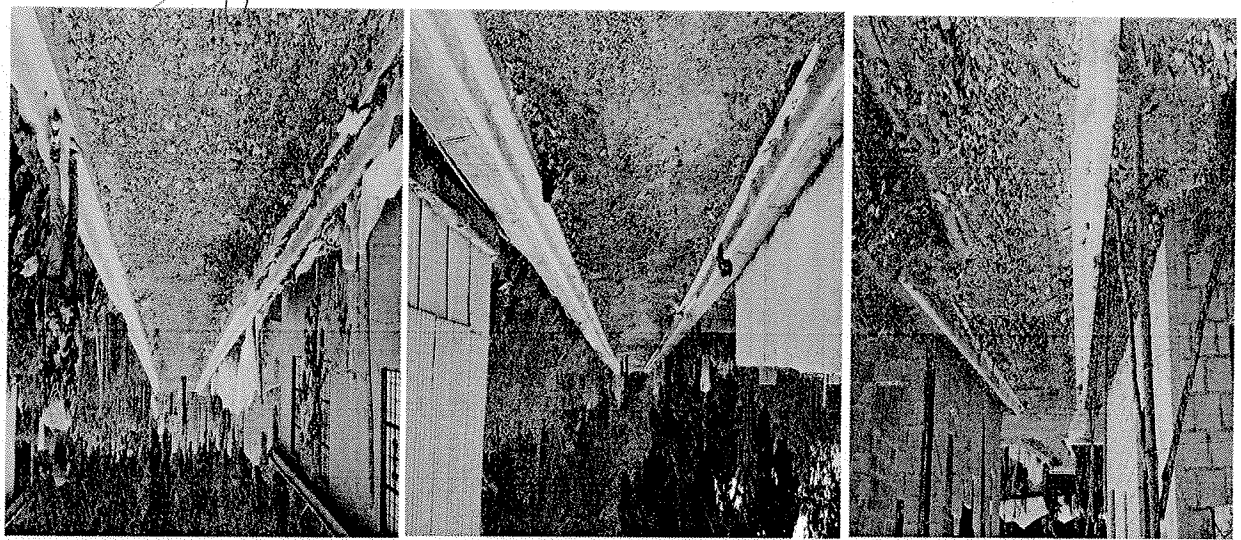

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

