

**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.
26 de junio de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de obra de la Construcción de un Cementerio en el municipio Azua.**



Mediante el informe presentado por el supervisor de la obra, Validamos que esta se encuentra en un avance de más del 75 %

Para su conocimiento y fines de lugar,

Stephany Castro de la Cruz

Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales

Sábado, 27 de mayo de 2023

INFORME DE OBRA


1. LOCALIZACIÓN

Provincia AZUA
Municipio AZUA
Distrito Municipal Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Barrio y/o sector Km 3, Barrio 5 Estrellas


2. PROYECTO

Construcción del Cementerio Municipal

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

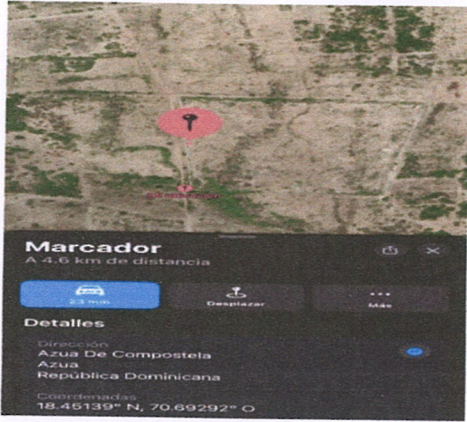

LATITUD

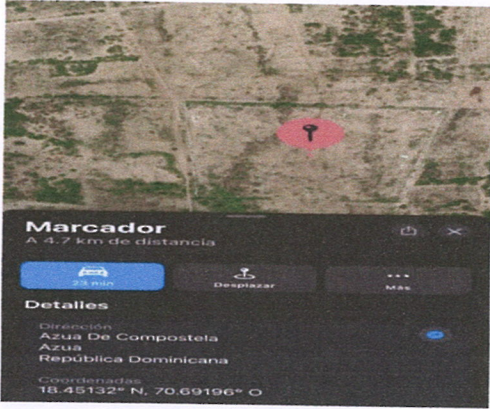

LONGITUD

4-ALCANCE DEL PROYECTO

EL DIA 27 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SUPERVISAMOS ESTE CEMENTERIO MUNICIPAL,ESTE CONSTA CON UN PERIMETRO DE 783 METROS,TIENE 783 ML DE VIGAS DE (0.20X0.20) m,CON UNA ALTURA DE MURO DESDE EL NIVEL DEL TERRENO DE 2.20 m,POSEE 192 COLUMNAS DE (0.20X0.20)m,ACERO VERTICAL DE 4 VARILLAS DE ½" Y ESTRIBOS DE ACERO DE 3/8" A 0.20 m,AL IGUAL QUE LAS VIGAS,LAS COLUMNAS EN LAS ESQUINAS SON DE (0.40X0.40)m. EN LA PUERTA PRINCIPAL TIENE UN AREA DE PAÑETE DE UN LADO 8.81 m DE LARGO Y 2.45 m DE ALTURA Y DEL OTRO LADO TIENE 8.70 m DE LARGO Y 2.23 m DE ALTURA. EN ESTE CEMENTERIO MUNICIPAL SE HA REALIZADO UN DESMONTE,DESTRONQUE Y UN IMPORTANTE MOVIMIENTO DE TIERRA. ESTE PROYECTO TIENE UN ALCANCE EN MAS DE UN 75%.

4. CONDICIONES DEL TERRENO

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Las condiciones del terreno están favorables para desarrollar las actividades constructivas en dicho proyecto.

5. OBSERVACIONES

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

6. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:

Carlos Modesto Navarro Inoa

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Codia: 34554

Cedula: 001-1643975-3

SUPERVISOR

RUDDY GONZALEZ

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

ALCALDE

5- OBSERVACIONES

EL DIA 27 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SUPERVISAMOS ESTE CEMENTERIO MUNICIPAL,ESTE CONSTA CON UN PERIMETRO DE 783 METROS,TIENE 783 ML DE VIGAS DE (0.20X0.20) m,CON UNA ALTURA DE MURO DESDE EL NIVEL DEL TERRENO DE 2.20 m,POSEE 192 COLUMNAS DE (0.20X0.20)m,ACERO VERTICAL DE 4 VARILLAS DE ½” Y ESTRIBOS DE ACERO DE 3/8” A 0.20 m,AL IGUAL QUE LAS VIGAS,LAS COLUMNAS EN LAS ESQUINAS SON DE (0.40X0.40)m. EN LA PUERTA PRINCIPAL TIENE UN AREA DE PAÑETE DE UN LADO 8.81 m DE LARGO Y 2.45 m DE ALTURA Y DEL OTRO LADO TIENE 8.70 m DE LARGO Y 2.23 m DE ALTURA. EN ESTE CEMENTERIO MUNICIPAL SE HA REALIZADO UN DESMONTE,DESTRONQUE Y UN IMPORTANTE MOVIMIENTO DE TIERRA. SU COORDENADAS DE UBICACIÓN SON LAS SIGUIENTES:

LATITUD: 18.450575 , LONGITUD:-70.692956

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO: CARLOS MODESTO NAVARRO INOA
CÉDULA: 001-1643975-3
CODIA: 34554
FECHA DE LA VISITA TÉCNICA: 26/03/2023

Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal





