

**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.  
28 de febrero de 2022

A: **CESAR AUGUSTO ALVAREZ ALVAREZ**  
Alcalde de Villa González  
Sus manos

Asunto: **Datos necesarios para presentar la propuesta de “Construcción de Aceras y Contenes”.**

Muy cortésmente, después de un cordial saludo, le hacemos entrega de la ficha de identificación de proyectos (acera y contenes), con el objetivo de ayudarle a presentar la propuesta de “Construcción de Aceras y Contenes” de forma organizada ajustándola a unos estándares de contenido mínimo que permitan ver su viabilidad.

De igual forma, la ficha de identificación del proyecto debe llenarse y entregarse a la oficina que suscribe (Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y Ordenamiento Territorial), a más tardar el **viernes 11 de marzo del 2022**. Dicha ficha puede ser entregada y solicitada por canales digitales al correo [construccionesmunicipales@lmd.gob.do](mailto:construccionesmunicipales@lmd.gob.do).

Para acompañamiento en el proceso de llenado comuníquese con nosotros vía WhatsApp al siguiente número de teléfono: 849-455-6521, o por teléfono al 809-533-3686 Extensión 5001/170.

Sin otro particular por el momento, le saluda,

Muy atentamente,

**Ing. Valentín Santos García**  
Subsecretario

Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras Públicas,  
Planeamiento y Ordenamiento Territorial



---

## PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

### FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS (ACERAS Y CONTENES)

Llenar la ficha desde el lugar, en presencia de representantes de la junta de vecinos y el Concejo de Regidores. La finalidad es ayudarle a presentar la propuesta de "Construcción de Aceras y Contenes" de forma organizada ajustándola a unos estándares de contenido mínimo que permitan ver su viabilidad.

Para asistencia comuníquese con nosotros vía WhatsApp al siguiente número de teléfono: 849-455-6521, o por teléfono al 809-533-3686 Extensión 5001/ 170.

Nota: En el marco de este programa solo se contempla la construcción nueva de aceras y contenes, todas las obras de reparación, mejora y obras complementarias como badenes, imbornales, etc., corren a cuenta del gobierno local.

#### 1- ASPECTOS GENERALES

**NOTA:** Para la formulación de los presupuestos de aceras y contenes se estima que su gobierno local podría construir **1,478.53 metros** de aceras y contenes en conjunto. Dicho estimado se obtiene partiendo del monto otorgado a su territorio y el precio unitario de construcción de aceras y contenes.

## 1) UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: VILLA GONZÁLEZ

DISTRITO MUNICIPAL: -

BARRIO Y/O SECTOR:

VEASE PAGINA SIGUIENTE ⇒

## 2) UNIDAD EJECUTORA ( Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Liga Municipal Dominicana

## 2- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ( Marque con una X)

### 2.1. Datos técnicos

Los datos requeridos en este numeral son para fines estadísticos. En el marco de este programa solo se contempla la construcción nueva de aceras y contenes, todas las obras de reparación, mejora y obras complementarias como badenes, imbornales, etc., corren con fondos del gobierno local.

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros: \_\_\_\_\_

### 2.2. Nombre, tramos, longitud, ancho y datos georreferenciales de las aceras a intervenir

Tome en su celular la localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps.



# Ayuntamiento del Municipio Villa González

C/ PROF. LUZ PEÑA No.1. VILLA GONZALEZ, SANTIAGO, REP. DOM.

<http://WWW.villagonzalez.gob.do>

[ayuntamientovg.blogspot.com](http://ayuntamientovg.blogspot.com)

[infovillagonzalez@gmail.com](mailto:infovillagonzalez@gmail.com)

Tel.: 829-996-3969

RNC.:4-02-00224-2

Sectores	MTL de Contén
Carretera Palmar frente a la Farmacia care	350
Urbanización el Julissa	1560
Calle la Milagrosa, Palmarejo	400
Calle Carlos García (Los D Aza)	880
Calle los Los Tony, Palmarejo	362
	<b>3,552 mtl</b>

Ingeniero Anthony Almonte  
Oficina Municipal De Planeamiento Urbano (OMPU)



TRAMOS	nombre de la calle	Inicio		Final		ANCHO DE LA CALLE EN (m)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		Latitud	Longitud	Latitud	Longitud		
Tramo A	Carretera principal de Palmar (la lomita)	19°32'37.8"N	70°46'56.4"W	19°32'43.2"N	70°46'48.8"W	7	350
Tramo B		19°32'59.8"N	70°47'21.9"W	19°33'04.3"N	70°47'21.7"W	6.5	300
Tramo C		19°33'00.2"N	70°47'23.9"W	19°33'04.4"N	70°47'23.8"W	6.5	300
Tramo D	Urbanizacion El Julissa	19°33'00.9"N	70°47'25.9"W	19°33'04.4"N	70°47'25.8"W	6.5	300
Tramo E		19°33'01.5"N	70°47'27.7"W	19°33'04.5"N	70°47'27.5"W	6.5	300
Tramo F		19°33'04.3"N	70°47'21.7"W	19°33'04.5"N	70°47'27.5"W	6.5	360
Tramo G	La milagrosa, palmarejo	19°33'03.5"N	70°48'37.1"W	19°33'09.3"N	70°48'34.3"W	5	400
Tramo H	Carlos Juan Garcia (los de Aza)	19°32'38.2"N	70°46'58.7"W	19°32'42.2"N	70°46'56.0"W	5	880
Tramo I	La Tonty estrella, palmarejo	19°33'04.7"N	70°48'42.7"W	19°33'11.4"N	70°48'40.3"W	5	362
							<b>3552</b>

2.2 Entorno inmediato (Edificaciones existentes ): Viviendas:  Escuelas:  Comercio:   
Cuartel Policial:  Iglesias:  Parques:  Canchas y/o Play:  Otros:

### 1- REFERENCIAS DEL SITIO

#### Fotografías de las calles a intervenir

Anexar imágenes de las calles donde se construirá aceras y/o contenes.

*Valida y aprueba los datos suministrados,*




Firma y sello  
**Alcaldía de Villa González, Santiago.**

CARRETERA PRINCIPAL DE PALMAR (LA LOMITA)



**URBANIZACION EL JULISSA**

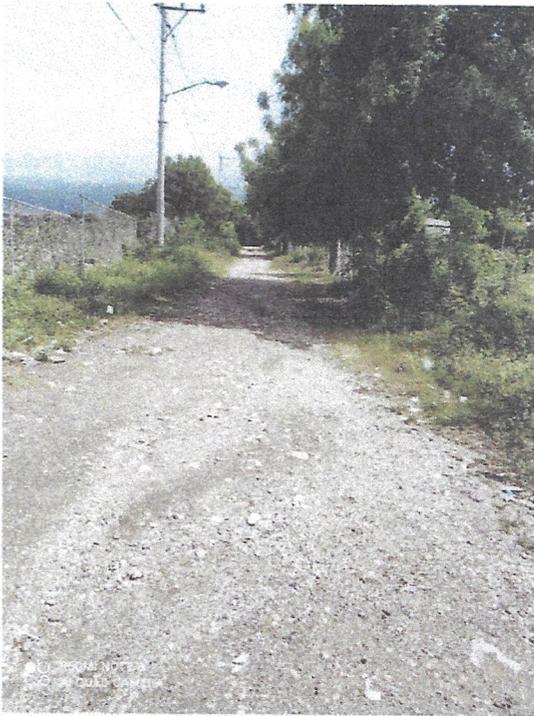

LA MILAGROSA, PALMAREJO



CARLOS JUAN GARCIA (LOS DE AZA)



LA TONTY ESTRELLA, PALMAREJO





# Ayuntamiento del Municipio Villa González

C/ PROF. LUZ PEÑA No.1. VILLA GONZALEZ, SANTIAGO, REP. DOM.  
<http://WWW.villagonzalez.gob.do>  
ayuntamientovg.blogspot.com  
infovillagonzalez@gmail.com  
Tel.: 829-996-3969

RNC.:4-02-00224-2

Obras: Construcción de Aceras y contenes


Conten: 3552 MTL

Lugar: Villa Gonzalez

Fecha: Junio 2022

Partidas	Cant	Unid	Valor	Sub-total	Precio por unidad
Preliminares					
Limpieza	1	PA	17760	17760	
replanteo	1	PA	42624	42624	
					\$ 60,384.00
Movimiento de tierra					
Excavación para aceras y Contenes a mano	710.4	M3	674.44	479122.176	
bote de excavación para aceras y Contenes	888	M3	386.42	343140.96	
Relleno de material compactado e=0.25	0	M3	767.51	0	
Piedra	230	M3	900	207000	
					\$ 1,029,263.14
Hormigón Simple En					
Hormigón Simple en Contenes	3552	ML	986.33	3503444.16	
					\$ 3,503,444.16
Limpieza final					
Limpieza final	1	PA	12171.9	12171.86	
					\$ 12,171.86
				Sub total General	\$ 4,605,263.16
Gastos Generales					
Direc. Técnica y responsabilidad	10.00%			\$ 460,526.32	
Seguro Social y fianza	4.50%			\$ 207,236.84	
Gasto admin	3.00%			\$ 138,157.89	
Transporte	3.00%			\$ 138,157.89	
Fondo de pensiones	1.00%			\$ 46,052.63	
Codia	0.10%			\$ 4,605.26	
			Total	\$ 994,736.84	
				Total General	\$ 5,600,000.00



  
Ingeniero Anthony Almonte  
Oficina Municipal De Planeamiento Urbano (OMPU)
