LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA

Santo Domingo, D.N.
18 de agosto de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución de Las Guáranas**

En la visita técnica realizada el 09 de diciembre de 2022 se validó la ejecución de 1,038.15 metros cuadrados de aceras y 1,073.90 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del "Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales".

La supervisión externa ha validado la ejecución de 82.41 metros cuadrados de aceras y 114.2 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1,120.56 metros cuadrados de aceras y 1188.1 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 060601
REGIÓN: CIBAO NORDESTE
PROVINCIA: DUARTE
MUNICIPIO: LAS GUÁRANAS
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de diciembre de 2022
TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	DON DARIO (CALLE 1RA)	213.00	0.88	2	213.00	2	372.75	426
TRAMO B	DON DARIO (CALLE 2DA)	188.80	1.08	2	188.80	2	405.92	377.6
TRAMO C	LOS GUANDULES (CALLE 1RA)	135.15	0.96	2	135.15	2	259.488	270.3
Total							**1038.16**	**1073.90**

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD$ 4,196,620.52
Monto desembolsado RD$ 4,196,620.52 (100%)
Avance de obra 101.26%

Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686

LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA –

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE
PROVINCIA: DUARTE
MUNICIPIO: LAS GUÁRANAS
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de diciembre de 2022

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,038.16 metros cuadrados de aceras y 1,073.90 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Este presupuesto esta hecho bajo contracto.
2. En la comunidad de Don Daria, hay 2 ml de contenes y aceras en conjunto que deben ser demolidos y construidos nuevamente, para corregir la pendiente del contén y evitar el estancamiento de agua.
3. En la comunidad de Los Guandules hay aproximadamente 30 ml de aceras y contenes en conjunto que deben ser demolidos y construidos nuevamente, para corregir un problema de topografía que afecta una comunidad, especialmente a 3 viviendas que se encuentran de manera desfavorable frente a este tramo. Con la salvedad que se debe de dar un nivel mas bajo en su punto mas alto para evitar el estancamiento de agua en ese tramo y la inundación de dichas viviendas mencionada anteriormente.
4. Se le dará el cierre correspondiente del programa por parte de la institución cuando suministren las evidencias de que ya se corrigieron los fallos mencionados anteriormente.

IMÁGENES

LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA –

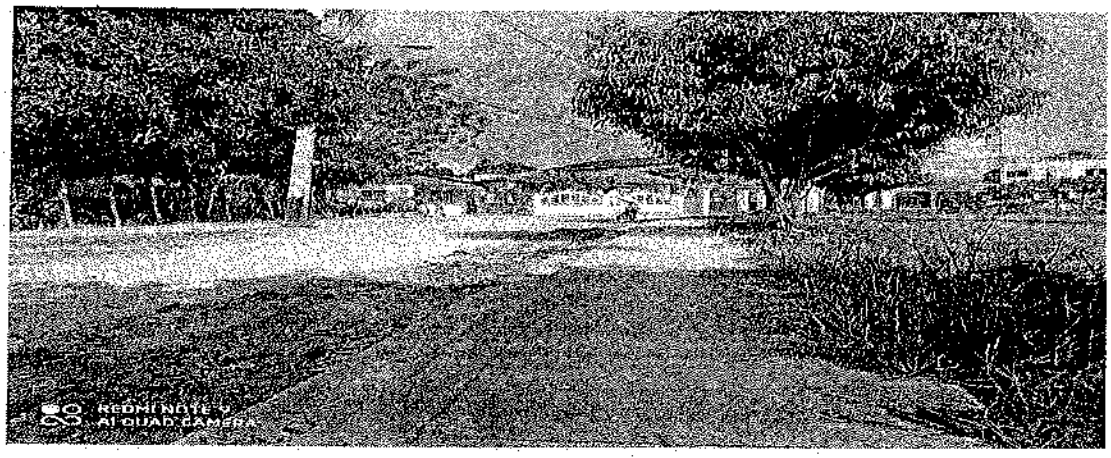

Suministra los datos de este reporte,

ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE MACORIS

DISTRITO MUNICIPAL: LAS GUARANAS

BARRIO Y/O SECTOR:

QUEBRADA PALMA, CERCADA

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local [ ]
b. Contratista [X]

Razón Social: REINY ANTONIO ALVARADO MOREL
RNC ó Cédula: 056-0157162-2

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes: X
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes:
d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A		19.19 4494	70.214378	19193485	70.215126			3.00		3.00
Tramo B						23.00	1.00	23.00	23.00	23.00
Tramo C						4.4	1.27	4.4	5.58	4.4
Tramo D						8.2	1.00	8.2	8.2	8.2
Tramo E						11.6	1.25	11.6	13.92	11.6
Tramo F						8.2	0.98	8.2	8.03	8.2
Tramo G						17.1	1.00	17.1	17.1	17.1
Tramo H						7.6	0.16	7.6	1.21	7.6
Tramo I						6.5	0.14	6.5	0.91	6.5
Tramo J						14.2	0.14	14.2	1.98	14.2
Tramo K								7.2		7.2
Tramo L						3.2	0.71	3.2	2.27	3.2

$\Sigma = 82.41$ $\Sigma = 114.2$

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

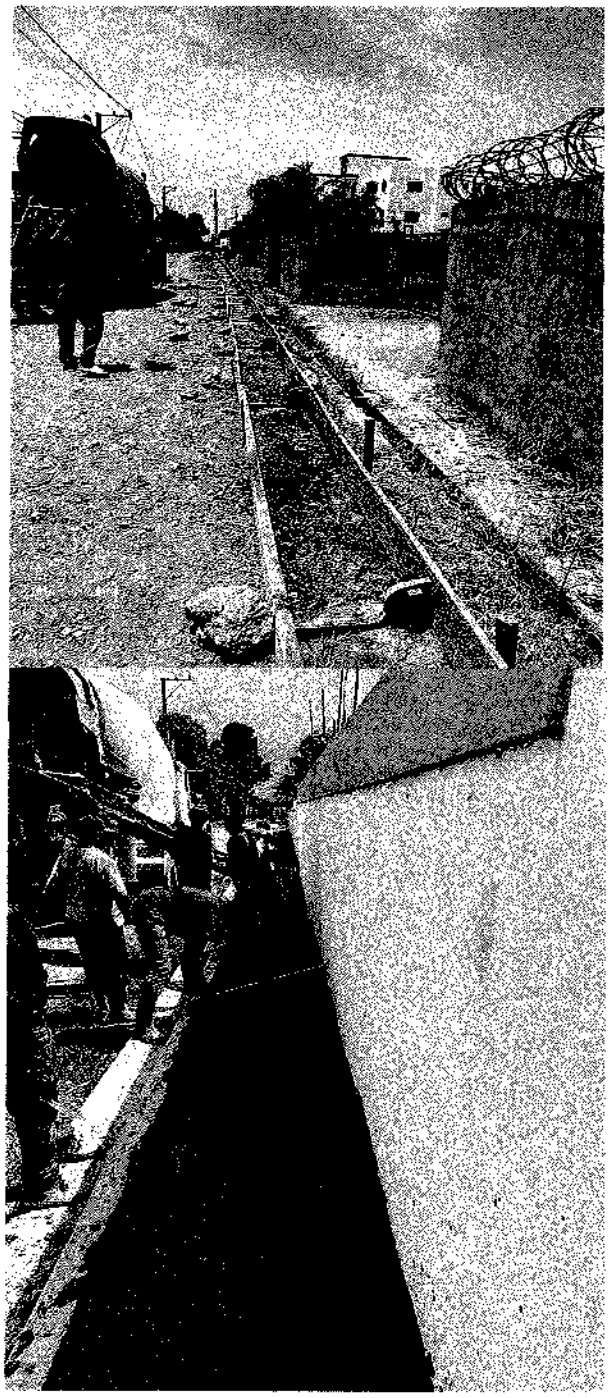

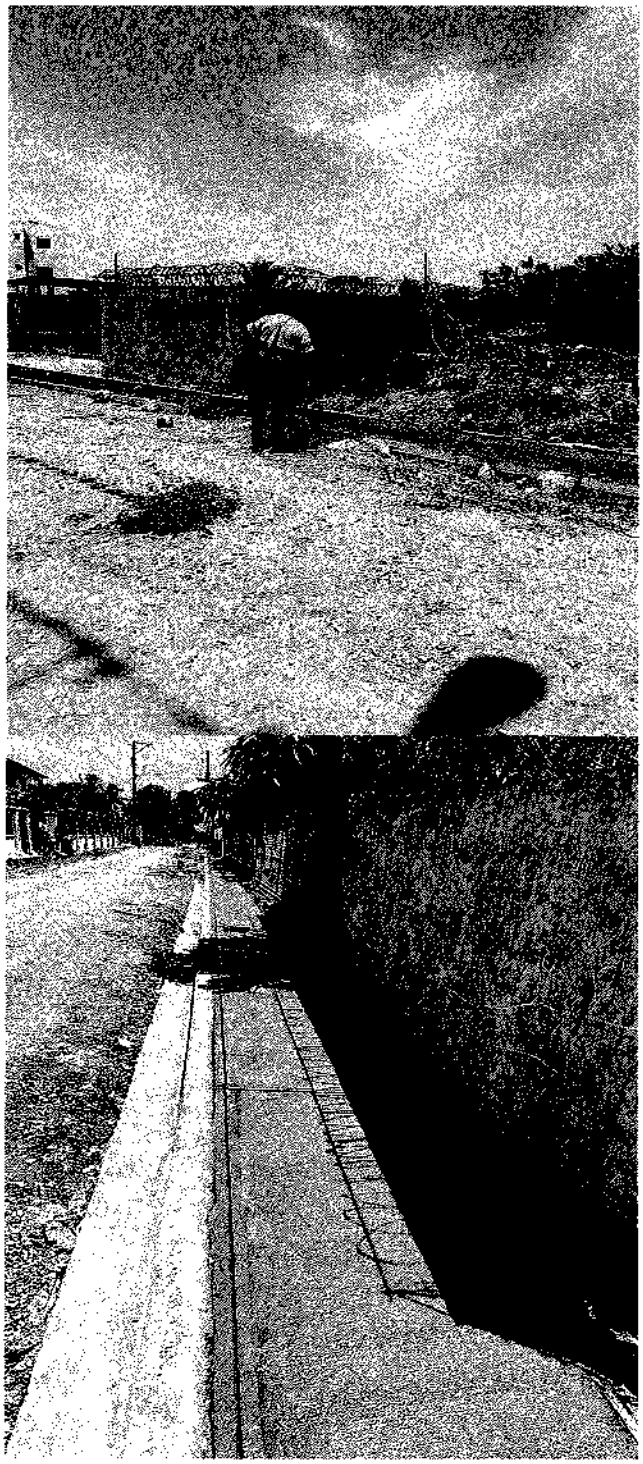

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO: Jalissa Muñoz O.

CÉDULA: 056-014822-2

CODIA: 25464

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA: 5/7/23

Valida y aprueba los datos suministrados,

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal
