AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS

Municipio Los Alcarrizos,
Provincia Santo Domingo.
7 de noviembre del 2022

REMISION EXPEDIENTE

Al : **Sr. Víctor D' Aza**
Secretario General, Su despacho.
Liga Municipal Dominicana.

Asunto : Remisión informe Fondos Recibidos Liga Municipal Dominicana.

Anexo : Informe Dirección Obras Publicas Municipales.

Luego de un cordial saludo, por este medio me dirijo a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento el informe por los fondos recibidos de la Liga Municipal Dominicana para la construcción de Aceras, Contenes y Badenes en el Municipio De los Alcarrizos.

Formalmente se despide.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
10 NOV 2022
Por: Dominga C
Hora: 02:43 Pm

CRISTIAN ENCARNACION
Alcalde Municipal Los Alcarrizos.

809-363-2736 · Email.: ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
C/ Duarte #359, Edificio Municipal, Los Alcarrizos,
Santo Domingo, R.D.

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio Los Alcarrizos,
Provincia Santo Domingo.
7 de noviembre del 2022

DOCP-0036-2022

REMISION EXPEDIENTE

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde Municipal,
Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos, (AMA).

Asunto : Remisión Gastos de Fondos Recibidos por Liga Municipal Dominicana.

Anexo : Soportes Cubicaciones a la fecha.

Muy cortésmente, luego de extenderle un cordial saludo me permito remitirle el informe de inversión de los Fondos recibidos por la **Liga Municipal Dominicana** para la **Construcción de Aceras & Contenes** en los diferentes Sectores del **Municipio de Los Alcarrizos**.

Contratista	Obra	Monto contratado	Cubicado a la Fecha
Ing. Ruddy Mateo Jiménez	**Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, C/ Larimar, C/ Ónice, C/ 1ra y C/ Los Pedros en el Sector La Esmeralda. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.**	**RD$ 5,521,669.30**	**RD$ 5,593,719.34**
Ing. Antonio Rodríguez Hilario	**Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sánchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte,**	**RD$ 6,212,299.63**	**RD$ 6,734,626.65**

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

	C/ Boy scout, en el sector Villa progreso, Chavón (06).		
Grupo Serchas S.R.L.	**Construcción de aceras contenes y badenes de las calles del sector Juana Saltitopa 2da (05). Perteneciente a las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.**	**RD$ 3,893,746.39**	**RD$ 3,940,557.66**
Ing. Wander Joiser Rodríguez Reynoso	**Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Familia, C/ De León, C/ Flores, C/ Reyes, C/ Josué, C/ Ramona, C/ Pineda, C/ Mercedes, C/ Yeny, C/ La Polla en el Sector Las Mercedes. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.**	**RD$ 7,720,182.21**	**RD$ 4,958,601.88**
		MONTO TOTAL RD$	**RD$ 21,227,505.54**

Sin otro particular se despide:

Ing. Freddy Manuel Dini Lebrón
Director de Obras Públicas Municipales,
Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos (AMA).
FL/jr

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario
Dirección de Obras Públicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
4 de Julio de 2022

Oficio No. 006-2022
Contrato No: 022-2022

Al : **Sr. Cristian Encamación**
Alcalde del AMA

Vía : **Lic. Luisanna Guzmán**
Directora de Administrativo

Del : **Ing. Freddy M. Dini Lebrón**
Director de Obras Publicas Municipal

Anexo : Cubicación Autorizada. Fotos.

Asunto	: Solicitud Pago de Cub.2

Muy cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el pago de la cub. 2 Correspondiente a la Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Familia, C/ De León, C/ Flores, C/ Reyes, C/ Josué, C/ Ramona, C/ Pineda, C/ Mercedes, C/ Yeny, C/ La Polla.. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto, del Sector Las Mercedes. Por un monto de **RD$1, 292,072.75 (Un Millón Doscientos Noventa y Dos Mil, Setenta y Dos con 75/100).**

El mismo a nombre de **ING. WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO,** portador de la cedula de identidad y electoral No.**001-1894376-0**

Sin otro particular se despide:

Atentamente:

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario.

Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
4 de Julio 2022

Al	:	**Sr. Cristian Encarnación** Alcalde del AMA
Via	:	**Lic. Luisana Guzmán** Directora del Departamento Administrativo
Del	:	**Ing. Freddy M. Dini Lebrón** Director de Obras Publicas Municipal
Asunto	:	Informe de inspección a nombre Ing. **Wander Joise Rodriguez Reynoso portador** de la cedula de identidad y electoral **No. 001-1894376-0**.
Anexo	:	Presupuesto Autorizado, Fotos y Soporte T.

Muy cortésmente, me dirijo a usted para remitirle el informe de la Inspección de la cub.2 perteneciente al contrato (022-2022) correspondiente a la Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Familia, C/ De León, C/ Flores, C/ Reyes, C/ Josué, C/ Ramona, C/ Pineda, C/ Mercedes, C/ Yeny, C/ La Polla. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. Se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance 45.59%.

Este informe fue suministrado, evaluado y autorizado por la parte interesadas.

Sr. Yan Carlos Navarro
Supervisor de Obras

Ing. Wander Joise Rodriguez Reynoso
Contrastista

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipal

"AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS"

(AMA)

Dirección de Obras Públicas Municipales

Contratista:	**ING. WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO**
Obras:	Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Familia, C/ De León, C/ Flores, C/ Reyes, C/ Josué, C/ Ramona, C/ Pineda, C/ Mercedes, C/ Yeny, C/ La Polla. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.
Co	AMA01-OP0322-P06-M
Sector	Las Mercedes
Cul	2
Fecha:	4 de Julio 2022

No. Contrato 022-2022

Periodo *Junio - Julio 2022*

Monto Contratado	7,720,182.21
Monto a Ejecutar:	6,520,424.16
Monto a ejecutar mas impuestos:	7,720,182.21
Avance Inicial:	1,544,036.44
Avance de Obra:	45.59%

		PRESUPUESTADO				CUBICACION No.1 (Anterior)			CUBICACION No.2 (Actual)			CUBICACION ACUMULADA		
No.	**PARTIDAS**	**Cantidad**	**Unidad**	**Costo Uni.**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**%**	**Cantidad**	**Valor**	**%**	**Cantidad**	**Valor**	**%**
1.01	Valla informativa de la obra	1.00	Ud	13,000.00	13,000.00	1.00	13000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	13000.00	100.00%
				Sub-Total ======>	**13,000.00**	0.00	**13,000.00**			**0.00**			**13000.00**	
II	**MOVIMIENTO DE TIERRA**													
2.01	Demolición de aceras en la C/ Familia, desde la C/ Principal hasta la ca;ada. (228.00*1.00)*2	456.00	m2	100.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00%	317.70	31,770.00	69.67%	317.70	31,770.00	69.67%
2.02	Demolición de contenes en la C/ Familia, desde la C/ Principal hasta la ca;ada. (228.00)*2	456.00	ml	100.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00%	315.40	31,540.00	69.17%	315.40	31,540.00	69.17%
2.03	Demolición de aceras en la C/ De León, desde la C/ Familia hasta C/ Pineda. (121.90*1.00)*2 **Nota: la calle De Leon empieza desde la calle Familia hasta la calle Flores**	243.80	m2	100.00	24,380.00	0.00	0.00	0.00%	115.87	11,587.00	47.53%	115.87	11,587.00	47.53%
2.04	Demolición de contenes en la C/ De León, desde la C/ Familia hasta C/ Pineda. (121.90)*2 **Nota: la calle De Leon empieza desde la calle Familia hasta la calle Flores**	243.80	ml	100.00	24,380.00	0.00	0.00	0.00%	130.20	13,020.00	53.40%	130.20	13,020.00	53.40%
2.05	Demolición de aceras en la C/ Flores, desde la C/ Pineda hasta el Vivero. (84.00*1.00)*2	168.00	m2	100.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00%	34.18	3,418.00	20.35%	34.18	3,418.00	20.35%
2.06	Demolición de contenes en la C/ Flores, desde la C/ Pineda hasta el Vivero. (84.00)*2	168.00	ml	100.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00%	95.20	9,520.00	56.67%	95.20	9,520.00	56.67%
2.07	Demolición de aceras en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia. (93.50*1.00)*2	187.00	m2	100.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%
2.08	Demolición de contenes en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia. (84.00)*2	187.00	ml	100.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%
2.09	Demolición de aceras en la C/ Josué, desde la C/ De León hasta C/ Ramona. (5.60*1.00)*2	11.20	m2	100.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%
2.10	Demolición de contenes en la C/ Josué, desde la C/ De León hasta C/ Ramona. (5.60)*2	11.20	ml	100.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%

2.11	Demolición de aceras en la C/ Ramona, desde la C/ De León hasta la cañada. (25.00*1.00)*2	50.00	m2	100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%
2.12	Demolición de contenes en la C/ Ramona, desde la C/ De León hasta la cañada. (25.00)*2	50.00	ml	100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%
2.13	Demolición de aceras en la C/ Pineda, desde la C/ Familia hasta la C/ Yeny. (166.70*1.00)*2	333.40	m2	100.00	33,340.00	0.00	0.00	0.00%	306.47	30,647.00	91.92%	306.47	30,647.00	91.92%
2.14	Demolición de contenes en la C/ Pineda, desde la C/ Familia hasta la C/ Yeny. (166.70)*2	333.40	ml	100.00	33,340.00	0.00	0.00	0.00%	305.70	30,570.00	91.69%	305.70	30,570.00	91.69%
2.15	Demolición de aceras en la C/ Mercedes, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (125.50*1.00)*2	251.00	m2	100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00%	117.28	11,728.00	46.73%	117.28	11,728.00	46.73%
2.16	Demolición de contenes en la C/ Mercedes, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (166.70)*2	251.00	ml	100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00%	185.60	18,560.00	73.94%	185.60	18,560.00	73.94%
2.17	Demolición de aceras en la C/ Yeny, desde la C/ Profesores hasta la cañada. (145.0*1.00)*2	290.00	m2	100.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00%	104.77	10,477.00	36.13%	104.77	10,477.00	36.13%
*8	Demolición de contenes en la C/ Yeny, desde la C/ Profesores hasta la cañada. (166.70)*2	290.00	ml	100.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00%	163.40	16,340.00	56.34%	163.40	16,340.00	56.34%
19	Demolición de aceras en la C/ Sosa, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (84.00*1.00)*2	168.00	m2	100.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00%	142.61	14,261.00	84.89%	142.61	14,261.00	84.89%
	Demolición de contenes en la C/ Sosa, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (84.00)*2	168.00	ml	100.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00%	143.30	14,330.00	85.30%	143.30	14,330.00	85.30%
2.21	Demolición de aceras en la C/ Profesores, desde la C/ Sosa hasta C/ La Polla. (187.50*1.00)*2	375.00	m2	100.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%
2.22	Demolición de contenes en la C/ Profesores, desde la C/ Sosa hasta C/ La Polla. (187.50)*2	375.00	ml	100.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00%	239.70	23,970.00	63.92%	239.70	23,970.00	63.92%
2.23	Demolición de aceras en la C/ La Polla, desde la C/ Principal hasta la cañada. (210.00*1.00)*2	420.00	m2	100.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%
2.24	Demolición de contenes en la C/ La Polla, desde la C/ Principal hasta la cañada. (210.00)*2	420.00	ml	100.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%
2.25	Demolición de Baden en la C/ Familia esq. C/ De León. (8.2*2.0)	16.40	m2	520.00	8,528.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%
2.26	Demolición de Baden en la C/ Familia esq. C/ Reyes. (8.7*2.0)	17.40	m2	520.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%
2.27	Demolición de Baden en la C/ Ramona esq. C/ (8.5*2.0)	17.00	m2	520.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%
2.28	Demolición de Baden en la C/ Pineda esq. C/ (8.5*2.0)	17.00	m2	520.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%
2.29	Demolición de Baden en la C/ Sosa esq. C/ (8.9*2.0)	17.80	m2	520.00	9,256.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%
				Sub-Total ======>	**635,192.00**		**0.00**			**271,738.00**			**271,738.00**	
III	**HORMIGON SIMPLE**													
3.01	Reconstrucción de aceras en la C/ Familia, desde la C/ Principal hasta la cañada. (228.00*1.00)*2	456.00	m2	933.07	425,479.92	317.70	296,436.34	69.67%		-	0.00%	317.70	296,436.34	69.67%
2	Reconstrucción de contenes en la C/ Familia, desde la C/ Principal hasta la cañada. (228.00)*2	456.00	ml	840.90	383,450.40	315.40	265,219.86	69.17%		-	0.00%	315.40	265,219.86	69.17%
3.03	Reconstrucción de aceras en la C/ De León, desde la C/ Familia hasta C/ Pineda. (121.90*1.00)*2 **Nota: la calle De Leon empieza desde la calle Familia hasta la calle Flores**	243.80	m2	933.07	227,482.47	115.87	108,114.82	47.53%		-	0.00%	115.87	108,114.82	47.53%
3.04	Reconstrucción de contenes en la C/ De León, desde la C/ Familia hasta C/ Pineda. (121.90)*2 **Nota: la calle De Leon empieza desde la calle Familia hasta la calle Flores**	243.80	ml	840.90	205,011.42	130.20	109,485.18	53.40%		-	0.00%	130.20	109,485.18	53.40%
3.05	Reconstrucción de aceras en la C/ Flores, desde la C/ Pineda hasta el Vivero. (84.00*1.00)*2	168.00	m2	933.07	156,755.76	29.30	27,338.95	17.44%	4.88	4,553.38	3%	34.18	31,892.33	20.35%
3.06	Reconstrucción de contenes en la C/ Flores, desde la C/ Pineda hasta el Vivero. (84.00)*2	168.00	ml	840.90	141,271.20	56.40	47,426.76	33.57%	38.80	32,626.92	23%	95.20	80,053.68	56.67%

3.07	Reconstrucción de aceras en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia. (93.50*1.00)*2	187.00	m2	933.07	174,484.09	167.80	156,569.15	89.73%		-	0%	167.80	156,569.15	89.73%
3.08	Reconstrucción de contenes en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia. (84.00)*2	187.00	ml	840.90	157,248.30	167.80	141,103.02	89.73%		-	0%	167.80	141,103.02	89.73%
3.09	Reconstrucción de aceras en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia. (93.50*1.00)*2	187.00	m2	933.07	174,484.09	167.80	-	89.73%		-	0%	167.80	-	89.73%
3.1	Reconstrucción de contenes en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia. (84.00)*2	187.00	ml	840.90	157,248.30	167.80	-	89.73%		-	0%	167.80	-	89.73%
3.09	Reconstrucción de aceras en la C/ Josué, desde la C/ De León hasta C/ Ramona. (5.60*1.00)*2	11.20	m2	933.07	10,450.38	0.00	-	0.00%		-	0%	0.00	-	0.00%
3.1	Reconstrucción de contenes en la C/ Josué, desde la C/ De León hasta C/ Ramona. (5.60)*2	11.20	ml	840.90	9,418.08	0.00	-	0.00%		-	0%	0.00	-	0.00%
3.11	Reconstrucción de aceras en la C/ Ramona, desde la C/ De León hasta la cañada. (25.00*1.00)*2	50.00	m2	933.07	46,653.50	0.00	-	0.00%		-	0%	0.00	-	0.00%
3.12	Reconstrucción de contenes en la C/ Ramona, desde la C/ De León hasta la cañada. (25.00)*2	50.00	ml	840.90	42,045.00	0.00	-	0.00%		-	0%	0.00	-	0.00%
	Reconstrucción de aceras en la C/ Pineda, desde la C/ Familia hasta la C/ Yeny. (166.70*1.00)*2	333.40	m2	933.07	311,085.54	133.50	124,564.85	40.04%	172.97	161,393.12	52%	306.47	285,957.96	91.92%
	Reconstrucción de contenes en la C/ Pineda, desde la C/ Familia hasta la C/ Yeny. (166.70)*2	333.40	ml	840.90	280,356.06	213.70	179,700.33	64.10%	92.00	77,362.80	28%	305.70	257,063.13	91.69%
3.15	Reconstrucción de aceras en la C/ Mercedes, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (125.50*1.00)*2	251.00	m2	933.07	234,200.57	0.00	-	0.00%	117.28	109,430.45	47%	117.28	109,430.45	46.73%
3.16	Reconstrucción de contenes en la C/ Mercedes, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (166.70)*2	251.00	ml	840.90	211,065.90	0.00	-	0.00%	185.60	156,071.04	74%	185.60	156,071.04	73.94%
3.17	Reconstrucción de aceras en la C/ Yeny, desde la C/ Profesores hasta la cañada. (145.0*1.00)*2	290.00	m2	933.07	270,590.30	0.00	-	0.00%	104.77	97,757.74	36%	104.77	97,757.74	36.13%
3.18	Reconstrucción de contenes en la C/ Yeny, desde la C/ Profesores hasta la cañada. (166.70)*2	290.00	ml	840.90	243,861.00	0.00	-	0.00%	163.40	137,403.06	56%	163.40	137,403.06	56.34%
3.19	Reconstrucción de aceras en la C/ Sosa, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (84.00*1.00)*2	168.00	m2	933.07	156,755.76	68.50	63,915.30	40.77%	74.11	69,149.82	44%	142.61	133,065.11	84.89%
3.2	Reconstrucción de contenes en la C/ Sosa, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (84.00)*2	168.00	ml	840.90	141,271.20	89.73	75,453.96	53.41%	53.57	45,047.01	32%	143.30	120,500.97	85.30%
3.21	Reconstrucción de aceras en la C/ Profesores, desde la C/ Sosa hasta C/ La Polla. (187.50*1.00)*2	375.00	m2	933.07	349,901.25	0.00	-	0.00%		-	0%	0.00	-	0.00%
3.22	Reconstrucción de contenes en la C/ Profesores, desde la C/ Sosa hasta C/ La Polla. (187.50)*2	375.00	ml	840.90	315,337.50	0.00	-	0.00%	239.70	201,563.73	64%	239.70	201,563.73	63.92%
3.23	Reconstrucción de aceras en la C/ La Polla, desde la C/ Principal hasta la cañada. (210.00*1.00)*2	420.00	m2	933.07	391,889.40	0.00	-	0.00%		-	0%	0.00	-	0.00%
3.24	Reconstrucción de contenes en la C/ La Polla, desde la C/ Principal hasta la cañada. (210.00)*2	420.00	ml	840.90	353,178.00	0.00	-	0.00%		-	0%	0.00	-	0.00%
				Sub-Total ======>	5,570,975.39		1,595,328.50			1,092,359.07			2,687,687.58	
V	HORMIGON ARMADO													
4.01	Demolición de Baden en la C/ Familia esq C/ De León (8.2*2.0)	16.40	m2	3,344.12	54,843.59	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4.02	Demolición de Baden en la C/ Familia esq C/ Reyes (8.7*2.0)	17.40	m2	3,344.12	58,187.71	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4.03	Demolición de Baden en la C/ Ramona esq C/ (8.5*2.0)	17.00	m2	3,344.12	56,850.06	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4.04	Demolición de Baden en la C/ Pineda esq C/ (8.5*2.0)	17.00	m2	3,344.12	56,850.06	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4.05	Demolición de Baden en la C/ Sosa esq C/ (8.9*2.0)	17.80	m2	3,344.12	59,525.36	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
				Sub-Total ======>	286,256.77		0.00			0.00			0.00	
VII	LIMPIEZA FINAL													
5.01	Limpieza general y final	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
				Sub-Total ======>	15,000.00		0.00			0.00			0.00	

	Sub-Total General				**6,520,424.16**		**1,608,328.504**			**1,364,097.074**			**2,972,425.578**	
B	*GASTOS INDIRECTOS:*													
1.000	*DIRECCION TÉCNICA Y RESP. CIVIL.*		*10.000%*		652,042.42		160,832.85			136,409.71			297,242.56	
1.001	*GASTOS ADMINISTRATIVOS.*		*3.000%*		195,612.72		48,249.86			40,922.91			89,172.77	
1.002	*SEGUROS Y FIANZAS.*		*2.500%*		163,010.60		40,208.21			34,102.43			74,310.64	
1.003	*LIQUIDACIÓN Y PRESTS . LABORALES. Ley 686*		*1.000%*		65,204.24		16,083.29			13,640.97			29,724.26	
1.004	*CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus dependencias*		*0.100%*		6,520.42		1,608.33			1,364.10			2,972.43	
1	*ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo I)*		*18.000%*		117,367.63		28,949.91			24,553.75			53,503.66	
	Total Gastos Indirectos				**1,199,758.05**		**295,932.44**			**250,993.86**			**546,926.31**	
	TOTAL CUBICADO HASTA LA FECHA				**7,720,182.21**		**1,904,260.95**			**1,615,090.94**			**3,519,351.89**	
	Amortizacion 20% valor cubicado						380,852.190			323,018.19			**703,870.39**	
	TOTAL A PAGADA DE CUB. 1						1,523,408.76			1,292,072.75			**1,523,408.76**	
	TOTAL A PAGAR DE CUB. 2												**1,292,072.75**	

Nota: La presente Cubicacion se expide a total responsabilidad del Depto de Supervicion, mediante los supervisores actuantes en la misma -

Preparado Por:

Ing. Daliania Hernandez
Asistente de Presupuesto y Cubicación de OP

Revisador por:

Ing. Nikaudy Rodriguez
Enc. Del Depto. De Cubicación de OP

Aprobado Por:

ING. WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO
Contratista

Datos suministrados por:

Sr. Yan Carlos Navarro
Supervisor del AMA

Revisador por:

Sr. Cesar Peala Frias
Enc. de Supervición

Aprobado Por

Ing. Freddy R. Dini Lebron
Director de la Dirección de Obras Publicas Municipal

Residencial los Mercedes 1)

Cuto. Para Cubicación #2

Procesada 4/7/2022

→ Demolición de Aceras en la c/ Familia (Desde la c/ Principal hasta la Cañada)
317.7 m²

→ Demolición de Cunetas en la c/ Familia (Desde la c/ Principal hasta la cañada)
315.40 ml

→ Demolición de Aceras en la c/ De León (Desde la c/ Familia hasta la c/ Flores)
115.87 m²

→ Demolición de Cunetas en la c/ De León (Desde la c/ Familia hasta la c/ Flores)
130.20 ml

→ Demolición de Aceras en la c/ Flores (Desde la c/ Pinada hasta el Vivero)
34.18 m²

→ Demolición de Cunetas en la c/ Flores (Desde la c/ Pinada hasta el Vivero)
95.20 ml

Conf...

→ Demolición de Aceras en la c/ Pinada (Desde la c/ Fonti hasta la c/ Jerez)

306.47 m²

→ Demolición de Cunetas en la c/ Pinada (Desde la c/ Fonticia hasta la c/ Jerez)

305.70 ml

→ Demolición de Aceras en la c/ Sosa (Desde la c/ Pinada hasta la c/ Piñolla)

142.61 m²

→ Demolición de Cunetas en la c/ Sosa (Desde la c/ Pinada hasta la Cañada)

143.30 ml

→ Demolición de Cunetas en la c/ Propenes (Desde la c/ Sosa hasta la c/ La Polla)

239.70 ml

→ Demolición de Aceras en la c/ Cuenca (Desde la c/ Pinada hasta la cañada)

117.29 m²

→ Demolición de Cunetas en la c/ Cuenca (Desde la c/ Pinada hasta la Cañada)

185.60 ml

Cont...

→ Demolición de aceras en la c/ Yeny (desde la c/ Profesores hasta la frontera)
104.77 m²

→ Demolición de bordillo en la c/ Yeny (desde la c/ Pinada hasta la frontera)
163.40 ml

→ Ejecución de aceras en la c/ Flores (desde la c/ Pinada hasta el Vivero)
4.88 m²

→ Ejecución de bordillo en la c/ Flores (desde la c/ Pinada hasta el Vivero)
38.80 ml

→ Ejecución de aceras en la c/ Pinada (desde la c/ Hamilia hasta la c/ Yeny)
172.97 m²

→ Ejecución de bordillo en la c/ Pinada (desde la c/ Hamilia hasta la c/ Yeny)
92 ml

Cont...

4)

→ Ajunt de Aceras en la c/Sosa (Desde la c/Pinada hasta la Cañada)

74.11 m²

→ Ajunt de Cunetas en la c/Sosa (Desde la c/Pinada hasta la Cañada)

53.57 ml

→ Ajunt de cunetas en la c/Profesores (Desde la c/Sosa hasta la c/la Pella)

239.70 ml

→ Ajunt de Aceras en la c/Mercadez (Desde la c/Pinada hasta la Cañada)

117.26 m²

→ Ajunt de cunetas en la c/Mercadez (Desde la c/Pinada hasta la Cañada)

185.40 ml

→ Ajunt de Aceras en la c/Yeny (Desde la c/Profesores hasta la Cañada)

104.77 m²

→ Ajunt de cunetas en la c/Yeny (Desde la c/Profesores hasta la Cañada)

163.40 ml

Residencial Los Mercedes!! Poro Cab. #2












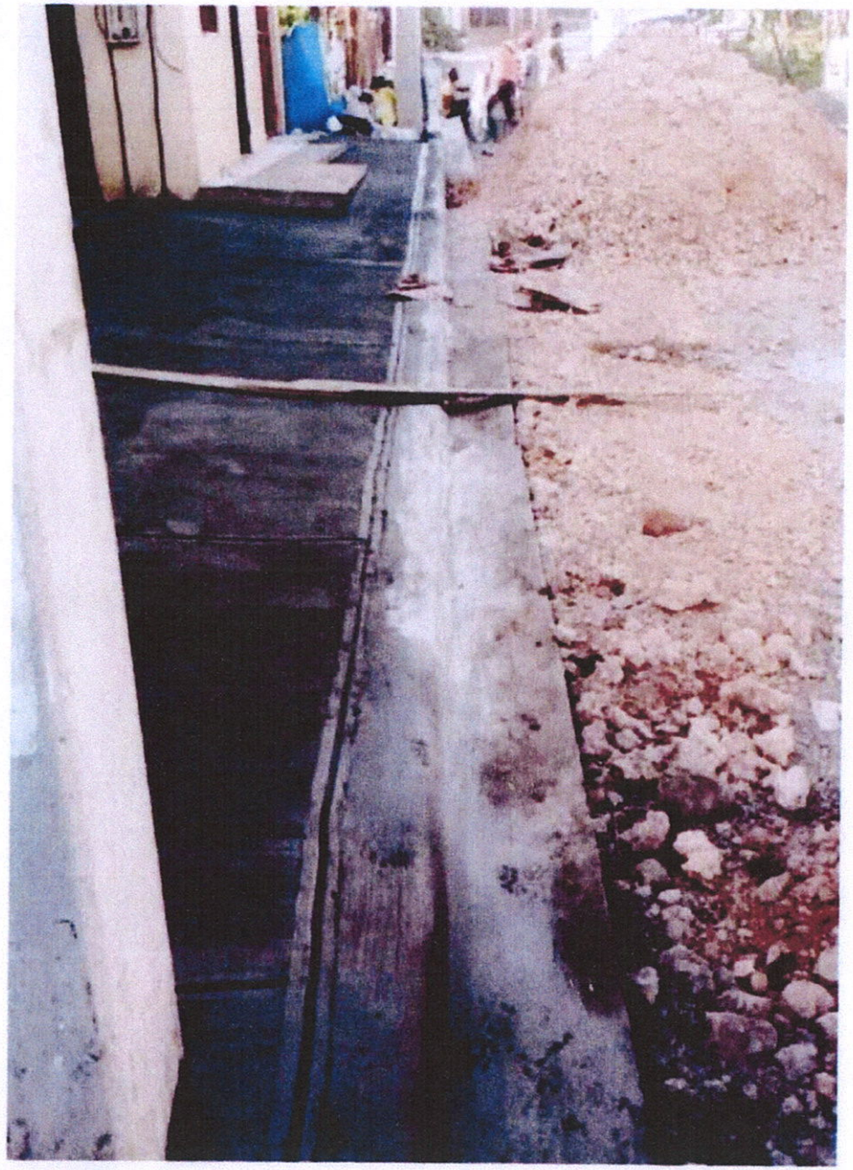

Calle [illegible]arte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

4 de Julio del 2022

"DESPACHO DEL ALCALDE"

A : **Ing. Freddy Dini Lebrón.**
Director de Obras Públicas.

Asunto : **Autorización.**

Luego de extenderle un cordial saludo, por este medio me permito remitirle la autorización a realizar el pago de las partidas correspondientes a (Demoliciones & Badenes) en las cubicaciones, cumpliendo con el pliego de condiciones, correspondientes a las licitaciones realizadas por esta institución con el presupuesto de la Liga Municipal Dominicana.

NO. DE REFERENCIA	SECTOR
AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2022-0003	Sector La Esmeralda.
AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2022-0004	Sector Villa Progreso.
AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2022-0005	Residencial Las Mercedes, Bloque C.
AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2022-0007	Sector Juana Saltitopa.

Sin otro particular y espera de sus buenos oficios le saluda,

Cordialmente:

CRISTIAN ENCARNACIÓN
Alcalde Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS"
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNCIPALES

Al construir las calles de nuestro municipio Los Alcarrizos las pendientes transversales y longitudinales son de vital importancia para la conducción de las aguas pluviales a través de contenes, aceras, badenes e imbornales, además de garantizar la capacidad de conducción y escorrentia de las aguas que se acumulan en la calzada durante los tiempos de lluvias.

Las aceras son las superficies que se construyen con el objetivo de facilitar la movilidad de los peatones en las zonas urbanas, estas además de las obras de arte (contenes, badenes e imbornales) que también son fundamentales para garantizar mayor durabilidad y facilidad de las mismas.

Es por esto que luego de una licitación en la que se ha incluido badenes, relleno, Telford y demoliciones el **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos** no se encuentra en capacidad econonomica de pagar fuera de la misma esos elementos mencionados anteriormente, sería contradictorio para la cámara de cuenta al momento de una auditoria encontrar un proceso licitado dos veces y del mismo sector.

NTO MUNICIPAL DE

A pesar de que la Liga Municipal nos había mandado una ficha técnica para este proceso, nosotros, es decir, El Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos tenemos programado el presupuesto del año entendemos que para mayor factibilidad es necesario que esos items fueran incluidos en el proyecto nosotros como institucion y para mayor transparenciaa en los fondos asignados a traves de la liga municipal dominicana debemos pagar las cubicaciones con los mismos, tal cual se haya hecho en el proceso de licitacion en el cual se encuentran incluidas estas partidas .

Sin otro particular se despide:

Ing. Freddy Manuel Dini Lebrón

Dir. De Obras Públicas Municipales
Del Municipio de los Alcarrizos

Fecha	Concepto	Valor
8/07/2022	P/R: PAGO A FAVOR DEL SR. WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO, PO R CONCEPTO DE CUBICACION #2, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL RECIDENCIAL	1,266,231.29

7261

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
PROGRAMA DE INVERSION

No. 018600

DIA	MES	AÑO
08	07	2022

0016872

RNC: 430-04253-6
DO28BRRD00000000002440009274

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO **RD$** *1,266,231.29

*** UN MILLON DOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 29/100 ***

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

I Rodriguez

FIRMA(S)

"018600" 244122721310244000927 4" 28

Cap. No. _____ *Sub-Objeto* _____ *Fondo* _____ *Comprobante No.* _____ *Fecha* _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
No. Comprobante .. : 2202778 P/R: PAGO A FAVOR DEL SR. WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO, POR CONCEPTO DE CUBICACION #2, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL RECIDENCIAL LAS MERCEDES, EN LO		Estructura Clasific. 0011010098 272401	1,266,231.29
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2202778
FECHA 8/07/2022
SECUENCIAL: 2818

TIPO COMPROBANTE: 2202777 **Etapa:** Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 18121 **RNC/CED/PAS:** 00118943760
BENEFICIARIO: WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO
DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R: PAGO A FAVOR DEL SR. WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO, POR CONCEPTO DE CUBICACION #2, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL RECIDENCIAL LAS MERCEDES, EN LOS ALCARRIZOS, CONTRATO NO. 022/2022. D/F 07/07/2022. ANEXO***UN MILLON DOSCIENTOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 29/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0098	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,292,072.75
					Menos las siguientes Retenciones	
00 11 01 0098	272401	40	9992	103	MENOS 2% De: 1,292,072.75	(25,841.46)
					**** Debajo de esta linea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 1,266,231.29

CK No.	Monto	Fecha

001-1894940-0
Beneficiario

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2202777
FECHA 8/07/2022
SECUENCIAL: 2817

TIPO COMPROBANTE: 2202778 — Etapa: Devengado
CLASE DOCUMENTO: Original — Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 18121 — RNC/CED/PAS: 00118943760
BENEFICIARIO: WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO
DIRECCION: — TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R: PAGO A FAVOR DEL SR. WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO, POR CONCEPTO DE CUBICACION #2, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL RECIDENCIAL LAS MERCEDES, EN LOS ALCARRIZOS, CONTRATO NO. 022/2022. D/F 07/07/2022. ANEXO***UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 75/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0098	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,292,072.75
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 1,292,072.75

CK No.	Monto	Fecha

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Beneficiario

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Alcalde

Contralor Municipal

Tesorero

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

DIRECCION ADMINISTRATIVA

07 de julio de 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde Municipal

Vía : Dirección Financiera

De la : Dirección Administrativa

Asunto : Pago de cubicación #2

Distinguidos Señores:

Cortésmente le estamos solicitando el pago a favor de**: Wander J. Rodríguez Reynoso.**

Codia: Contrato No. **022/2022**. - RNC: **001-1082606-2** -

Monto a pagar**: 1,292,072.75 (UN MILLON DOCIENTOS NOVEINTA Y DOS MIL.SETENTA Y DOS PESOS CON 75/100).**

Por concepto de Pago de: Cubicación **#2**, para la construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes calles del Residencial Las Mercedes, en los Alcarrizos.

Atentamente,

Lcda. Luisana Guzmán
Administrativa

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA REVISADO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario
Dirección de Obras Públicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
19 de mayo de 2022

Oficio No. 005-2022
Contrato No: 022-2022

Al : **Sr. Cristian Encamación**
Alcalde del AMA

Via : **Lic. Luisanna Guzmán**
Directora de Administrativo

Del : **Ing. Freddy M. Dini Lebrón**
Director de Obras Publicas Municipal

Anexo : Cubicación Autorizada. Fotos.

Asunto	: Solicitud Pago de Cub.1

Muy cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el pago de la cub. 1 Correspondiente a la Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Familia, C/ De León, C/ Flores, C/ Reyes, C/ Josué, C/ Ramona, C/ Pineda, C/ Mercedes, C/ Yeny, C/ La Polla.. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. Por un monto de **RD$1, 523,408.76 (Un Millón Quinientos Veinte Tres Mil, Cuatrocientos Ocho con 76/100).**

El mismo a nombre de **ING. WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO,** portador de la cedula de identidad y electoral No.**001-1894376-0**

Sin otro particular se despide:

Atentamente:

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Publica Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS AMA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario.

Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
19 mayo 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde del AMA

Via : **Lic. Luisana Guzmán**
Directora del Departamento Administrativo

Del : **Ing. Freddy M. Dini Lebrón**
Director de Obras Publicas Municipal

Asunto : Informe de inspección a nombre Ing. **Wander Joise Rodriguez Reynoso portador** de la cedula de identidad y electoral **No. 001-1894376-0**.

Anexo : Presupuesto Autorizado, Fotos y Soporte T.

Muy cortésmente, me dirijo a usted para remitirle el informe de la Inspección de la cub.1 perteneciente al contrato (022-2022) correspondiente a la Construccion de aceras, contenes y badenes en las C/ Familia, C/ De León, C/ Flores, C/ Reyes, C/ Josué, C/ Ramona, C/ Pineda, C/ Mercedes, C/ Yeny, C/ La Polla. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. Se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance 24.67%

Este informe fue suministrado, evaluado y autorizado por la parte interesadas

Sr. Yan Carlos Navarro
Supervisor de Obras

Ing. Wander Joise Rodriguez Reynoso
Contrastista

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS, AMA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO
Prov. Sto. Dgo. R.D.

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Publicas Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0222951267471**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO**, RNC No. **00118943760**, con su domicilio y Asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN,** Administración Local **ADM LOCAL LOS PRÓCERES**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto
• **IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.**

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los **treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (**30**) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

Código de firma: F1WP-N0JY-LP11-6486-6746-5190
sha1: UNcZyBLbiuM1SgVaZyirBqsUcHQ=
DGII - OFICINA VIRTUAL
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

F1WP-N0JY-LP11-6486-6746-5190

Verifique la legitimidad de la presente certificación en **http://www.dgii.gov.do/verifica** o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

"AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS"
(AMA)
Dirección de Obras Públicas Municipales

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA REVISADO

Contratista:	**ING. WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO**
Obra:	Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Familia, C/ De León, C/ Flores, C/ Reyes, C/ Josué, C/ Ramona, C/ Pineda, C/ Mercedes, C/ Yerry, C/ La Polla. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto
Cod:	AMA01-OP0322-P06-M
Sector:	Las Mercedes
Cub. No.	1
Fecha:	17 de Mayo 2022

No. Contrato 022-2022

Periodo Abril Mayo 2022

Monto Contratado	7,720,182.21
Monto a Ejecutar:	6,520,424.16
Monto a ejecutar mas Impuestos:	7,720,182.21
Avance Inicial:	1,544,036.44
Avance de Obra:	24.67%

No.	PARTIDAS	PRESUPUESTADO Cantidad	Unidad	Costo Unit	Valor	CUBICACION ACTUAL Cantidad	Valor	%	CUBICACION ANTERIOR Cantidad	Valor	%	CUBICACION ACUMULADA Cantidad	Valor	%
1.01	Valla informativa de la obra	1.00	Ud	13,000.00	13,000.00	1.00	13000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	13000.00	100.00%
				Sub-Total ==========>	13,000.00	0.00							13000.00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA													
2.01	Demolición de aceras en la C/ Familia, desde la C/ Principal hasta la cañada. (228.00*1.00)*2	456.00	m2	100.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.02	Demolición de contenes en la C/ Familia, desde la C/ Principal hasta la cañada. (228.00)*2	456.00	ml	100.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.03	Demolición de aceras en la C/ De León, desde la C/ Familia hasta C/ Pineda. (121.90*1.00)*2 **Nota: la calle De Leon empieza desde la calle Familia hasta la calle Flores**	243.80	m2	100.00	24,380.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.04	Demolición de contenes en la C/ De León, desde la C/ Familia hasta C/ Pineda. (121.90)*2 **Nota: la calle De Leon empieza desde la calle Familia hasta la calle Flores**	243.80	ml	100.00	24,380.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.05	Demolición de aceras en la C/ Flores, desde la C/ Pineda hasta el Vivero. (84.00*1.00)*2	168.00	m2	100.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.06	Demolición de contenes en la C/ Flores, desde la C/ Pineda hasta el Vivero. (84.00)*2	168.00	ml	100.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.07	Demolición de aceras en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia. (93.50*1.00)*2	187.00	m2	100.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.08	Demolición de contenes en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia. (84.00)*2	187.00	ml	100.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.09	Demolición de aceras en la C/ Josué, desde la C/ De León hasta C/ Ramona. (5.60*1.00)*2	11.20	m2	100.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.10	Demolición de contenes en la C/ Josué, desde la C/ De León hasta C/ Ramona. (5.60)*2	11.20	ml	100.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

2.11	Demolición de aceras en la C/ Ramona, desde la C/ De León hasta la cañada. (25.00*1.00)*2	50.00	m2	100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.12	Demolición de contenes en la C/ Ramona, desde la C/ De León hasta la cañada. (25.00)*2	50.00	ml	100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.13	Demolición de aceras en la C/ Pineda, desde la C/ Familia hasta la C/ Yeny. (166.70*1.00)*2	333.40	m2	100.00	33,340.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.14	Demolición de contenes en la C/ Pineda, desde la C/ Familia hasta la C/ Yeny. (166.70)*2	333.40	ml	100.00	33,340.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.15	Demolición de aceras en la C/ Mercedes, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (125.50*1.00)*2	251.00	m2	100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.16	Demolición de contenes en la C/ Mercedes, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (166.70)*2	251.00	ml	100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.17	Demolición de aceras en la C/ Yeny, desde la C/ Profesores hasta la cañada. (145.0*1.00)*2	290.00	m2	100.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	Demolición de contenes en la C/ Yeny, desde la C/ Profesores hasta la cañada. (166.70)*2	290.00	ml	100.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.19	Demolición de aceras en la C/ Sosa, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (84.00*1.00)*2	168.00	m2	100.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.20	Demolición de contenes en la C/ Sosa, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (84.00)*2	168.00	ml	100.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.21	Demolición de aceras en la C/ Profesores, desde la C/ Sosa hasta C/ La Polla. (187.50*1.00)*2	375.00	m2	100.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.22	Demolición de contenes en la C/ Profesores, desde la C/ Sosa hasta C/ La Polla. (187.50)*2	375.00	ml	100.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.23	Demolición de aceras en la C/ La Polla, desde la C/ Principal hasta la cañada. (210.00*1.00)*2	420.00	m2	100.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.24	Demolición de contenes en la C/ La Polla, desde la C/ Principal hasta la cañada. (210.00)*2	420.00	ml	100.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.25	Demolición de Baden en la C/ Familia esq. C/ De León. (8.2*2.0)	16.40	m2	520.00	8,528.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.26	Demolición de Baden en la C/ Familia esq. C/ Reyes. (8.7*2.0)	17.40	m2	520.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.27	Demolición de Baden en la C/ Ramona esq. C/ (8.5*2.0)	17.00	m2	520.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.28	Demolición de Baden en la C/ Pineda esq. C/ (8.5*2.0)	17.00	m2	520.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.29	Demolición de Baden en la C/ Sosa esq. C/ (8.9*2.0)	17.80	m2	520.00	9,256.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
				Sub-Total ==========>	**635,192.00**								**0.00**	
III	REMODELACION VIAL													
3.01	Reconstrucción de aceras en la C/ Familia, desde la C/ Principal hasta la cañada. (228.00*1.00)*2	456.00	m2	933.07	425,479.92	317.70	296,436.34	69.67%	0.00	0.00	0.00%	317.70	296436.34	0.00%
3.02	Reconstrucción de contenes en la C/ Familia, desde la C/ Principal hasta la cañada. (228.00)*2	456.00	ml	840.90	383,450.40	315.40	265,219.86	69.17%	0.00	0.00	0.00%	315.40	265219.86	0.00%
3.03	Reconstrucción de aceras en la C/ De León, desde la C/ Familia hasta C/ Pineda. (121.90*1.00)*2 **Nota: la calle De Leon empieza desde la calle Familia hasta la calle Flores**	243.80	m2	933.07	227,482.47	115.87	108,114.82	47.53%	0.00	0.00	0.00%	115.87	108114.82	0.00%
3.04	Reconstrucción de contenes en la C/ De León, desde la C/ Familia hasta C/ Pineda. (121.90)*2 **Nota: la calle De Leon empieza desde la calle Familia hasta la calle Flores**	243.80	ml	840.90	205,011.42	130.20	109,485.18	53.40%	0.00	0.00	0.00%	130.20	109485.18	0.00%
3.05	Reconstrucción de aceras en la C/ Flores, desde la C/ Pineda hasta el Vivero. (84.00*1.00)*2	168.00	m2	933.07	156,755.76	29.30	27,338.95	17.44%	0.00	0.00	0.00%	29.30	27338.95	0.00%
3.06	Reconstrucción de contenes en la C/ Flores, desde la C/ Pineda hasta el Vivero. (84.00)*2	168.00	ml	840.90	141,271.20	56.40	47,426.76	33.57%	0.00	0.00	0.00%	56.40	47426.76	0.00%

3.07	Reconstrucción de aceras en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia. (93.50*1.00)*2	187.00	m2	933.07	174,484.09	167.80	156569.15	89.73%	0.00	0.00	0.00%	167.80	156569.15	0.00%
3.08	Reconstrucción de contenes en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia. (84.00)*2	167.00	ml	840.90	157,248.30	167.80	141103.02	89.73%	0.00	0.00	0.00%	167.80	141103.02	0.00%
3.09	Reconstrucción de aceras en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia. (93.50*1.00)*2	187.00	m2	933.07	174,484.09	167.80	0.00	89.73%	0.00	0.00	0.00%	167.80	0.00	0.00%
3.1	Reconstrucción de contenes en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia. (84.00)*2	167.00	ml	840.90	157,248.30	167.80	0.00	89.73%	0.00	0.00	0.00%	167.80	0.00	0.00%
3.09	Reconstrucción de aceras en la C/ Josué, desde la C/ De León hasta C/ Ramona. (5.60*1.00)*2	11.20	m2	933.07	10,450.38	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.1	Reconstrucción de contenes en la C/ Josué, desde la C/ De León hasta C/ Ramona. (5.60)*2	11.20	ml	840.90	9,418.08	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.11	Reconstrucción de aceras en la C/ Ramona, desde la C/ De León hasta la cañada. (25.00*1.00)*2	50.00	m2	933.07	46,653.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
[illegible]	Reconstrucción de contenes en la C/ Ramona, desde la C/ De León hasta la cañada. (25.00)*2	50.00	ml	840.90	42,045.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.13	Reconstrucción de aceras en la C/ Pineda, desde la C/ Familia hasta la C/ Yeny. (166.70*1.00)*2	333.40	m2	933.07	311,085.54	133.50	124964.85	40.04%	0.00	0.00	0.00%	133.50	0.00	0.00%
3.14	Reconstrucción de contenes en la C/ Pineda, desde la C/ Familia hasta la C/ Yeny. (166.70)*2	333.40	ml	840.90	280,356.06	213.70	179700.33	64.10%	0.00	0.00	0.00%	213.70	124964.85	0.00%
3.15	Reconstrucción de aceras en la C/ Mercedes, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (125.50*1.00)*2	251.00	m2	933.07	234,200.57	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	179700.33	0.00%
3.16	Reconstrucción de contenes en la C/ Mercedes, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (166.70)*2	251.00	ml	840.90	211,065.90	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.17	Reconstrucción de aceras en la C/ Yeny, desde la C/ Profesores hasta la cañada. (145.0*1.00)*2	290.00	m2	933.07	270,590.30	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.18	Reconstrucción de contenes en la C/ Yeny, desde la C/ Profesores hasta la cañada. (166.70)*2	290.00	ml	840.90	243,861.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.19	Reconstrucción de aceras en la C/ Sosa, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (84.00*1.00)*2	168.00	m2	933.07	156,755.76	68.50	63915.30	40.77%	0.00	0.00	0.00%	68.50	63915.30	0.00%
3.2	Reconstrucción de contenes en la C/ Sosa, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (84.00)*2	168.00	ml	840.90	141,271.20	89.73	75453.96	53.41%	0.00	0.00	0.00%	89.73	75453.96	0.00%
3.21	Reconstrucción de aceras en la C/ Profesores, desde la C/ Sosa hasta C/ La Polla. (187.50*1.00)*2	375.00	m2	933.07	349,901.25	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.22	Reconstrucción de contenes en la C/ Profesores, desde la C/ Sosa hasta C/ La Polla. (187.50)*2	375.00	ml	840.90	315,337.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.23	Reconstrucción de aceras en la C/ La Polla, desde la C/ Principal hasta la cañada. (210.00*1.00)*2	420.00	m2	933.07	391,889.40	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
[illegible]	Reconstrucción de contenes en la C/ La Polla, desde la C/ Principal hasta la cañada. (210.00)*2	420.00	ml	840.90	353,178.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
				Sub-Total ===>	5,570,975.39								1,595,328.50	
	[illegible]													
4.01	Demolición de Baden en la C/ Familia esq. C/ De León (8.2*2.0)	16.40	m2	3,344.12	54,843.59	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4.02	Demolición de Baden en la C/ Familia esq. C/ Reyes. (8.7*2.0)	17.40	m2	3,344.12	58,187.71	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4.03	Demolición de Baden en la C/ Ramona esq. C/ (8.5*2.0)	17.00	m2	3,344.12	56,850.06	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4.04	Demolición de Baden en la C/ Pineda esq. C/ (8.5*2.0)	17.00	m2	3,344.12	56,850.06	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4.05	Demolición de Baden en la C/ Sosa esq. C/ (8.9*2.0)	17.80	m2	3,344.12	59,525.36	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
				Sub-Total ===>	286,256.77								0.00	
	[illegible]													

5.01	Limpieza general y final	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
				Sub-Total ——>	15,000.00								0.00		
	Sub-Total General				6,520,474.16		1,606,328.99						1,606,328.99		
B	GASTOS INDIRECTOS														
1.000	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. CIVIL.		10.00%		652,042.42								160,592.83		
1.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS.		3.00%		195,612.72								48,249.86		
1.002	SEGUROS Y FIANZAS.		2.50%		163,010.60								40,208.21		
1.003	LIQUIDACIÓN Y PRESTS. LABORALES. Ley 686.		1.00%		65,204.24								16,083.29		
1.004	CODIA 1X1000. Ley 6160 de 1963 para el estudio y sus dependencias		0.10%		6,520.42								1,608.33		
1.005	ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007. Artículo 4-Parrafo I)		18.00%		117,367.63								28,949.91		
	Total Gastos Indirectos				1,199,758.05								295,692.44		
	TOTAL EJECUTADO HASTA LA FECHA				7,720,182.21								1,902,021.43		
	Amortizacion 20% avance solicitado												380,404.29		
	TOTAL A PAGAR DE CUB. 1												1,521,617.14		

Nota: La presente Cubicacion se expide a total responsabilidad del Depto de Supervicion, mediante los supervisores actuantes en la misma -

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO
Prov. Sto. Dgo., R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

Preparado Por

Ing. Nikaody Rodriguez
Enc. Del Dep. De Cubicación de OP

Datos susminitrados por

Sr. Yan Carlos Navarro
Supervisor del AMA

Revisador por:

Sr. Cesar Puala Frias
Enc. de Supervicion

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO
Prov. Sto. Dgo. R.D.

Aprobado Por:

ING. WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO
Contratista

Aprobado:

Ing. Freddy M. Dini Lebron

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE LOS ALCARRIZOS
GESTIÓN 2020-2024

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

DIRECCION ADMINISTRATIVA

31 de mayo de 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde Municipal

Vía : Dirección Financiera

De la : Dirección Administrativa

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCION FINANCIERA
AUTORIZADO
Firma
Fecha 31/05/2022

Asunto : Pago de cubicación **#1**

Distinguidos Señores:

Cortésmente le estamos solicitando el pago a favor de**: Wander J. Rodríguez Reynoso.**

Codia: Contrato No. **022/2022**. RNC: **001-1082606-2**

Monto a pagar**: 1, 523,408.76 (Un Millón Quinientos Veinte Tres mil, Cuatrocientos Ocho con 76/100).**

Por concepto de Pago de: Cubicación **#1**, para la construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes calles del Residencial Las Mercedes, en los Alcarrizos.

Atentamente,

Lcda. Luisana Guzmán
Administrativa

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo R.D.

Fecha	Concepto	Valor
31/05/2022	P/R: PAGO A FAVOR DEL SR. WANDER JOINE RODRIGUEZ REYNOSO, PO R CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION #1, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL RESIDENC	1,492,940.58

7261

Clave Municipal No.

No. 018531

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
PROGRAMA DE INVERSION

DIA	MES	AÑO
31	05	2022

0016803

RNC: 430-04234-6
DO28BRRD0000000000002440009274

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO RD$ *1,492,940.58*

*** UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 58/100 ***

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

I Rodriguez

FIRMA(S)

⑈018531⑈ 244127271③024400092 74⑈ 28

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
No. Comprobante .. : 2201935 / P/R: PAGO A FAVOR DEL SR. WANDER JOINE RODRIGUEZ REYNOSO, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION #1, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL RESIDENCIAL LAS MERCEDES, E		Estructura Clasific. 0011010098 272401	1,492,940.58
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuenta.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2201935
FECHA 31/05/2022
SECUENCIAL: 1957

TIPO COMPROBANTE: 2201934 — Etapa: Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original — Comp. que modifica:
CODIGO BENEFICIARIO: 18121 — RNC/CED/PAS: 00118943760
BENEFICIARIO: WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO
DIRECCION: — TELEFONO:
CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R: PAGO A FAVOR DEL SR. WANDER JOINE RODRIGUEZ REYNOSO, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION #1, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL RESIDENCIAL LAS MERCEDES, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN COMUNICACION D/F: 31/05/2022. ANEXO***UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 58/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0098	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,523,408.76
					Menos las siguientes Retenciones	
00 11 01 0098	272401	40	9992	103	MENOS 2% De: 1,523,408.76	(30,468.18)
					**** Debajo de esta linea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 1,492,940.58

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2201934
FECHA 31/05/2022
SECUENCIAL: 1956

TIPO COMPROBANTE: 2201935 — Etapa: Devengado
CLASE DOCUMENTO: Original — Comp. que modifica:
CODIGO BENEFICIARIO: 18121 — RNC/CED/PAS: 00118943760
BENEFICIARIO: WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO
DIRECCION: — TELEFONO:
CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R: PAGO A FAVOR DEL SR. WANDER JOINE RODRIGUEZ REYNOSO, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION #1, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL RESIDENCIAL LAS MERCEDES, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN COMUNICACION D/F: 31/05/2022. ANEXO***UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON 76/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0098	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,523,408.76
					**** Debajo de esta linea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 1,523,408.76

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Fecha	Concepto	Valor
22/04/2022	PR. PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE AV ANCE INICIAL 20%, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL RESIDENCIAL LAS MERCEDES E	1,513,155.71

Clave Municipal No

No. 018505

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
PROGRAMA DE INVERSION

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO

RD$ 1,513,155.71

** UN MILLON QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 71/100 **

PESOS

BanReservas

018505 244122722630 2440009274* 28

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Monto	Descripción	Valor
No. Comprobante: 100477 POR PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL 20%, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL RESIDENCIAL LAS MERCEDES EN LOS ALCARRIZOS.		Estructura Clasificador 2021010006 21.202	1,513,155.71
			TOTAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE No. 2201415
FECHA 22/04/2022
SECUENCIAL: 1431

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2201414 — Etapa: Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original — Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 18121 — RNC/CED/PAS: 00118943760
BENEFICIARIO: WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO
DIRECCION: — TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R: PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL 20%, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL RESIDENCIAL LAS MERCEDES, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN COMUNICACION D/F: 20/04/2022 ANEXO***UN MILLON QUINIENTOS TRECE MIL CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 71/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0098	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,544,036.44
					Menos las siguientes Retenciones	
00 11 01 0098	272401	40	9992	103	MENOS 2% De: 1,544,036.44	(30,880.73)
					**** Debajo de esta linea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 1,513,155.71

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

809-876

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2201414
FECHA 22/04/2022
SECUENCIAL: 1430

TIPO COMPROBANTE: 2201415 — Etapa: Devengado
CLASE DOCUMENTO: Original — Comp. que modifica:
CODIGO BENEFICIARIO: 18121 — RNC/CED/PAS: 00118943760
BENEFICIARIO: WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO
DIRECCION: — TELEFONO:
CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL 20%, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL RESIDENCIAL LAS MERCEDES , EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN COMUNICACION D/F: 20/04/2022 ANEXO***UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON 44/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0098	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,544,036.44
					**** Debajo de esta linea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 1,544,036.44

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

DIRECCION ADMINISTRATIVA

20 de abril de 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde Municipal

Vía : Dirección Financiera

De la : Dirección Administrativa

Asunto : Pago Avance Inicial **del 20%**

Distinguidos Señores:

Cortésmente le estamos solicitando el pago a favor de: **Wander J. Rodríguez Reynoso.**

Codia: Contrato No. **022/2022**. RNC: **001-1894376-0**

Monto a pagar: **RD$1.544.036.44 (Un Millón Quinientos Cuarenta Y Cuatro Mil Treinta Y Seis Pesos Con 44/100).**

Por concepto de Pago de: Avance inicial del **20%**, para la construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes calles del Residencial Las Mercedes, en los Alcarrizos.

AUTORIZADO
Firma:
Fecha: 22/7/2022

Atentamente,

Lcda. Luisana Guzmán
Administrativa

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Santo Domingo R.D

CONTRATO DE OBRA DETERMINADA

AÑO: **2022**
CONTRATO NO.**022-2022**
No. Presupuesto **AMA01-OP0322-P06-M**

ENTRE: EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS, RNC [No.430-04253-6] institución del Estado Dominicano creada en virtud de **La Ley** 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios, de fecha 17/07/2007, con domicilio y asiento social en **C/ Duarte No. 359,** Sector Landia, Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, debidamente representado por su Alcalde **CRISTIAN ENCARNACION**, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0582396-7, domiciliado y residente en este municipioquien para los fines del presente Contrato, se denominará **LA ENTIDAD CONTRATANTE**. Debidamente representado por el **ING.WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO,** dominicano, mayor de edad, Soltero, titular de la cedula de identidad y electoral NO.001-1894376-0, domiciliado(a) y residente en la C/ SECUNDARIA, MANZANA D, EDIF.4, APTO.201, RECIDENCIAL VILLA GRACIELA, AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, SANTO DOMINGO D.N.. Quien para los fines del presente Contrato, se denominará **"EL CONTRATISTA"**. Para referirse a ambos se les denominará **LAS PARTES.**

PREÁMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la COMPARACION DE PRECIOS.

POR CUANTO: El Reglamento No.543-12, que regula la Ley 340-06, establece en el Art.58 que "En caso de contrataciones de obras por montos inferiores al umbral mínimo establecido para la comparación de precios, deberá utilizarse el procedimiento por comparación de precios."

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 1, establece además que: *Comparación de Precios es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores.*

POR CUANTO: El Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selección del Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratación.

POR CUANTO: El Órgano Rector, emitió la resolución No.01-2021, mediante la cual aprobó los umbrales para este año, siendo el umbral para la Comparación de Precios un monto que va desde la suma de RD$98,574,934.00 hasta un monto de RD$394,299,732.00 para la contratación de obras y tomando en cuenta lo dispuesto por el Art.58 del reglamento 543-12.

POR CUANTO: El monto al cual asciende la presente obra está por debajo del umbral tope.-

POR CUANTO: En fecha Diecisiete (17) de Marzo del año **2022**, el **AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, procedió a hacer una convocatoria amplia a los proveedores inscritos en el registro de proveedores del Estado, en el portal transaccional del sistema nacional de contrataciones publicas de la Republica Dominicana.

POR CUANTO: Que el día Diecisiete (17) Marzo del año 2022, fue adjudicada la Obra, a través del portal del Órgano Rector y que además cumplió con las especificaciones del pliego de condiciones. Contrato de Ejecución de Obra: **PARA AMA-CCC-CP-2022-0005, CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN LAS C/ FAMILIA, C/ DE LEON, C/ FLORES, C/ REYES, C/ JOSUE, C/ RAMONA, C/ PINEDA, C/ MERCEDES, C/ YENY, C/ LA POLLA. PERTENECIENTE A LAS ACERAS, CONTENES, BADENES, RELLENOS, ALCANTARILLADOS, IMPRIMICION, SEÑALIZACION**

DE CALLES, PUENTES, DEL PLAN-PRO ASFALTO, DE (REFERENCIA: AMA-CCC-CP-2022-0005).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato.

ARTÍCULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES: Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que expresa a continuación: **Certificado de recepción definitiva**: El o los certificados expedidos por el supervisor a **EL CONTRATISTA** al final del o de los periodos de garantía, en el que se declare que **EL CONTRATISTA** ha cumplido sus obligaciones contractuales. **Contratista**: Nombre de la persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutará el objeto del Contrato. **Contrato**: El presente documento **Coordinador:** Persona designada como tal por **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** para realizar las funciones de coordinación de todas las actividades relacionadas con la Obra y que tengan injerencia en la ejecución del Contrato. **Desglose de precios unitarios**: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado. **Emplazamiento**: Los terrenos proporcionados por **AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** en que deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamiento. **Entidad Contratante**: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS, Instalación:** Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporación a la Obra. **Lista de precios**: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que **EL CONTRATISTA** presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del Contrato de precio unitario. **Monto del Contrato**: El importe señalado en el Contrato. **Obras**: Las obras que deban realizarse, con carácter temporal o permanente, con arreglo al Contrato. **Periodo de Garantía**: El período estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha de aprobación provisional, durante el cual **EL CONTRATISTA** se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las indicaciones del supervisor. **Planos detallados**: Los planos proporcionados por **EL CONTRATISTA** de acuerdo a la solicitud de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** y aprobados por la Supervisión para la ejecución de las obras. **Plazos:** Los plazos del Contrato que empezará a contar a partir del día siguiente a la fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el último día del plazo coincidiere con un día festivo, el plazo expirará al final del día laborable siguiente al último día de plazo. **Presupuesto Detallado**: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio unitario correspondiente. **Representante del Supervisor**: Cualquier persona física o jurídica designada como tal con arreglo al Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el cumplimiento de las funciones que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante, toda referencia que se haga al primero se entenderá hecha al segundo. **Sub-Contratista**: Persona natural o jurídica, o asociación de estas, la cual celebra Contrato directamente con **EL CONTRATISTA**, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecución de la obra. **Supervisor**: Persona natural o jurídica de Derecho Público, competente, designada por **(AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS),** responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el diseño, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construcción del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien **(el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS),** puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al Contrato. **Especificaciones Técnicas:** Condiciones exigidas por **(el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS),** para la realización de las Obras.

ARTÍCULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO: Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrínseca del mismo. a) El Contrato propiamente dicho., b)Pliegos de Condiciones Específicas., c)Especificaciones Técnicas y de Construcción., d)Cálculos Estructurales., e)Planos Aprobados por el Ayuntamiento correspondiente., f)Presupuesto., g)Planes de Manejo Ambiental., h)Cronograma de Ejecución de Obras., i)Garantías .,y J)Documentos ofertados ,a saber: Póliza de fianza ., Fianza de fiel cumplimiento o ejecución .,Informe de ficha técnica., Informe final., Acta de comprobación con traslado de notario., Registro de participante., oferta económica., certificación de impuestos internos., fianza de licitación o mantenimiento de oferta., presupuesto., Presentación de oferta., Registro de proveedor del estado., Plan de trabajo., Equipos del oferente., certificación de impuestos internos,.

ARTÍCULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO:EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantías de hecho y de derecho, de acuerdo con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demás anexos que forman parte integral del presente Contrato,

La Obra que se describe a continuación, **CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN LAS C/ FAMILIA, C/ DE LEON, C/ FLORES, C/ REYES, C/ JOSUE, C/ RAMONA, C/ PINEDA, C/ MERCEDES, C/ YENY, C/ LA POLLA, PERTENECIENTE A LAS ACERAS, CONTENES, BADENES, RELLENOS, ALCANTARILLADOS, IMPRIMICION, SEÑALIZACION DE CALLES, PUENTES, DEL PLAN-PRO ASFALTO, DE (REFERENCIA: AMA-CCC-CP-2022-0005).**

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programación general acordada y establecida previamente entre **LAS PARTES** (Cronograma de Ejecución de Obra), la cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato.

ARTÍCULO 4.- MONTO DEL CONTRATO: **LAS PARTES** convienen que el monto total a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma de **(RD$7, 720,182.21) SIETE MILLONES SETECIENTOS VENTE MIL CIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 21/100 CENTAVOS MONEDA LEGAL NACIONAL,** En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan Las partidas, sub-partidas y el costo general de la Obra.

ARTÍCULO 5.- FORMA DE PAGO: Los pagos se harán de la siguiente manera: Un primer pago o anticipo correspondiente al 20% del valor total de la obra, cuya suma tiene un valor de **(RD$ 1,544,036.44) UN MILLON QUINIENITOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON 44 /100 CENTAVOS MONEDA LEGAL NACIONAL,** Este pago se hará después de la firma del contrato. EL **CONTRATISTA** utilizara el Anticipo únicamente para operaciones relacionada con la ejecución de la obra, la suma restante será pagada en pagos parciales a el **CONTRATISTA**, mediante cubicaciones periódicas por obra realizada y certificada por la supervisión., El monto de la primera cubicación realizada por el **CONTRATISTA** ,deberá exceder o por lo menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo o Avance Inicial., Podrán cubicarse Obras adicionales elaboradas como ordenes de Cambio , y serán pagadas en la medida en que sean ejecutadas ,previo acuerdo de precios entre **LAS PARTES**., Estas Obras adicionales serán regidas por las condiciones de este contrato a menos que sea acordado de manera diferente entre las **PARTES**.

ARTÍCULO 6.- TIEMPO DE EJECUCIÓN: **EL CONTRATISTA** se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a más tardar **CINCO (05)** días después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Artículo **05**, y deberá entregarla totalmente terminada y a satisfacción de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** en un plazo no mayor de **SESENTA (60)** días calendario, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato. **EL CONTRATISTA** deberá entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la Ruta Crítica de Ejecución de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecución establecido

ARTÍCULO 7.- COMPENSACIÓN POR DEMORA: Si **EL CONTRATISTA** no entrega la Obra en el plazo convenido en el Artículo 7 de este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, **EL CONTRATISTA** adeudará al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, como justa indemnización por daños y perjuicios, una compensación correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para la terminación del Contrato. Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de la Obra, y serán descontadas del pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a **EL CONTRATISTA**. El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios, no exonerará a **EL CONTRATISTA** de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto **EL CONTRATISTA** declara que queda constituido en mora por el sólo vencimiento del plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley

ARTÍCULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO: Ni el **AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** ni **EL CONTRATISTA** serán responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situación que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras,

actos de terrorismo, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones, y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito estan dentro de las anteriormente no incluyen: a) Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte. b) Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. c) Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato. d) La falta de una parte incapacitada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus obligaciones. No será considerada como incumplimiento, siempre y cuando este surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los terminos y condiciones establecidos en este Contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, **EL CONTRATISTA** no cumpliera sus labores en el plazo establecido, **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** extenderá el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual **EL CONTRATISTA** no pudo cumplir. Además, únicamente a esta causa, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendrá derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Si **EL CONTRATISTA** dejara de presentar su reclamación o de dar su aviso requerido dentro del periodo especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho en relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 9. INCREMENTOS DE PRECIOS. Queda convenido que **EL CONTRATISTA** no tendrá derecho a reclamar incrementos de precios durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra.

ARTICULO 10. SUPERVISIÓN. La Supervisión representará por el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** y será intermediaria entre esta y **EL CONTRATISTA**, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato. **EL CONTRATISTA** permitirá que el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** o su representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTICULO 11. NO RELACIÓN LABORAL. LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República Dominicana. **EL CONTRATISTA** acuerda, por este medio, liberar al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** de toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes interpongan en su contra derivada del cumplimiento y ejecución del presente Contrato.

ARTICULO 12. DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA. En un plazo de quince (15) días después de suscripción se cumplimiento que dispone el Artículo [18] **EL CONTRATISTA** suministrará al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** y al Supervisor, el siguiente en orden cronológico de las planos elaborados para la ejecución de la Obra, así como especificaciones técnicas definitivas, presupuesto y otros documentos de la Licitación. En el momento de expedirse el certificado de aceptación, o en el momento de la recepción definitiva, **EL CONTRATISTA** suministrará a **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** y al Supervisor tantas (3) copias, en papel bond y electrónicas, como constituido (**As Built**) o cualquier otro documento requerido por **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** o el Supervisor.

ARTICULO 13. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA ejecutará y concluirá la Obra y subsanará cualquier deficiencia de las mismas identificadas por el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** con la calidad y la diligencia debidos y en estricto cumplimiento de las disposiciones del Contrato. El **CONTRATISTA** será responsable de la buena conservación de los Planos para la realización de la obra, respondiendo por los errores de interpretación ocurridos durante la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva conforme a la Entidad Contratante. **EL CONTRATISTA** se atendrá a las órdenes administrativas

impartidas por El Supervisor. Cuando **EL CONTRATISTA** considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan El Contrato, deberá notificarlo a El Supervisor en un plazo de treinta (30) días a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecución de la orden administrativa no se suspenderá como consecuencia de dicha notificación. **EL CONTRATISTA,** ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecución de tales trabajos, en este último caso, **EL CONTRATISTA** quedará exento de responsabilidad. Asimismo, **EL CONTRATISTA** será responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta. **EL CONTRATISTA** respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en el Estado Dominicano. Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institución privada o pública, para la realización de los trabajos de construcción y ejecución de El Proyecto, cuya obtención sea usualmente responsabilidad de un contratista general, deberán ser obtenidas por **EL CONTRATISTA**.

ARTÍCULO 14.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA dirigirá personalmente las Obras o nombrará a un representante suyo para que lo haga. El representante de **EL CONTRATISTA** tendrá plena autoridad para adoptar cualquier decisión que sea necesaria para la ejecución de las Obras, para recibir y llevar a cabo órdenes administrativas. En cualquier caso, será responsabilidad de **EL CONTRATISTA** cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y según el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas.

ARTÍCULO 15.- APROBACIÓN DEL PERSONAL: La aceptación de la Oferta por parte del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** se considera como acuerdo con el personal propuesto. Con relación a cualquier otro personal de **EL CONTRATISTA** deberá someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** para su revisión y aprobación. Si el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** no lo objeta dentro de los primeros diez (10) días de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestión ha sido aprobado.

ARTÍCULO 16.- REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PERSONAL: EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa autorización del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** la cual no será negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de **EL CONTRATISTA** sea necesario el reemplazo de cualquier personal, **EL CONTRATISTA** se compromete a reemplazarlo por una persona con semejantes aptitudes y experiencia. El **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo. **PÁRRAFO: EL CONTRATISTA** deberá entregar a El **Supervisor** del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** un listado con cada una de las personas que trabajarán en el periodo de construcción acordado. Este personal deberá estar debidamente identificado como empleado de **EL CONTRATISTA**, y dicha identificación deberá considerar los siguientes datos personales: a) Nombre completo., b) Cédula de Identidad Personal. c) Cargo o responsabilidad. d) Dirección., e) Teléfono. Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTÍCULO 17.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de las Obras como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y molestias a personas y Propiedades resultantes de contaminación, ruido y otros derivados de sus operaciones. **EL CONTRATISTA** se asegurará de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al Terreno durante el periodo del Contrato estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley. La seguridad del área de la Obra durante el periodo de construcción es responsabilidad de **EL CONTRATISTA**. Es responsabilidad de **EL CONTRATISTA** asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia relacionadas con el público y la seguridad de la construcción, así como obedecer todas las regulaciones establecidas por el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** es obligación ejecutar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la Obra y/o

ejecución de trabajos: a)Uso de casco de seguridad., b)Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura., c)Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de protección., d)Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores. ,e) Uso de andamios seguros, f) Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo. Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberán cumplir completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** cooperará en lo concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se permitirán menores en los lugares de trabajo en ningún momento. El Supervisor del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** podrá expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas. **EL CONTRATISTA** cumplirá en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construcción.

ARTÍCULO 18.- GARANTÍA DE ANTICIPO: Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, **EL CONTRATISTA** deberá proporcionar una garantía del mismo, constituyendo una póliza de seguro de fidelidad a entera satisfacción del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** por un valor equivalente al monto del avance inicial. La presente garantía se reducirá automáticamente y en la misma proporción en que el anticipo se impute a los abonos, y permanecerá en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el Contrato hasta que el ***AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS*** haya recibido del Contratista el reembolso total de ese monto.

ARTÍCULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCIÓN DE CONTRATO: **EL CONTRATISTA** asumirá la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposición de la Obra, así como también, por la provisión de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra necesarios para tales fines. Si en cualquier momento o en el curso de la realización de la Obra surgiera o se presentara algún error de disposición, dimensiones o alineación de alguna parte de la Obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento del ***AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS*** o la Supervisión, deberá, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfacción.

ARTÍCULO 20.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato **EL CONTRATISTA** hace formal entrega de una garantía bancaria o una póliza (No.3-1206-9141), De Fecha Doce (12) del mes de Abril 2022, De la Compañía de Seguros APS, por un valor del 4% del monto de RD(308,807.29) de seguros a favor del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 111 y 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha treinta (30) de agosto del dos mil siete (2007), por un valor equivalente al Cuatro por ciento (04%) del monto del Contrato...(cuya póliza para este caso no es exigible de acuerdo al artículo 118 de reglamento 543-12 que establece que las Adjudicaciones que estén por debajo de Diez mil dólares) **PARRAFO I** Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la ejecución de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTÍCULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL: **EL CONTRATISTA** será el único responsable por los daños y perjuicios causados a las personas que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, así como también, asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos deberá presentar para la suscripción del presente Contrato la póliza de responsabilidad civil general, correspondiente **EL CONTRATISTA** mantendrá al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamación, compensación, pérdidas o Gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por **EL CONTRATISTA**. Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destrucción de la propiedad física. **EL CONTRATISTA** obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por el o cualquier subcontratista, de tal modo que el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** esté indemnizada.

ARTÍCULO 22.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: Al finalizar los trabajos, **EL CONTRATISTA** deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas por él a satisfacción del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, (Garantía de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al **Veinte Por Ciento (20%)** del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantía deberá ser por un (1) año, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**. Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano. **EL CONTRATISTA** también será responsable por los daños que ocasione a las Obras existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no haya sido advertido por el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** hasta el momento de recibir la Obra terminada.

ARTÍCULO 23.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando **EL CONTRATISTA** presente los siguientes documentos: a)Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras, .b)Certificado de Descargo de la Secretaría de Estado de Trabajo., c)Pago de Liquidación de todos los compromisos de la Seguridad Social, d)Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta., e)Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

ARTÍCULO 24.- IMPUESTOS: EL CONTRATISTA no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del presente Contrato y por tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTÍCULO 25.- EQUILIBRIO ECONÓMICO: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por **EL CONTRATISTA** para la ejecución de la obra, los pagos y los gastos reembolsables pagables a **EL CONTRATISTA**, en virtud de este Contrato, aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional.

ARTÍCULO 26.- SUB-CONTRATACIONES: EL CONTRATISTA no podrá ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún beneficio o participación o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**. El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, no eximirá a **EL CONTRATISTA** de ninguna responsabilidad y obligación estipulada en El Contrato. De igual manera, queda entendido que **EL CONTRATISTA** será también responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTÍCULO 27.- RESCISIÓN: EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS] se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de que **EL CONTRATISTA** diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones. **EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL** podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, así como ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si **EL CONTRATISTA** fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administración judicial, o si se presentase una petición de declaración en quiebra, o si hiciese algún convenio con sus acreedores o una cesión a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la Supervisión certificase por escrito al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** que en su opinión **EL CONTRATISTA: a)**Ha abandonado las Obras., b)Ha dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) días, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito., c)No está ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o está constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las órdenes emitidas por la Supervisión., d)Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,. e)** Si **EL CONTRATISTA** cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores; f) Si se le asigna un administrador judicial a **EL CONTRATISTA** a causa de su insolvencia. g) Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato. De igual modo, podrá procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas

de este Contrato, que a juicio del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** sean violadas por **EL CONTRATISTA**. En tal caso, el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podrá rescindir este Contrato y procederá a evaluar los daños y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a **EL CONTRATISTA** ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTÍCULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO: Constituirá una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, las enunciadas a continuación: a) La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria.

ARTÍCULO 29.-RECEPCIÓN PROVISIONAL: EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS tomará posesión de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas de terminación y se haya expedido un certificado de recepción provisional. Tras la recepción provisional de las Obras, **EL CONTRATISTA** desmantelará y retirará las estructuras provisionales así como los materiales que ya no se utilicen para la ejecución del Contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos, y restablecerá toda modificación en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

ARTÍCULO 30.- CUBICACIÓN DE CIERRE: EL CONTRATISTA producirá una cubicación final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El Contrato. La Supervisión deberá validar la cubicación final dentro de **Sesenta Días** (60) días de recibida, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitará a **EL CONTRATISTA** que realice toda corrección o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicación final, no fuese satisfactoria, **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** deberá determinar el monto a pagar a **EL CONTRATISTA**.

ARTÍCULO 31.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Al expirar el periodo de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el Supervisor extenderá a **EL CONTRATISTA** un certificado de recepción definitiva y remitirá una copia del mismo al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** con indicación de la fecha en que **EL CONTRATISTA** haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfacción del Supervisor. El Supervisor entregará el certificado de recepción definitiva a más tardar **indicar en letras y números el plazo** días, después de que expire el periodo arriba mencionado, o, después de dicho periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfacción del Supervisor toda obra ordenada. Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, con una copia para **EL CONTRATISTA**.

ARTÍCULO 32.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO: Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre **LAS PARTES**, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS.**

ARTÍCULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS: LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al desarrollo del presente Contrato y su interpretación.

ARTÍCULO 34.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) *y de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).*

ARTÍCULO 35.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 36.- IDIOMA OFICIAL: El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente documento.

ARTÍCULO 37.- TITULOS: Los títulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado de este Contrato.

ARTÍCULO 38.- LEGISLACIÓN APLICABLE: EL CONTRATISTA realizará sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la República Dominicana.

ARTÍCULO 39.- ELECCIÓN DE DOMICILIO: Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, **LAS PARTES** eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente Contrato, su ejecución y terminación.

ARTÍCULO 40.- ACUERDO INTEGRO: El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre **LAS PARTES**; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una **de LAS PARTES**, y el otro para los fines correspondientes, En el Municipio de Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, República Dominicana a los Once (11) días del mes de Abril del año Dos Mil Veintidós (11/04/2022).-

Por el Ayuntamiento;

CRISTIAN ENCARNACION
Contratante

Por el Contratista;

ING. WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO
Contratista

YO, DR. BARTOLO A. LALANE DE LA CRUZ, Notario público de los del número para del Municipio Los Alcarrizos, registrado en el Colegio Dominicano de Notarios con el número 7780, con estudio profesional abierto en esta ciudad., Certifico y doy fe que las firmas que aparecen en el presente documento fueron puestas, en mi presencia libre y voluntariamente por los señores: **CRISTIAN ENCARNACION y/o WANDER JOISE RODRIGUEZ REYNOSO,** quienes me declararon bajo la fe del juramento que esas son las firmas que ellos acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas, tanto publicas como privadas. En el Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, a los Once (11) días del mes de Abril del año Dos Mil Veintidós (11/04/2022).-

DR. BARTOLO A. LALANE DE LA CRUZ
Notario Publico

ING. WANDER JOISE RODRÍGUEZ REYNOSO

C/Secundaria, Manzana D, Edif. 4, Apto. 201, Residencial Villa Graciela, Av. República de Colombia, Santo Domingo D.N. Cel. 829-867-1306, Ced. 001-1894376-0
E-mail. stephaniedrw@hotmail.com

Obra: Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Familia, C/ De León, C/ Flores, C/ Reyes, C/ Josué, C/ Ramona, C/ Pineda, C/ Mercedes, C/ Yeny, C/ La Polla..ubicadas en el Residencial Las Mercedes, Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

Sector: Las Mercedes

Ubicación: Los Alcarrizos

PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
I	**PRELIMINARES**					
1.01	Valla informativa de la obra.	1.00	Ud.	13,000.00	13,000.00	**13,000.00**
II-	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
2.01	Demolición de aceras en la C/ Familia, desde la C/ Principal hasta la cañada. (228.00*1.00)*2	456.00	m2	100.00	45,600.00	
2.02	Demolición de contenes en la C/ Familia, desde la C/ Principal hasta la cañada. (228.00)*2	456.00	ml	100.00	45,600.00	
2.03	Demolición de aceras en la C/ De León, desde la C/ Familia hasta C/Pineda. (121.90*1.00)*2	243.80	m2	100.00	24,380.00	
2.04	Demolición de contenes en la C/ De León, desde la C/ Familia hasta C/Pineda. (121.90*2	243.80	ml	100.00	24,380.00	
2.05	Demolición de aceras en la C/ Flores, desde la C/ Pineda hasta el Vivero. (84.00*1.00)*2	168.00	m2	100.00	16,800.00	
2.06	Demolición de contenes en la C/ Flores, desde la C/ Pineda hasta el Vivero. (84.00)*2	168.00	ml	100.00	16,800.00	
2.07	Demolición de aceras en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia.(93.50*1.00)*2	187.00	m2	100.00	18,700.00	
2.08	Demolición de contenes en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia. (84.00)*2	187.00	ml	100.00	18,700.00	
2.09	Demolición de aceras en la C/ Josue, desde la C/ De Leon hasta C/Ramona. (5.60*1.00)*2	11.20	m2	100.00	1,120.00	
2.10	Demolición de contenes en la C/ Josue, desde la C/ De León hasta C/ Ramona. (5.60)*2	11.20	ml	100.00	1,120.00	
2.11	Demolición de aceras en la C/ Ramona, desde la C/ De León hasta la cañada. (25.00*1.00)*2	50.00	m2	100.00	5,000.00	
2.12	Demolición de contenes en la C/ Ramona, desde la C/ De León hasta la C/cañada. (25.00)*2	50.00	ml	100.00	5,000.00	

ING. WANDER JOISE RODRÍGUEZ REYNOSO

C/Secundaria, Manzana D, Edif. 4, Apto. 201, Residencial Villa Graciela, Av. República de Colombia, Santo Domingo D.N. Cel. 829-867-1306, Ced. 001-1894376-0
E-mail. stephaniedrw@hotmail.com

Obra: Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Familia, C/ De León, C/ Flores, C/ Reyes, C/ Josué, C/ Ramona, C/ Pineda, C/ Mercedes, C/ Yeny, C/ La Polla..ubicadas en el Residencial Las Mercedes, Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto

Sector: Las Mercedes

Ubicación: Los Alcarrizos

PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
2.13	Demolición de aceras en la C/ Pineda, desde la C/ Familia hasta la C/ Yeny. (166.70 *1.00)*2	333.40	m2	100.00	33,340.00	
2.14	Demolición de contenes en la C/ Pineda, desde la C/ Familia hasta la C/ Yeny. (166 .70)*2	333.40	ml	100.00	33,340.00	
2.15	Demolición de aceras en la C/ Mercedes, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (125.50*1.00)*2	251.00	m2	100.00	25,100.00	
2.16	Demolición de contenes en la C/ Mercedes, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (166.70)*2	251.00	ml	100.00	25,100.00	
2.17	Demolición de aceras en la C/ Yeny, desde la C/ Profesores hasta la cañada. (145.0*1.00)*2	290.00	m2	100.00	29,000.00	
2.18	Demolición de contenes en la C/ Yeny, desde la C/ Profesores hasta la cañada. (166.70)*2	290.00	ml	100.00	29,000.00	
2.19	Demolición de aceras en la C/ Sosa, desde la C/ Pineda hasta la canada.(84.00*1.00)*2	168.00	m2	100.00	16,800.00	
2.2	Demolicion de contenes en la C/ Sosa, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (84.00)*2	168.00	ml	100.00	16,800.00	
2.21	Demolición de aceras en la C/ Profesores, desde la C/ Sosa hasta C/ La Polla. (187.50 1.00)*2	375.00	m2	100.00	37,500.00	
2.22	Demolición de contenes en la C/ Profesores, desde la C/ Sosa hasta C/ La Polla. (187 . 50)*2	375.00	ml	100.00	37,500.00	
2.23	Demolición de aceras en la C/ La Polla, desde la C/ Principal hasta la cañada. (210.00*1.00)*2	420.00	m2	100.00	42,000.00	
2.24	Demolicion de contenes en la C/ La Polla, desde la C/ Principal hasta la cañada. (210.00)*2	420.00	ml	100.00	42,000.00	
2.25	Demolición de Baden en la C/ Familia esq. C/ De Leon (8.2*2.0)	16.40	m2	520.00	8,528.00	
2.26	Demolición de Baden en la C/ Familia esq. C/ Reyes (8.7*2.0)	17.40	m2	520.00	9,048.00	
2.27	Demolición de Baden en la C/ Ramona esq. C/ (8.5*2.0)	17.00	m2	520.00	8,840.00	

ING. WANDER JOISE RODRÍGUEZ REYNOSO

C/Secundaria, Manzana D, Edif. 4, Apto. 201, Residencial Villa Graciela, Av. República de Colombia, Santo Domingo D.N. Cel. 829-867-1306, Ced. 001-1894376-0
E-mail. stephaniedrw@hotmail.com

Obra: Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Familia, C/ De León, C/ Flores, C/ Reyes, C/ Josué, C/ Ramona, C/ Pineda, C/ Mercedes, C/ Yeny, C/ La Polla..ubicadas en el Residencial Las Mercedes, Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

Sector: Las Mercedes

Ubicación: Los Alcarrizos

PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
2.28	Demolición de Baden en la C/ Pineda esq. C/ (8.5*2.0)	17.00	m2	520.00	8,840.00	
2.29	Demolición de Baden en la C/ Sosa esq. C/ (8.9*2.0)	17.80	m2	520.00	9,256.00	**635,192.00**
III-	**HORMIGON SIMPLE**					
3.01	Reconstrucción de aceras en la C/ Familia, desde la C/ Principal hasta la cañada. (228.00*1.00)*2	456.00	m2	933.07	425,479.92	
3.02	Reconstrucción de contenes en la C/ Familia, desde la C/ Principal hasta la cañada.. (228.00)*2	456.00	ml	840.90	383,450.40	
3.03	Reconstrucción de aceras en la C/ De León, desde la C/ Familia hasta C/Pineda. (121.90*1.00)*2	243.80	m2	933.07	227,482.47	
3.04	Reconstrucción de contenes en la C/ De León, desde la C/ Familia hasta C/Pineda. (121.90*2	243.80	ml	840.90	205,011.42	
3.05	Reconstrucción de aceras en la C/ Flores, desde la C/ Pineda hasta el Vivero. (84.00*1.00)*2	168.00	m2	933.07	156,755.76	
3.06	Reconstrucción de contenes en la C/ Flores, desde la C/ Pineda hasta el Vivero. (84.00)*2	168.00	ml	840.90	141,271.20	
3.07	Reconstrucción de aceras en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia.(93.50*1.00)*2	187.00	m2	933.07	174,484.09	
3.08	Reconstrucción de contenes en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia. (84.00)*2	187.00	ml	840.90	157,248.30	
3.09	Reconstrucción de aceras en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia.(93.50*1.00)*2	187.00	m2	933.07	174,484.09	
3.10	Reconstrucción de contenes en la C/ Reyes, desde la C/ Flores hasta C/ Familia. (84.00)*2	187.00	ml	840.90	157,248.30	
3.11	Reconstrucción de aceras en la C/ Josue, desde la C/ De León hasta C/Ramona. (5.60*1.00)*2	11.20	m2	933.07	10,450.38	
3.12	Reconstrucción de contenes en la C/ Josue, desde la C/ De León hasta C/ Ramona. (5.60)*2	11.20	ml	840.90	9,418.08	

ING. WANDER JOISE RODRÍGUEZ REYNOSO

C/Secundaria, Manzana D, Edif. 4, Apto. 201, Residencial Villa Graciela, Av. República de Colombia, Santo Domingo D.N. Cel. 829-867-1306, Ced. 001-1894376-0
E-mail. stephaniedrw@hotmail.com

Obra: Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Familia, C/ De León, C/ Flores, C/ Reyes, C/ Josué, C/ Ramona, C/ Pineda, C/ Mercedes, C/ Yeny, C/ La Polla..ubicadas en el Residencial Las Mercedes, Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

Sector: Las Mercedes

Ubicación: Los Alcarrizos

PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
3.13	Reconstrucción de aceras en la C/ Ramona, desde la C/ De León hasta la cañada. (25 .00*1.00)*2	50.00	m2	933.07	46,653.50	
3.14	Reconstrucción de contenes en la C/ Ramona, desde la C/ De León hasta la C/cañada. (25.00)*2	50.00	ml	840.90	42,045.00	
3.15	Reconstrucción de aceras en la C/ Pineda, desde la C/ Familia hasta la C/ Yeny. (166.70 *1.00)*2	333.40	m2	933.07	311,085.54	
3.16	Reconstrucción de contenes en la C/ Pineda, desde la C/ Familia hasta la C/ Yeny. (166 .70)*2	333.40	ml	840.90	280,356.06	
3.17	Reconstrucción de aceras en la C/ Mercedes, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (125.50*1.00)*2	251.00	m2	933.07	234,200.57	
3.18	Reconstrucción de contenes en la C/ Mercedes, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (166.70)*2	251.00	ml	840.90	211,065.90	
3.19	Reconstrucción de aceras en la C/ Yeny, desde la C/ Profesores hasta la cañada. (145.0*1.00)*2	290.00	m2	933.07	270,590.30	
3.2	Reconstrucción de contenes en la C/ Yeny, desde la C/ Profesores hasta la cañada. (166.70)*2	290.00	ml	840.90	243,861.00	
3.21	Reconstrucción de aceras en la C/ Sosa, desde la C/ Pineda hasta la canada.(84.00*1.00)*2	168.00	m2	933.07	156,755.76	
3.22	Reconstrucción de contenes en la C/ Sosa, desde la C/ Pineda hasta la cañada. (84.00)*2	168.00	ml	840.90	141,271.20	
3.23	Reconstrucción de aceras en la C/ Profesores, desde la C/ Sosa hasta C/ La Polla. (187.50 1.00)*2	375.00	m2	933.07	349,901.25	
3.24	Reconstrucción de contenes en la C/ Profesores, desde la C/ Sosa hasta C/ La Polla. (187 .50)*2	375.00	ml	840.90	315,337.50	
3.25	Reconstrucción de aceras en la C/ La Polla, desde la C/ Principal hasta la cañada. (210.00*1.00)*2	420.00	m2	933.07	391,889.40	
3.26	Reconstrucción de contenes en la C/ La Polla, desde la C/ Principal hasta la cañada. (210.00)*2	420.00	ml	840.90		

ING. WANDER JOISE RODRÍGUEZ REYNOSO

C/Secundaria, Manzana D, Edif. 4, Apto. 201, Residencial Villa Graciela, Av. República de Colombia, Santo Domingo D.N. Cel. 829-867-1306, Ced. 001-1894376-0
E-mail. stephaniedrw@hotmail.com

Obra: Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Familia, C/ De León, C/ Flores, C/ Reyes, C/ Josué, C/ Ramona, C/ Pineda, C/ Mercedes, C/ Yeny, C/ La Polla..ubicadas en el Residencial Las Mercedes, Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

Sector: Las Mercedes

Ubicación: Los Alcarrizos

PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
IV	**HORMIGON ARMADO**					
4.01	Construcción de Baden en la C/ Familia esq. C/ De León (8.2*2.0)	16.40	m2	3,344.12	54,843.59	
4.02	Construcción de Baden en la C/ Familia esq C/ Reyes (8.7*2.0)	17.40	m2	3,344.12	58,187.71	
4.03	Construcción de Baden en la C/ Ramona esq. C/ (8.5*2.0)	17.00	m2	3,344.12	56,850.06	
4.04	Construcción de Baden en la C/ Pineda esq. C/ (8.5*2 .0)	17.00	m2	3,344.12	56,850.06	
4.05	Construcción de Baden en la C/ Sosa esq. C/ (8.9*2.0)	17.80	m2	3,344.12	59,525.36	**286,256.78**
V-	**LIMPIEZA FINAL**					
5.01	Limpieza general y final.	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	**15,000.00**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					**6,520,424.16**
	GASTOS INDIRECTOS					
	Dirección Técnica y Resp. Civil.		10.00%		652,042.42	
	Gastos Administrativos.		3.00%		195,612.72	
	Seguros y finanzas.		2.50%		163,010.60	
	Liquidacion y Prest. Laborales. Ley 686.		1.00%		65,204.24	
	Codia 1x1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus dependencias.		0.10%		6,520.42	
	ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo I).		18.00%		117,367.63	**1,199,758.05**
	TOTAL GENERAL PRESUPUESTO					**7,720,182.21**

Preparado Por:

ING. WANDER JOISE RODRÍGUEZ REYNOSO
Codia 37246

28 de marzo del 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
18 de octubre de 2022

Contrato No: 022-2022 BIS
No. Oficio: 006-2022

Al : **Sr. Cristian Encamación**
Alcalde del AMA

Vía : **Lic. Luisana Guzmán**
Directora de Administrativo

Del : **Ing. Freddy M. Dini Lebrón**
Director de Obras Publicas Municipal

Anexo : Fotos y Soporte Técnico.

Asunto : **Solicitud Pago de Cub. 3**

Muy cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el pago de la Cub.3 Correspondiente a la Construcción de aceras contenes y badenes de las calles del sector Juana Saltitopa 2da (05). Perteneciente a las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. Por un monto de **RD$ 1, 757,588.12 (Un Millón, Setecientos Cincuenta y Siete Mil, Quinientos Ochenta y Ocho Pesos con 12/100).**

El mismo a nombre de la compañía **Grupo Sechas E.R.L, RNC 132-1898-7,** y/o **Ing. Samuel Eugenio Chalas Santanas,** Portador de la cédula de Identidad y electoral **No. 402-2410708-2.**

Sin otro particular se despide:

Atentamente:

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

DEPARTAMENTO DE
RECIBIDO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
18 de octubre de 2022

Al	:	**Sr. Cristian Encamación** Alcalde del AMA
Vía	:	**Lic. Luisana Guzmán** Directora Administrativa
Del	:	**Ing. Freddy M. Dini Lebrón** Director de Obras Publicas Municipal
Asunto	:	Informe de inspección a nombre de **Grupo Sechas E.R.L, RNC 132-1898-7p,** y/o **Ing. Samuel Eugenio Chalas Santanas,** Portador de la cédula de Identidad y electoral **No. 402-2410708-2.**
Anexo	:	Fotos y Soporte Técnico.

Muy cortésmente, me dirijo a usted, para remitirle el informe de Inspección de la Cub.1 **no. De contrato 022-2022 BIS**. Correspondiente a la Construcción de aceras contenes y badenes de las calles del sector Juana Saltitopa 2da (05). Perteneciente a las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. En el Municipio de Los Alcarrizos. Esta obra se encuentran ejecutada en un **77.66%.**

Este informe fue suministrado, evaluado y autorizado por la parte interesadas:

Jose Modesto Navarro
Ing. José Modesto Navarro
Supervisor

Samuel Chalas
Grupo Sechas E.R.L, Ing. y/o
Samuel Eugenio Chalas Santanas
Contratista

GRUPO SECHAS, E.I.R.L.
RNC: 132-18981-7
Santo Domingo, R.D.

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

"AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS"
(AMA)
Dirección de Obras Públicas Municipales

Contratista:	**GRUPO SERCHAS/ING.SAMUEL EUGENIO CHALAS SANTANA**
Obra:	Construccion de aceras contenes y badenes de las calles del sector Juana Saltitopa 2da (05). Perteneciente a las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.
Codigo:	AMA05-OP0322-P13-M
Sector:	Juana Saltitopa 2da (05)
No. Contrato	022-2022 BIS
Cub. No.	3
Fecha:	18 de octubre de 2022

Periodo: Agosto-Octubre/2022

Monto Contratado:	3,893,746.39
Monto a Ejecutar:	3,288,637.16
Monto a ejecutar mas Impuestos:	3,893,746.39
Avance Inicial:	778,749.28
Avance de Obra:	77.66%
Monto Adicional 25% del Monto Contratado:	973,436.60
Avance de Adicional:	64.43%

		PRESUPUESTO CONTRATADO				CUBICACION No.1 (Anterior)			CUBICACION No.2 (Anterior)			CUBICACION No.3 (Actual)			CUBCIACION ACUMALADA No.1,2,3		
No.	**PARTIDAS**	**Cantidad**	**Unidad**	**Costo Uni.**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**%**	**Cantidad**	**Valor**	**%**	**Cantidad**	**Valor**	**%**	**Cantidad**	**Valor**	**%**
	ETAPA I																
I	**Preliminar**																
1.01	Valla Informativa Informativa	1.00	P.A.	13,000.00	13,000.00	1.00	13000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	13,000.00	100.00%
					13,000.00											**13,000.00**	
II	**MOVIMIENTO DE TIERRA**																
2.01	Excavación para el Peatón Coranel Fernández (13.2*1.90*0.10)	2.51	m3	315.00	790.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.02	Excavación para aceras para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	4.12	m3	315.00	1,297.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.03	Excavación para contenes para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	1.85	m3	315.00	584.01	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.04	Excavación para aceras en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	10.80	m3	315.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.05	Excavación para contenes en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	4.88	m3	315.00	1,536.57	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.06	Excavación para aceras en la C/Respaldo 17, desde la calle Duarte hasta el final (101.50*1*0.10)*2	20.30	m3	315.00	6,394.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11.95	3765.51	58.89%	11.95	3765.51	58.89%
2.07	Excavación de material inservible en el callejón de la respaldo 17 (13*3*0.10)	3.90	m3	315.00	1,228.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.08	Excavación de material inservible en el callejón de la casa No. 4 (12.5*3*0.10)	3.75	m3	315.00	1,181.25	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.09	Excavación para aceras en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*1*0.10)*2	22.00	m3	315.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

2.1	Excavación para contenes en la en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*0.45*0.10)*2	9.90	m3	315.00	3,118.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.11	Excavación para aceras en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye)**(94.5*1*0.10)*2	18.90	m3	315.00	5,953.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.84	3099.60	52.06%	9.84	3,099.60	52.06%
2.12	Excavación para contenes en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye)**(94.50*0.45*0.10)*2	8.51	m3	315.00	2,679.08	4.04	1271.49	47.46%	0.00	0.00	0.00%	3.61	1136.84	42.43%	7.65	2,408.32	89.89%
2.13	Excavación para aceras en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye),**(56.80*1*0.10)*2	11.36	m3	315.00	3,578.40	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11.36	3578.40	100.00%	11.36	3,578.40	100.00%
2.14	Excavación para contenes en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye),** (56.80*0.45*0.10)*2	5.11	m3	315.00	1,610.28	4.98	1567.77	97.36%	0.00	0.00	0.00%	0.13	42.51	2.64%	5.11	1,610.28	100.00%
2.15	Excavación para aceras en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 **(Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)** (50*1*0.10)*2	10.00	m3	315.00	3,150.00	8.45	2660.81	84.47%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.45	2,660.81	84.47%
2.16	Excavación para contenes en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 **(Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)**(50*0.45*0.10)*2	4.50	m3	315.00	1,417.50	3.50	1102.82	77.80%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.50	1,102.82	77.80%
2.17	Excavación para aceras en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye)**(266.70*1*0.10)*2	53.34	m3	315.00	16,802.10	36.55	11514.48	68.53%	0.00	0.00	0.00%	16.79	5287.59	31.47%	53.34	16,802.07	100.00%
2.18	Excavación para contenes en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye)** (266.70*0.45*0.10)*2	24.00	m3	315.00	7,560.95	22.47	7077.80	93.61%	0.00	0.00	0.00%	1.53	483.14	6.39%	24.00	7,560.95	100.00%
2.19	Excavación para aceras en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*1*0.10)*2	40.00	m3	315.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.2	Excavación para contenes en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*0.45*0.10)*2	18.00	m3	315.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.21	Demolición de Baden en la C/ Coronel Fernóndez (7.9*2.0)	15.80	m2	750.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.22	Demolición de Baden en la C/ El Canal (6*2.0)	12.00	m2	750.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.23	Demolición de Baden en la C/ El Canal próximo al colmado Raymundo (3.5*2.0)	7.00	m2	750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
					113,584.95											**42,588.75**	
III	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION**																

3.01	Relleno en caliche para Peatón Coranel Fernández (13.2*1.90*0.10)	2.51	m3	525.00	1,316.70	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.02	Relleno en caliche para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	4.12	m3	525.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.03	Telford para contenes para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	1.85	m3	1,703.67	3,158.60	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.04	Relleno en caliche para aceras en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	10.80	m3	525.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.05	Telford para contenes en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	4.88	m3	1,703.67	8,310.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.06	Relleno en caliche para aceras en la C/Respaldo 17, desde la calle Duarte hasta el final (101.50*1*0.10)*2	20.30	m3	525.00	10,657.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.39	1255.28	11.78%	2.39	1255.28	11.78%
3.07	Relleno en caliche para el callejón de la respaldo 17 (13*3*0.10)	3.90	m3	525.00	2,047.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.08	Relleno en caliche para el callejón de la casa No. 4 (12.5*3*0.10)	3.75	m3	525.00	1,968.75	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.09	Relleno en caliche para aceras en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*1*0.10)*2	22.00	m3	525.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.1	Telford para contenes en la en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*0.45*0.10)*2	9.90	m3	1,703.67	16,866.33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.11	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye)** (94.5*1*0.10)*2	18.90	m3	525.00	9,922.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.84	5166.00	52.06%	9.84	5,166.00	52.06%
3.12	Telford para contenes en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye)** (94.50*0.45*0.10)*2	8.51	m3	1,703.67	14,489.71	4.04	6876.82	47.46%	0.00	0.00	0.00%	3.61	6148.55	42.43%	7.65	13,025.36	89.89%
3.13	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye)**(56.80*1*0.10)*2	11.36	m3	525.00	5,964.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11.36	5964.00	100.00%	11.36	5,964.00	100.00%
3.14	Telford para contenes en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye),** (56.80*0.45*0.10)*2	5.11	m3	1,703.67	8,709.16	4.977	8479.24	97.36%	0.00	0.00	0.00%	0.13	229.92	2.64%	5.11	8,709.16	100.00%
3.15	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 **(Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)**(50*1*0.10)*2	10.00	m3	525.00	5,250.00	8.45	4434.68	84.47%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.45	4,434.68	84.47%
3.16	Telford para contenes en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 **(Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)** (50*0.45*0.10)*2	4.50	m3	1,703.67	7,666.52	3.50	5962.85	77.78%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.50	5,962.85	77.78%

3.17	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye)** (266.70*1*0.10)*2	53.34	m3	525.00	28,003.50	36.55	19190.80	68.53%	0.00	0.00	0.00%	16.79	8812.65	31.47%	53.34	28,003.45	100.00%
3.18	Telford para contenes en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye),** (266.70*0.45*0.10)*2	24.00	m3	1,703.67	40,893.19	22.47	38280.12	93.61%	0.00	0.00	0.00%	1.53	2613.07	6.39%	24.00	40,893.19	100.00%
3.19	Relleno en caliche para aceras en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*1*0.10)*2	40.00	m3	525.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	18.94	9943.50	47.35%	18.94	9,943.50	47.35%
	Telford para contenes en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*0.45*0.10)*2	18.00	m3	1,703.67	30,666.06	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	18.00	30666.06	100.00%	18.00	30,666.06	100.00%
					236,273.53											**154,023.52**	
IV	**HORMIGON SIMPLE**																
4.01	Construcción de contenes para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	41.20	ml	792.86	32,665.83	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4.02	Construcción de aceras en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	108.00	m2	785.31	84,813.48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4.03	Construcción de contenes en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	108.40	ml	792.86	85,946.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4.04	Construcción de aceras en la C/Respaldo 17, desde la calle Duarte hasta el final (101.50*1*0.10)*2	203.00	m2	785.31	159,417.93	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	119.54	93875.96	58.89%	119.54	93,875.96	58.89%
	Construcción de aceras en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*1*0.10)*2	220.00	m2	785.31	172,768.20	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4.06	Construcción de contenes en la en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*0.45*0.10)*2	220.00	ml	792.86	174,429.20	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4.07	Construcción de aceras en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye, desde la C/ La Torre hasta los Cuernos),** (94.5*1*0.10)*2	189.00	m2	785.31	148,423.59	0.00	0.00	0.00%	98.40	77274.50	52.06%	0.00	0.00	0.00%	98.40	77,274.50	52.06%
4.08	Construcción de contenes en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye, desde la C/ La Torre hasta los Cuernos),** (94.50*0.45*0.10)*2	189.00	ml	792.86	149,850.54	89.70	71119.54	47.46%	80.20	63587.37	42.43%	0.00	0.00	0.00%	169.90	134,706.91	89.89%
4.09	Construcción de aceras en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye, desde la C/La Torre hasta C/ Los Cuernos)**(56.80*1*0.10)*2	113.60	m2	785.31	89,211.22	0.00	0.00	0.00%	113.60	89208.86	100%	0.00	0.00	0.00%	113.60	89,208.86	100.00%

4.1	Construcción de contenes en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye)** (56.80*0.45*0.10)*2	113.60	ml	792.86	90,068.90	110.60	87690.32	97.36%	3.00	2378.58	3%	0.00	0.00	0.00%	113.60	90,068.90	100.00%
4.11	Construcción de aceras en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31**(Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)** (50*1*0.10)*2	100.00	m2	785.31	78,531.00	84.47	66335.14	84.47%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	84.47	66,335.14	84.47%
4.12	Construcción de contenes en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 (Nombre actual C/ **Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final**)(50*0.45*0.10)*2	100.00	ml	792.86	79,286.00	77.80	61684.51	77.80%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	77.80	61,684.51	77.80%
4.13	Construcción de aceras en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 (**Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye**)(266.70*1*0.10)*2	533.40	m2	785.31	418,884.35	365.54	287062.22	68.53%	167.86	131822.14	31.47%	0.00	0.00	0.00%	533.40	418,884.35	100.00%
4.14	Construcción de contenes en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye)** (266.70*0.45*0.10)*2	533.40	ml	792.86	422,911.52	499.30	395875.00	93.61%	34.10	27036.53	6.39%	0.00	0.00	0.00%	533.40	422,911.52	100.00%
4.15	Construcción de aceras en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*1*0.10)*2	400.00	m2	785.31	314,124.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	400.00	314124.00	100.00%	400.00	314,124.00	100.00%
4.16	Construcción de contenes en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*0.45*0.10)*2	400.00	ml	792.86	317,144.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	400.00	317144.00	100.00%	400.00	317,144.00	100.00%
					2,818,475.79											**2,086,218.65**	
V	**HORMIGON ARMADO**																
5.01	Reconsonstruccion de Baden en la C/ Coronel Fernóndez (7.9*2.0)	15.80	m2	2,652.38	41,907.63	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%				0.00	0.00	0.00%
5.02	Reconsonstruccion de Baden en la C/ El Canal (6*2.0)	12.00	m2	2,652.38	31,828.58	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%				0.00	0.00	0.00%
5.03	Reconsonstruccion de Baden en la C/ El Canal próximo al colmado Raymundo (3.5*2.0)	7.00	m2	2,652.38	18,566.67	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%				0.00	0.00	0.00%
					92,302.89											**0.00**	
VII	**LIMPIEZA FINAL**																
6.01	Limpieza final	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
					15,000.00											**0.00**	
	ADICIONAL DE PARTIDA POR EXCESO DE VOLUETRIA																
III	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION**																
3.11	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye)** (98.40*1*0.16)	15.74	m3	525.00	8,265.60	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	15.74	8265.60	100.00%	15.74	8,265.60	100.00%

3.12	Telford para contenes en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye)** (169.90*0.45*0.05)	3.82	m3	1,703.67	6,511.90	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.82	6511.90	100.00%	3.82	6,511.90	100.00%
3.13	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye)**(113.60*1*0.16)	18.18	m3	525.00	9,542.40	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	18.18	9542.40	100.00%	18.18	9,542.40	100.00%
3.14	Telford para contenes en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye),** (113.60*0.45*0.05)	2.56	m3	1,703.67	4,354.58	0.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.56	4354.58	100.00%	2.56	4,354.58	100.00%
3.15	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 **(Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)**(84.47*1*0.16)	13.52	m3	525.00	7,095.48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	13.52	7095.48	100.00%	13.52	7,095.48	100.00%
3.16	Telford para contenes en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 **(Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)** (77.80*0.45*0.05)	1.75	m3	1,703.67	2,981.42	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.75	2981.42	100.00%	1.75	2,981.42	100.00%
3.17	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye)** (533.40*1*0.16)	85.34	m3	525.00	44,805.60	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	85.34	44805.60	100.00%	85.34	44,805.60	100.00%
3.18	Telford para contenes en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye),** (533.40*0.45*0.05)	12.00	m3	1,703.67	20,444.04	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	20444.04	100.00%	12.00	20,444.04	100.00%
3.19	Relleno en caliche para aceras en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*1*0.10)*2	7.35	m3	525.00	3,859.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.35	3859.80	100.00%	7.35	3,859.80	100.00%
3.20	Telford para contenes en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*0.45*0.10)*2	4.79	m3	1,703.67	8,165.69	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.79	8165.69	100.00%	4.79	8,165.69	100.00%
					116,026.51											**116,026.51**	
III	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION**																
3.13	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye)**(14.37*1*0.26)	3.74	m3	525.00	1,963.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.74	1963.50	100.00%	3.74	1,963.50	100.00%
3.14	Telford para contenes en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye),** (8.00*0.45*0.15)	0.54	m3	1,703.67	919.98	0.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.54	919.98	100.00%	0.54	919.98	100.00%
3.17	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye)** (5.09*1*0.26)	1.32	m3	525.00	693.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.32	693.00	100.00%	1.32	693.00	100.00%

3.18	Telford para contenes en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye),** (3.10*0.45*0.15)	0.21	m3	1,703.67	357.77	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.21	357.77	100.00%	0.21	357.77	100.00%
					3,934.25											**3,934.25**	
IV	**HORMIGON SIMPLE**																
4.09	Construcción de aceras en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye, desde la C/La Torre hasta C/ Los Cuernos)**(56.80*1*0.10)*2	14.37	m2	785.31	11,284.90	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	14.37	11284.90	100.00%	14.37	11,284.90	100.00%
..10	Construcción de contenes en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye)** (56.80*0.45*0.10)*2	8.00	ml	792.86	6,342.88	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	6342.88	100.00%	8.00	6,342.88	100.00%
4.13	Construcción de aceras en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye)**(266.70*1*0.10)*2	5.09	m2	785.31	3,997.23	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.09	3997.23	100.00%	5.09	3,997.23	100.00%
4.14	Construcción de contenes en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye)** (266.70*0.45*0.10)*2	3.10	ml	792.86	2,457.87	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.10	2457.87	100.00%	3.10	2,457.87	100.00%
4.15	Construcción de aceras en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*1*0.10)*2	88.16	m2	785.31	69,232.93	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	88.16	69232.93	100.00%	88.16	69,232.93	100.00%
4.16	Construcción de contenes en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*0.45*0.10)*2	106.50	ml	792.86	84,439.59	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	106.50	84439.59	100.00%	106.50	84,439.59	100.00%
					177,755.40											**177,755.40**	
	CAMBIO DE PARTIDA (Demolición en vez de excavación)																
II	**MOVIMIENTO DE TIERRA**																
2.19	Demolición para aceras en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (488.16*1*0.10)	488.16	m2	280.00	136,684.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	488.16	136684.80	100.00%	488.16	136,684.80	100.00%
2.20	Demolición para contenes en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (506.50*0.45*0.10)	506.50	ml	240.00	121,560.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	506.50	121560.00	100.00%	506.50	121,560.00	100.00%
					258,244.80											**258,244.80**	
	PARTIDA ADICIONAL (NO PRESUPUESTADA)																
VIII	**MOVIMIENTO DE TIERRA**																
8.01	Demolición de muro en la **C/ Marisol, lado izquierdo de la Ye, desde C/ La Torre hasta los Cuernos** (21.42*0.80*0.50)	17.14	m2	842.71	14,440.68	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	17.14	14440.68	100.00%	17.14	14,440.68	100.00%

8.02	Demolición de acera en la **C/ Marisol lado izquierdo de la Ye, desde C/ La Torre hasta los Cuernos)** (4.60*2.00*0.50)	9.20	m2	280.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.20	2576.00	100.00%	9.20	2,576.00	100.00%
8.03	Demolición de muro en la **C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye, desde C/La Torre hasta C/ Los Cuernos** (2.27*0.80*0.50)	1.82	m2	842.71	1,530.36	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.82	1530.36	100.00%	1.82	1,530.36	100.00%
8.04	Demolición de aceras en la **C/ La Torre, Desde Calle 7 hasta la Ye** (13.80*1.20*0.50) + (6.40*0.95*0.50) + (4.60*1.10*0.50) +(1.30*0.40*0.20)	28.22	m2	280.00	7,901.60	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	28.22	7901.60	100.00%	28.22	7,901.60	100.00%
8.05	Demolición de muro en la **C/ La Torre, Desde calle 7 hasta la Ye** (4.60*0.15*0.30)	0.69	m2	842.71	581.47	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.69	581.47	100.00%	0.69	581.47	100.00%
					27,030.11											**27,030.11**	
IX	**MOVIMIENTO DE TIERRA**																
9.01	Excavación para contenes en la C/Respaldo 17, desde la calle Duarte hasta el final (102.30*0.45*0.10)*2	9.21	m3	315.00	2,900.21	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.21	2900.21	100.00%	9.21	2,900.21	100.00%
					2,900.21											**2,900.21**	
X	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION**																
10.01	Telford para contenes en la C/Respaldo 17, desde la calle Duarte hasta el final (102.30*0.45*0.10)*2	5.16	m3	1,703.67	8,790.94	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.16	8790.94	100.00%	5.16	8,790.94	100.00%
					8,790.94											**8,790.94**	
XI	**HORMIGON SIMPLE**																
11.01	Construcción de contenes en la C/Respaldo 17, desde la calle Duarte hasta el final (102.30*0.45*0.10)*2	204.60	ml	792.86	162,219.16	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	204.60	162219.16	100.00%	204.60	162,219.16	100.00%
					162,219.16											**162,219.16**	
XII	**HORMIGON SIMPLE**																
12.01	Construcción de muro de encache para sostener acera en la **C/ Respaldo #6 lado derecho de la Ye, desde C/La Torre hasta C/ Los Cuernos** (12.80*0.40*1.00)	5.12	m3	3,555.51	18,204.21	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.12	18204.21	100.00%	5.12	18,204.21	100.00%
					18,204.21											**18,204.21**	
XIII	**PRELIMINARES (NO PRESUPUESTADA)**																
13.01	Limpieza y acondicionamiento de terreno con equipo (Retro pala) en **C/ La Torre, desde la calle #7 hasta la Y** (250*8.00*.015)	8.00	hrs	2,800.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	22400.00	100.00%	8.00	22,400.00	100.00%
13.02	Bote de material producto de las demoliciones (escombros)	122.44	m3	600.00	73,464.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	122.44	73464.00	100.00%	122.44	73,464.00	100.00%
13.03	Corte de terreno para acera y conten en C/ La Torre prox. C/ Resp.#6 (4.70*0.25) + (9.70*0.50)	1.74	m3	250.00	435.31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.74	435.31	100.00%	1.74	435.31	100.00%
13.04	Corte de terreno para conten en tramo de curva C/ Los Cuernos (7.30*0.80*0.36)	2.10	m3	250.00	525.60	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.10	525.60	100.00%	2.10	525.60	100.00%

13.05	Corte de Arboles de aguacate, jabilla y otros en C/ La Torre, C/ Ruth Delania, Tramo de curva C/ Los Cuernos y C/Prolongación 17 (9 unidades)	1.00	P.A	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	13500.00	100.00%	1.00	13,500.00	100.00%
					110,324.91											**110,324.91**	
	Sub-Total de ADICIONALES				**627,185.69**											**627,185.69**	
	Sub-Total General				**3,288,637.16**											**2,554,075.72**	
									GASTOS INDIRECTOS DE ADICIONALES:								
	GASTOS INDIRECTOS:																
1.000	*DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. CIVIL.*			*10.000%*						62,718.57						255,407.57	
1.001	*GASTOS ADMINISTRATIVOS.*			*3.000%*						18,815.57						76,622.27	
1.002	*SEGUROS Y FIANZAS.*			*2.500%*						15,679.64						63,851.89	
1.003	*LIQUIDACIÓN Y PRESTS . LABORALES. Ley 686*			*1.000%*						6,271.86						25,540.76	
1.004	*CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus dependencias*			*0.100%*						627.19						2,554.08	
1.005	*ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo I)*			*18.000%*						11,289.34						45,973.36	
	Total Gastos Indirectos									**115,402.17**						**469,949.93**	
	TOTAL CUBICADO HASTA LA FECHA															**3,024,025.65**	
	MONTO CUB. 1															**1,291,966.67**	
	MONTO CUB. 2															**463,308.65**	
	TOTAL CUB. 3															**1,268,750.33**	
	Amortizacion 20% valor cubicado															**253,750.07**	
	MONTO ADICIONAL CUB. 3															**742,587.86**	
	TOTAL A PAGAR CUB. 3 + MONTO ADICIONAL CUB. 3															**1,757,588.12**	

Los datos procesados en esta cubicacion fueron suministrado por el supervisor de dicha obra.

Nota: La presente Cubicacion se expide a total responsabilidad del Depto de Supervicion, mediante los supervisores actuantes en la misma.-

Procesada Por:

Joicy Castillo Marios
Enc. Del Depto. De Cubicación de OP

Supervisado por:

Sr. Cesar Puala Frias
Enc. de Supervicion

Aprobado Por:

GRUPO SERCHAS/ING.SAMUEL EUGENIO CHALAS SANTANA
Contratista

Datos susminitrados por:

Ing. Jose Modesto Navarro
Supervisor del AMA

Revisador por:

Ing. Juan Carlos Rosario
Enc. de Presupuesto

Aprobado Por:

Ing. Freddy M. Dini Lebron
Director de la Dirección de Obras Publicas Municipal

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario.
Dirección de Obras Públicas Municipal

DATOS PARA CUBICACION

Nombre del Proyecto: Construcción de aceras y contenes Badenes, Rellenos y alcantarillados

Sector: Sector Juana Saltitopaz da

Ubicación: Diferentes calles

Nombre de Contratista:

Contrato No. 022-2022 BIS

Cubicación No. 3 **Fecha:** 30/9/2022

Supervisor: Ing. José' Modesto

OBSERVACIONES:

Cub. 1 - Juana altitspa 2da, aceras y contenes

-C/Prolongación 17 desde c/17 hasta el Final

- Demolición de aceras = 488.16 m²
- Demolición de contenes = 506.5 mL
- Relleno en caliche para aceras = 18.94 m³
- TelFold para contenes = 18.00 m³
- Construcción de aceras = 488.16 m²
- construcción de contenes = 506.5 mL
- Bote de escombros = 122.44 m³

-C/Resp. 17 desde c/17 hasta el Final

- Excavación para aceras = 11.954 m³
- Excavación para contenes = 9.21 m³
- Relleno en caliche para aceras = 2.39 m³
- TelFord Para contenes = 5.16 m³
- construcción de aceras = 119.54 m²
- Construcción de contenes = 204.6 mL
- Corte de 2 arboles

YO SOY
JIBARO









DATOS PARA CUBICACION

Nombre del Proyecto: Construcción de aceras y Contenes

Sector: Los Libertadores, Juana Saltitopa

Ubicación: Calle Puente blanco, Detrás del Supermercado La Sirena, Alcarrizos

Nombre de Contratista: Samuel Chalas
Grupo Chalas

Contrato No.

Cubicación No. 3 Fecha: 4/8/2022

Supervisor: Ing. Anigail Polanco G.

OBSERVACIONES:

Recibido 4/8/2022

* Limpieza y acondicionamiento de terreno con uso de Retro para.
- Calle La Torre - Desde C/#7 hasta la y. L=250 x 8.00 x 0.15
* Corte de arboles - 7 unidades
- Calle La Torre - (Prot. inicio calle, Mediado calle, prox. a la y)
- Calle Ruth Delania - (Prox. final de la calle)
- Tramo Curva C/Los Cuernos
* Cortes de Terrenos para aceras y contenes.
L=4.70 x 0.25 M - Corte para conten, C/La Torre prox. C/Resp. #6
L=9.70 x 0.50 M - Corte para acera, C/La Torre prox. C/Resp. #6
L=7.30 x 0.80 x 0.36 M - Corte para conten, Tramo Curva C/Cuernos.
* Demoliciones
- Demolición acera - (Calle La Torre, Prot. a La y)
L=13.80 x 1.20 M
- Demolición Muro - (C/Resp. #6, Prox. Curva C/Los cuernos)
L=2.27 x 0.80 x 0.50 M
- Demol. acera - (Calle La Torre, Prot. a La y)
L=6.40 x 0.95 x 0.50 M
- Demol. Muro - (Calle Marisol, Prox. Curva C/Los Cuernos)
L=21.42 x 0.80 x 0.50 M
- Demol. Muro - (Calle La Torre, Casa con ventana incrustado en acera.)
L=4.60 x 0.15 x 0.30 M
- Demol. acera - (Calle Marisol prox. a la y)
L=4.60 x 2.00 x 0.50 M
- Demol. acera - (Calle La torre, prox. C/Ruth Delania)
L=4.60 x 1.10 x 0.50 M


* Rellenos


Los rellenos para las aceras por lo general son de E=0.26 M y para los contenes E=0.15 M en todas las calles


* Tramo de acera preparado para contensión. (Encache)
- Calle Resp. #6, Prox. a la y
L = 12.80 x 0.40 x 1.00 M


Ojo: Espesor de Muro E=1.00 M + 0.10 M (Esp. acera)
Para este muro el relleno fue ligado con piedras y Hormigón.

Adicional
4 agosto 2022

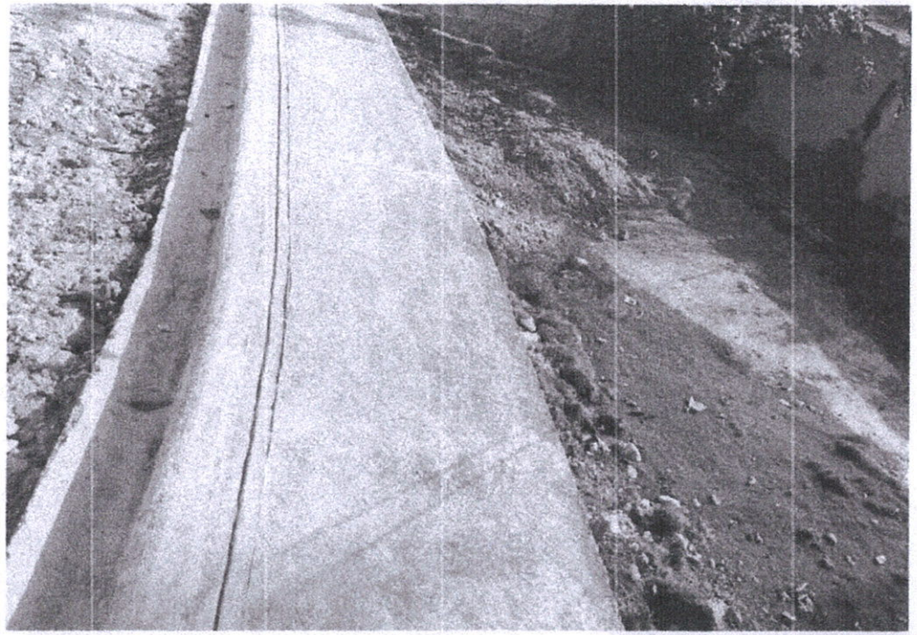

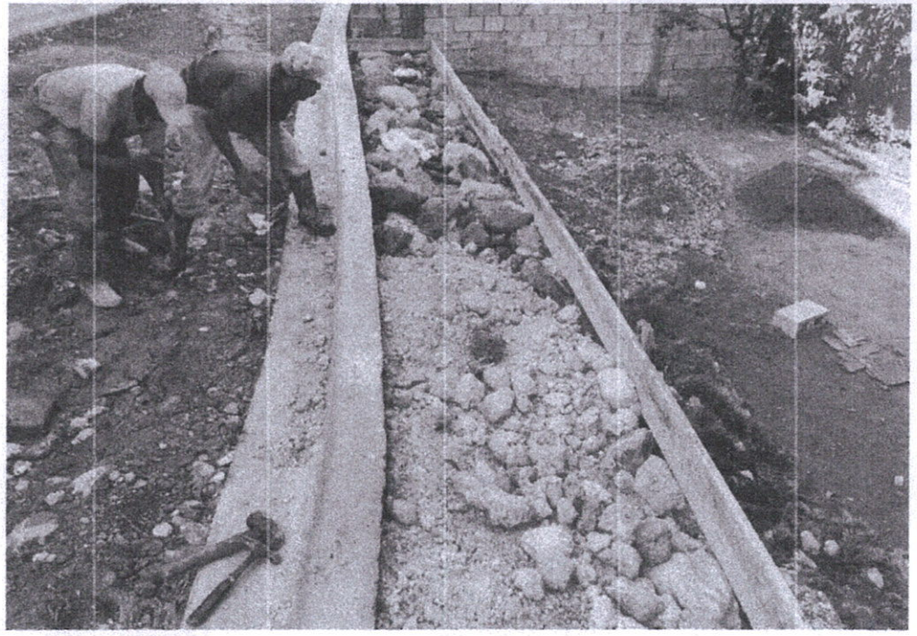

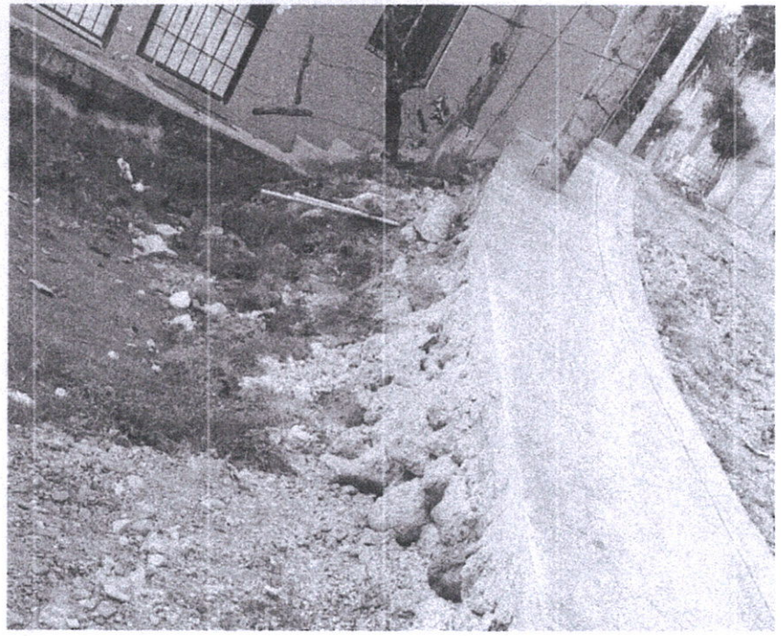

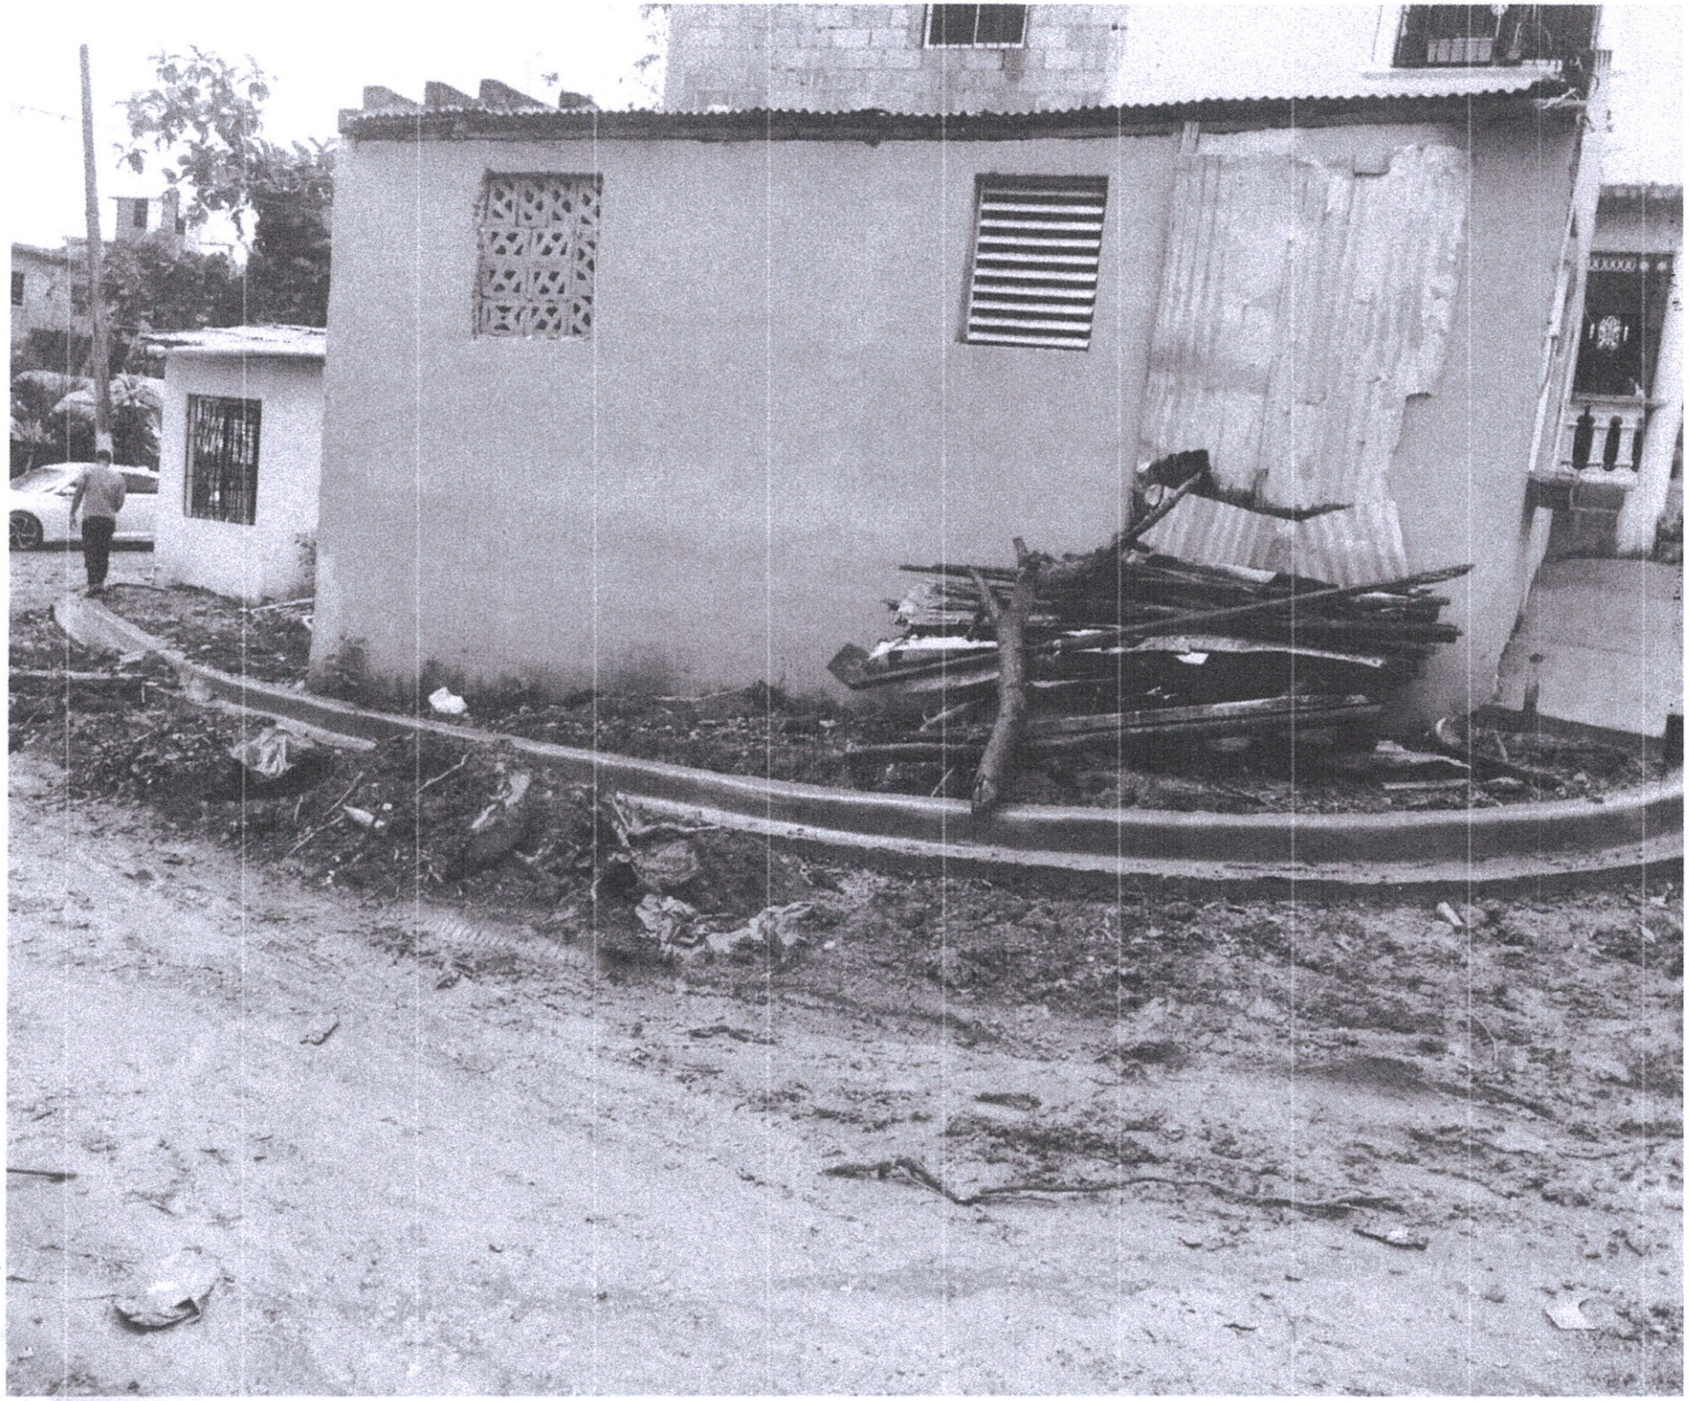

Fecha	Concepto	Valor
24/10/2022	P/R PAGO A FAVOR DE GRUPO SECHAS EIRL, POR CONCEPTO DE CUBIC ACION #3, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA EN LOS ALCAR	1,722,436.36

7261

Clave Municipal No.

No. 018750

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
PROGRAMA DE INVERSION

DIA	MES	AÑO
24	10	2022

0017813

RNC: 430-04253-6
DO28BRRD00000000002440009274

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO SECHAS EIRL RD$ *1,722,436.36

*** UN MILLON SETECIENTOS VEINTE Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 36/100 ***

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

IRodriguez

FIRMA(S)

"018750" 244122722130244000927 4" 28

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa		Valor
No. Comprobante .. : 2204561 P/R PAGO A FAVOR DE GRUPO SECHAS EIRL, POR CONCEPTO DE CUBICACION #3, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA EN LOS ALCARRIOS, CONTRATO NO.		Estructura 0011010100 0011010101	Clasific. 272401 272401	817,069.56 905,366.80
			TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL . . LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2204561
FECHA 24/10/2022
SECUENCIAL: 4623

TIPO COMPROBANTE: 2204560 — Etapa: Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original — Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 18158 — RNC/CED/PAS: 132-18981-7
BENEFICIARIO: GRUPO SECHAS EIRL
DIRECCION: — TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R PAGO A FAVOR DE GRUPO SECHAS EIRL, POR CONCEPTO DE CUBICACION #3, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA EN LOS ALCARRIOS, CONTRATO NO. 22/2022. ANEXO***UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 36/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0100	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	817,069.56
00 11 01 0101	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	940,518.56
					Menos las siguientes Retenciones	
00 11 01 0101	272401	40	9992	103	MENOS 2% De: 1,757,588.12	(35,151.76)
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	
					Total RD$	1,722,436.36

CK No.	Monto	Fecha

GRUPO SECHAS, E.I.R.L. RNC: 132-18981-7 Santo Domingo, R.D.

Beneficiario

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Original - Expediente, 1-Contabilidad,
[illegible]a, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D OS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No.	2204560
FECHA	24/10/2022
SECUENCIAL:	4622

TIPO COMPROBANTE: 2204561 **Etapa:** Devengado

CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 18158 **RNC/CED/PAS:** 132-18981-7

BENEFICIARIO: GRUPO SECHAS EIRL

DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R PAGO A FAVOR DE GRUPO SECHAS EIRL, POR CONCEPTO DE CUBICACION #3, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA EN LOS ALCARRIOS, CONTRATO NO. 22/2022. ANEXO***UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0100	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	817,069.56
00 11 01 0101	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	940,518.56
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	
					Total RD$	1,757,588.12

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE LOS ALCARRIZOS
GESTIÓN 2020-2024

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

DIRECCION ADMINISTRATIVA

20 de octubre del 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde Municipal

Vía : Dirección Financiera

De la : Dirección Administrativa

Asunto : Pago **cubicación #3**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCIÓN FINANCIERA
AUTORIZADO
Firma
Fecha 24/10/2022

Distinguidos Señores:

Cortésmente le estamos solicitando el pago a favor de**: Grupo Sechas E.R.L.**

Codia: Contrato No. **22/2022**. RNC: **132189817**

Monto a pagar**: RD$1,757,588.12 (Un Millón Setecientos Cincuenta Y Siete Mil Quinientos Ochenta Y Ocho Pesos Con 12/100).**

Por concepto de Pago: **cubicación No.3**, para la construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes calles del sector Juana Saltitopa en los Alcarrizos.

Atentamente,

Lcda. Luisana Guzmán
Administrativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo R.D.

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS

Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Públicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
24 de agosto 2022

Contrato No: 022-2022BIS
No. Oficio: 022-2022

Al	:	**Sr. Cristian Encamación** Alcalde del AMA
Vía	:	**Lic. Luisana Guzmán** Directora de Administrativo
Del	:	**Ing. Freddy M. Dini Lebrón** Director de Obras Publicas Municipal
Anexo	:	Fotos y Soporte Técnico.

Asunto	:	**Solicitud Pago de Cub.2**

Muy cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el pago de la **Cubicacion No.2**, Correspondiente Construcción de aceras, contenes, badenes, en las calles (Peatonal Coronel Fernández, Callejón de la C/ Canal, C/ Canal, Resp.17, C/ La Torre, C/ Marisol, C/ Resp.6 y C/ Ruth Delania), del Sector (5) Juana Saltitopa 2da. Por un monto de **RD$370,646.92 (Trecientos Setenta Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 92/100).**

El mismo a nombre de Grupo Sechas ERL. y/o Ing. Samuel Eugenio Chalas Santana, RNC **No.1-32-18981-7.**

Sin otro particular se despide:

Atentamente:

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS

Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Públicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
24 de agosto 2022

Al	:	**Sr. Cristian Encamación** Alcalde del AMA
Vía	:	**Lic. Luisana Guzmán** Directora de Administrativo
Del	:	**Ing. Freddy M. Dini Lebrón** Director de Obras Publicas Municipal
Asunto	:	Informe de inspección a nombre de Grupo Sechas, ERL.RNC-1-32-18981-7, representado por Ing. Samuel Eugenio Chalas Santana, portador de la cedula de identidad y electoral No.402-2410708-2
Anexo	:	Presupuesto autorizado, Fotos y Soporte Técnico.

Muy cortésmente, me dirijo a usted para remitirle el informe correspondiente a la **Cubicación No.2** de la construcción de aceras, contenes, badenes, en las calles (Peatonal Coronel Fernández, Callejón de la C/ Canal, C/ Canal, Resp.17, C/ La Torre, C/ Marisol, C/ Resp.6 y C/ Ruth Delania) del Sector (5) Juana Saltitopa 2da. Perteneciente a las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. Etapa I. **Este proyecto se encuentran en ejecución en un 45.08% del valor contratado.**

Este informe fue suministrado, evaluado y autorizado por la parte interesadas:

Ing. Avigail Polanco/G
Supervisora de Obras

GRUPO SECHAS E.I.R.L. RNC: 132-18981-7 Santo Domingo, R.D.

Grupo Sechas y/o Samuel E. Chalas S.
Director de Obras Pública Municipal

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipal

DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

"AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS"

(AMA)

Dirección de Obras Públicas Municipales

REVISADO

Contratista:	GRUPO SERCHAS/ING.SAMUEL EUGENIO CHALAS SANTANA			Periodo:	Julio- Agosto 2022
Obra.	Construccion de aceras contenes y badenes de las calles del sector Juana Saltitopa 2da (05). Perteneciente a las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.			Monto Contratado:	3,893,746.39
Codigo:	AMA05-OP0322-P13-M			Monto a Ejecutar:	3,288,637.16
Sector:	Juana Saltitopa 2da (05)	No. Contrato	022-2022 BIS	Monto a ejecutar mas Impuestos:	3,893,746.39
Cub. No.	2			Avance Inicial:	778,749.28
Fecha:	15 de agosto 2022			Avance de Obra:	45.08%

		PRESUPUESTO CONTRATADO				CUBICACION No.1 (Anterior)			CUBICACION No.2 (Actual)			CUBCIACION ACUMALADA		
No.	PARTIDAS	Cantidad	Unidad	Costo Uni.	Valor	Cantidad	Valor	%	Cantidad	Valor	%	Cantidad	Valor	%
	ETAPA I													
I	**Preliminar**													
1.01	Valla Informativa Informativa	1.00	P.A.	13,000.00	13,000.00	1.00	13,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	13,000.00	100.00%
					13,000.00		**13,000.00**						**13,000.00**	
II	**MOVIMIENTO DE TIERRA**													
2.01	Excavación para el Peatón Coranel Fernández (13.2*1.90*0.10)	2.51	m3	315.00	790.02	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
	Excavación para aceras para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	4.12	m3	315.00	1,297.80	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.03	Excavación para contenes para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	1.85	m3	315.00	584.01	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.04	Excavación para aceras en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	10.80	m3	315.00	3,402.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.05	Excavación para contenes en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	4.88	m3	315.00	1,536.57	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.06	Excavación para aceras en la C/Respaldo 17, desde la calle Duarte hasta el final (101.50*1*0.10)*2	20.30	m3	315.00	6,394.50	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.07	Excavación de material inservible en el callejón de la respaldo 17 (13*3*0.10)	3.90	m3	315.00	1,228.50	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.08	Excavación de material inservible en el callejón de la casa No. 4 (12.5*3*0.10)	3.75	m3	315.00	1,181.25	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.09	Excavación para aceras en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*1*0.10)*2	22.00	m3	315.00	6,930.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%

2.1	Excavación para contenes en la en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*0.45*0.10)*2	9.90	m3	315.00	3,118.50	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.11	Excavación para aceras en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye)**(94.5*1*0.10)*2	18.90	m3	315.00	5,953.50	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.12	Excavación para contenes en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye)**(94.50*0.45*0.10)*2	8.51	m3	315.00	2,679.08	4.04	1,271.49	47.46%	0.00	0.00	0.00%	4.04	1,271.49	47.46%
2.13	Excavación para aceras en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye)**,(56.80*1*0.10)*2	11.36	m3	315.00	3,578.40	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.14	Excavación para contenes en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye)**, (56.80*0.45*0.10)*2	5.11	m3	315.00	1,610.28	4.98	1,567.77	97.36%	0.00	0.00	0.00%	4.98	1,567.77	97.36%
2.15	Excavación para aceras en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 **(Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)** (50*1*0.10)*2	10.00	m3	315.00	3,150.00	8.45	2,660.81	84.47%	0.00	0.00	0.00%	8.45	2,660.81	84.47%
2.16	Excavación para contenes en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 **(Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)**(50*0.45*0.10)*2	4.50	m3	315.00	1,417.50	3.50	1,102.82	77.80%	0.00	0.00	0.00%	3.50	1,102.82	77.80%
2.17	Excavación para aceras en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye)**(266.70*1*0.10)*2	53.34	m3	315.00	16,802.10	36.55	11,514.48	68.53%	0.00	0.00	0.00%	36.55	11,514.48	68.53%
2.18	Excavación para contenes en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye)** (266.70*0.45*0.10)*2	24.00	m3	315.00	7,560.95	22.47	7,077.80	93.61%	0.00	0.00	0.00%	22.47	7,077.80	93.61%
2.19	Excavación para aceras en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*1*0.10)*2	40.00	m3	315.00	12,600.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.2	Excavación para contenes en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*0.45*0.10)*2	18.00	m3	315.00	5,670.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.21	Demolición de Baden en la C/ Coronel Fernóndez (7.9*2.0)	15.80	m2	750.00	11,850.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.22	Demolición de Baden en la C/ El Canal (6*2.0)	12.00	m2	750.00	9,000.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.23	Demolición de Baden en la C/ El Canal próximo al colmado Raymundo (3.5*2.0)	7.00	m2	750.00	5,250.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
					113,584.95		**25,195.16**			**0.00**			**25,195.16**	

III	RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION													
3.01	Relleno en caliche para Peatón Coranel Fernández (13.2*1.90*0.10)	2.51	m3	525.00	1,316.70	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.02	Relleno en caliche para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	4.12	m3	525.00	2,163.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.03	Telford para contenes para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	1.85	m3	1,703.67	3,158.60	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.04	Relleno en caliche para aceras en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	10.80	m3	525.00	5,670.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.05	Telford para contenes en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	4.88	m3	1,703.67	8,310.50	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
	Relleno en caliche para aceras en la C/Respaldo 17, desde la calle Duarte hasta el final (101.50*1*0.10)*2	20.30	m3	525.00	10,657.50	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.07	Relleno en caliche para el callejón de la respaldo 17 (13*3*0.10)	3.90	m3	525.00	2,047.50	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.08	Relleno en caliche para el callejón de la casa No. 4 (12.5*3*0.10)	3.75	m3	525.00	1,968.75	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.09	Relleno en caliche para aceras en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*1*0.10)*2	22.00	m3	525.00	11,550.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.1	Telford para contenes en la en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*0.45*0.10)*2	9.90	m3	1,703.67	16,866.33	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.11	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye)** (94.5*1*0.10)*2	18.90	m3	525.00	9,922.50	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.12	Telford para contenes en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye)** (94.50*0.45*0.10)*2	8.51	m3	1,703.67	14,489.71	4.04	6,876.82	47.46%	0.00	0.00	0.00%	4.04	6,876.82	47.46%
3.13	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye)**(56.80*1*0.10)*2	11.36	m3	525.00	5,964.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.14	Telford para contenes en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye),** (56.80*0.45*0.10)*2	5.11	m3	1,703.67	8,709.16	4.98	8,479.24	97.36%	0.00	0.00	0.00%	4.98	8,479.24	97.36%
3.15	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 **(Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)**(50*1*0.10)*2	10.00	m3	525.00	5,250.00	8.45	4,434.68	84.47%	0.00	0.00	0.00%	8.45	4,434.68	84.47%
3.16	Telford para contenes en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 **(Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)** (50*0.45*0.10)*2	4.50	m3	1,703.67	7,666.52	3.50	5,964.55	77.80%	0.00	0.00	0.00%	3.50	5,964.55	77.80%

3.17	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye)** (266.70*1*0.10)*2	53.34	m3	525.00	28,003.50	36.55	19,190.80	68.53%	0.00	0.00	0.00%	36.55	19,190.80	68.53%
3.18	Telford para contenes en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye),** (266.70*0.45*0.10)*2	24.00	m3	1,703.67	40,893.19	22.47	38,280.12	93.61%	0.00	0.00	0.00%	22.47	38,280.12	93.61%
3.19	Relleno en caliche para aceras en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*1*0.10)*2	40.00	m3	525.00	21,000.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.2	Telford para contenes en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*0.45*0.10)*2	18.00	m3	1,703.67	30,666.06	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
					236,273.53		**83,226.20**			**0.00**			**83,226.20**	
IV	**HORMIGON SIMPLE**													
4.01	Construcción de contenes para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	41.20	ml	792.86	32,665.83	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
4.02	Construcción de aceras en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	108.00	m2	785.31	84,813.48	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
4.03	Construcción de contenes en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	108.40	ml	792.86	85,946.02	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
4.04	Construcción de aceras en la C/Respaldo 17, desde la calle Duarte hasta el final (101.50*1*0.10)*2	203.00	m2	785.31	159,417.93	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
4.05	Construcción de aceras en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*1*0.10)*2	220.00	m2	785.31	172,768.20	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
...06	Construcción de contenes en la en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*0.45*0.10)*2	220.00	ml	792.86	174,429.20	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
4.07	Construcción de aceras en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye, desde la C/ La Torre hasta los Cuernos),** (94.5*1*0.10)*2	189.00	m2	785.31	148,423.59	0.00	-	0.00%	98.40	77274.50	52.06%	98.40	77,274.50	52.06%
4.08	Construcción de contenes en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye, desde la C/ La Torre hasta los Cuernos),** (94.50*0.45*0.10)*2	189.00	ml	792.86	149,850.54	89.70	71,119.54	47.46%	80.20	63587.37	42.43%	169.90	134,706.91	89.89%
4.09	Construcción de aceras en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye, desde la C/La Torre hasta C/ Los Cuernos)**(56.80*1*0.10)*2	113.60	m2	785.31	89,211.22	0.00	-	0.00%	113.60	89208.86	100%	113.60	89,208.86	100.00%

4.1	Construcción de contenes en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye)** (56.80*0.45*0.10)*2	113.60	ml	792.86	90,068.90	110.60	87,690.32	97.36%	3.00	2378.58	3%	113.60	90,068.90	100.00%	
4.11	Construcción de aceras en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31**(Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)** (50*1*0.10)*2	100.00	m2	785.31	78,531.00	84.47	66,335.14	84.47%	0.00	0.00	0.00%	84.47	66,335.14	84.47%	
4.12	Construcción de contenes en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 (Nombre actual C/ **Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)**(50*0.45*0.10)*2	100.00	ml	792.86	79,286.00	77.80	61,684.51	77.80%	0.00	0.00	0.00%	77.80	61,684.51	77.80%	
4.13	Construcción de aceras en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 (**Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye**)(266.70*1*0.10)*2	533.40	m2	785.31	418,884.35	365.54	287,062.22	68.53%	167.86	131822.14	31.47%	533.40	418,884.35	100.00%	
	Construcción de contenes en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye)** (266.70*0.45*0.10)*2	533.40	ml	792.86	422,911.52	499.30	395,875.00	93.61%	34.10	27036.53	6.39%	533.40	422,911.52	100.00%	
4.15	Construcción de aceras en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*1*0.10)*2	400.00	m2	785.31	314,124.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	
4.16	Construcción de contenes en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*0.45*0.10)*2	400.00	ml	792.86	317,144.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	
					2,818,475.79		**969,766.72**			**391,307.98**			**1,361,074.70**		
V	**HORMIGON ARMADO**														
5.01	Reconsonstruccion de Baden en la C/ Coronel Fernóndez (7.9*2.0)	15.80	m2	2,652.38	41,907.63	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	
5.02	Reconsonstruccion de Baden en la C/ El Canal (6*2.0)	12.00	m2	2,652.38	31,828.58	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	
5.03	Reconsonstruccion de Baden en la C/ El Canal próximo al colmado Raymundo (3.5*2.0)	7.00	m2	2,652.38	18,566.67	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	
					92,302.89		**0.00**			**0.00**			**0.00**		
VI	**LIMPIEZA FINAL**														
6.01	Limpieza final	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	
					15,000.00		**0.00**			**0.00**			**0.00**		

	Sub-Total General				**3,288,637.16**		**1,091,188.07**			**391,307.98**			**1,482,496.05**	
B	*GASTOS INDIRECTOS:*													
1.000	*DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. CIVIL.*			*10.000%*	328,863.72		109,118.81			39,130.80			148,249.60	
1.001	*GASTOS ADMINISTRATIVOS.*			*3.000%*	98,659.11		32,735.64			11,739.24			44,474.88	
1.002	*SEGUROS Y FIANZAS.*			*2.500%*	82,215.93		27,279.70			9,782.70			37,062.40	
1.003	*LIQUIDACIÓN Y PRESTS . LABORALES. Ley 686*			*1.000%*	32,886.37		10,911.88			3,913.08			14,824.96	
4	*CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus dependencias*			*0.100%*	3,288.64		1,091.19			391.31			1,482.50	
1.005	*ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo I)*			*18.000%*	59,195.47		19,641.39			7,043.54			26,684.93	
	Total Gastos Indirectos				**605,109.24**		**200,778.60**			**72,000.67**			**272,779.27**	
	TOTAL CUBICADO HASTA LA FECHA				**3,893,746.39**		**1,291,966.67**			**463,308.65**			**1,755,275.32**	
	TOTAL PAGADO DE CUB. 1						**1,033,573.340**						**1,291,966.67**	
	TOTAL CUBICADO CUB. 2									**370,646.92**			**463,308.65**	
	Amortizacion 20% valor cubicado				778,749.28		(258,393.33)			(92,661.73)			**92,661.73**	
	TOTAL A PAGAR DE CUB. 2												**370,646.92**	

Nota: **Los datos procesados en esta cubicacion fueron suministrado por el supervisor de dicha obra.** La presente Cubicacion se expide a total responsabilidad del Depto de Supervicion, mediante los supervisores actuantes en la misma.-

Procesada Por:

Ing. Deidania Hernández
Enc. Del Depto. De Cubicación de OP

Datos suministrados por:

Ing. Avigail Polanco G
Supervisor del AMA

Revisador por:

Sr. Cesar Puala Frias
Enc. de Supervicion

Aprobado Por:

GRUPO SERCHAS/ING.SAMUEL EUGENIO CHALAS SANTANA
Contratista

Aprobado Por:

Ing. Freddy M. Dini Lebron
Director de la Dirección de Obras Publicas Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario.
Dirección de Obras Públicas Municipal

DATOS PARA CUBICACION

Nombre del Proyecto: Construcción de aceras y Contenes

Sector: Los Libertadores, Suana Saltitopa

Ubicación: Calle puente blanco, Detrás del Supermercado La Sirena Alcarrizos

Nombre de Contratista: Samuel Cholas Grupo Cholas

Contrato No. _____

Cubicación No. 3 **Fecha:** 4/8/2022

Supervisor: Ing. Abigail Polanco G.

OBSERVACIONES:

Recibido 4/8/2022

Calle La Torre

29/7/22

Desde Calle #7 hasta La y

- Contén

L = 37.2 ML

- Acera

L = 173.3 M

A = 0.57+0.95+0.82+1.02+0.45+0.74+0.77
0.94+1.00+1.05+0.58+0.48+0.38+1.00+0.70
0.64+1.85+1.15+1.10+0.60+0.85+0.90+2.50
1.80+0.85+0.83+0.75+1.45+0.69+0.50+1.00
0.92+0.68+0.46+1.45+1.50+1.56+1.45+
1.40+1.36+1.30+1.20+1.58+1.60+1.45+1.27
1.10+0.96+0.86+0.30+0.43+0.20 = 51.94

A = 51.94/52 = 0.998 M

Total = 172.95 M^2

- Calle Resp. #6 - Desde c/ La Torre hasta c/ Los Cuernos.

* Cordón

L = 11 ML

* Acera

L = 126.70 M

A = 0.40 + 0.33 + 1.50 + 0.30 + 0.55 + 0.65 + 0.56 + 1.25 + 0.96 + 1.35 + 0.43 + 1.10 + 0.48 + 0.58 + 1.20 + 0.80 + 1.10 + 1.40 + 1.30 + 0.55 + 0.77 + 0.50 + 1.00 + 1.45 + 1.10 + 1.20 + 1.55 + 1.60 + 1.05 + 1.45 + 1.55 + 2.00 + 1.80 + 1.00 + 0.80 + 0.60 + 0.70 + 0.94 + 1.15 + 1.40

A = 40.4 / 40 = 1.01 M

Total = 127.97 M^2

- Calle Manuel - Desde c/ La Torre hasta c/ Los Cuernos.

x Conten

L = 61.30 ML

x Acera

L = 123 M

A = 0.78+0.73+0.63+0.55+0.46+0.40+0.50
0.70+0.75+0.56+0.35+1.00+1.10+1.25+
1.30+0.20+0.58+0.85+0.52+0.47+0.50+
0.18+0.70+0.76+1.10+0.95+1.05+1.55+
1.37+2.10+0.34+1.35+1.45+0.55+0.40
1.00+0.80+0.57

A = 30.4/38 = 0.80 M

Total = 98.40 M^2

- Curva Calle Los Cuernos

+ Conten

L = 18.90 ML

Calle La Toma Prot. Inicio

Puente #2

Cuna Calle Los Cuna

Calle La Torre

Predio #1

Calle Norte

Calle Las Torres entre 2da y 4

Fecha	Concepto	Valor
31/08/2022	P/R PAGO A FAVOR DE GRUPO SECHAS EIRL, CONCEPTO DE CUBICACIO N #2, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA EN LOS ALCA	363,233.98

7261

Clave Municipal No.

No. 018675

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
PROGRAMA DE INVERSION

DIA	MES	AÑO
31	08	2022

RNC: 430-04253-6
DO28BRRD00000000002440009274

0016938

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO SECHAS EIRL

RD$ *363,233.98

*** TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 98/100 ***

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

IRodriguez

FIRMA(S)

⑈018675⑈ 244122722130244000927 4⑈ 28

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
No. Comprobante .. : 2203682 P/R PAGO A FAVOR DE GRUPO SECHAS EIRL, CONCEPTO DE CUBICACION #2, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA EN LOS ALCARRIZOS, SEG+N COMUN		Estructura Clasific. 6011010100 272401	363,233.98
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE No. 2203682
FECHA 31/08/2022
SECUENCIAL: 3746

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2203681 **Etapa:** Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 18158 **RNC/CED/PAS:** 132-18981-7
BENEFICIARIO: GRUPO SECHAS EIRL
DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 **Inversión**

Detalle

P/R PAGO A FAVOR DE GRUPO SECHAS EIRL, CONCEPTO DE CUBICACION #2, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA EN LOS ALCARRIZOS, SEGÚN COMUNICACIÓN D/F 26/08/2022. ANEXO*** TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 98/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Específ.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0100	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	370,646.92
					Menos las siguientes Retenciones	
00 11 01 0100	272401	40	9992	103	MENOS 2% De: 370,646.92	(7,412.94)
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 363,233.98

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2203681
FECHA 31/08/2022
SECUENCIAL: 3745

TIPO COMPROBANTE: 2203682 **Etapa:** Devengado
CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 18158 **RNC/CED/PAS:** 132-18981-7
BENEFICIARIO: GRUPO SECHAS EIRL
DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R PAGO A FAVOR DE GRUPO SECHAS EIRL, CONCEPTO DE CUBICACION #2, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA EN LOS ALCARRIZOS, SEGÚN COMUNICACIÓN D/F 26/08/2022. ANEXO*** TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 92/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0100	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	370,646.92
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 370,646.92

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

DIRECCION ADMINISTRATIVA

26 de agosto de 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde Municipal

Vía : Dirección Financiera

De la : Dirección Administrativa

Asunto : Pago **cubicación #2**

Distinguidos Señores:

Cortésmente le estamos solicitando el pago a favor de**: Grupo Sechas E.R.L.**

Codia: Contrato No. **22/2022**. RNC: **132189817**

Monto a pagar**: RD$370,646.92 (Trescientos Setenta Mil Seiscientos Cuarenta Y Seis Pesos Con 92/100).**

Por concepto de Pago: **cubicación No.2**, para la construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes calles del sector Juana Saltitopa en los Alcarrizos.

Atentamente,

Lcda. Luisana Guzmán
Administrativa

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCION FINANCIERA
AUTORIZADO
Firma
Fecha 30/8/2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Públicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
15 de Julio 2022

Contrato No: 022-2022BIS
No. Oficio: 008-2022

Al	:	**Sr. Cristian Encamación** Alcalde del AMA
Vía	:	**Lic. Luisana Guzmán** Directora de Administrativo
Del	:	**Ing. Freddy M. Dini Lebrón** Director de Obras Publicas Municipal
Anexo	:	Fotos y Soporte Técnico.

Asunto	:	**Solicitud Pago de Cub.1**

Muy cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el pago de la **Cub.1** Correspondiente Construcción de aceras, contenes, badenes, en las calles (Peatonal Coronel Fernández, Callejón de la C/ Canal, C/ Canal, Resp.17, C/ La Torre, C/ Marisol, C/ Resp.6 y C/ Ruth Delania), del Sector (5) Juana Saltitopa 2da. Por un monto de **RD$1,033,573.34 (Un Millón Treinta y Tres Mil Quinientos Setenta y Tres con 34/100).**

El mismo a nombre de Grupo Sechas ERL. y/o Ing. Samuel Eugenio Chalas Santana, RNC **No.1-32-18981-7.**

Sin otro particular se despide:

Atentamente:

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Públicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
15 de Julio 2022

Al	:	**Sr. Cristian Encamación** Alcalde del AMA
Vía	:	**Lic. Luisana Guzmán** Directora de Administrativo
Del	:	**Ing. Freddy M. Dini Lebrón** Director de Obras Publicas Municipal
Asunto	:	Informe de inspección a nombre de Grupo Sechas, ERL.RNC-1-32-18981-7, representado por Ing. Samuel Eugenio Chalas Santana, portador de la cedula de identidad y electoral No.402-2410708-2
Anexo	:	Presupuesto autorizado, Fotos y Soporte Técnico.

Muy cortésmente, me dirijo a usted para remitirle el informe correspondiente a la correspondiente a construcción de aceras, contenes, badenes, en las calles (Peatonal Coronel Fernández, Callejón de la C/ Canal, C/ Canal, Resp.17, C/ La Torre, C/ Marisol, C/ Resp.6 y C/ Ruth Delania) del Sector (5) Juana Saltitopa 2da. Perteneciente a las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. Etapa I. estas partidas se encuentran en un 33.18%

Este informe fue suministrado, evaluado y autorizado por la parte interesadas:

Ing. Avigail Polanco G
Supervisora de Obras

GRUPO SECHAS, E.I.R.L. RNC: 132-18981-7 Santo Domingo, R.D.

Grupo Sechas y/o Samuel E. Chalas S.
Director de Obras Pública Municipal

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipal

"AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS"
(AMA)
Dirección de Obras Públicas Municipales

Contratista:	GRUPO SERCHAS/ING.SAMUEL EUGENIO CHALAS SANTANA		
Of	Construccion de aceras contenes y badenes de las calles del sector Juana Saltitopa 2da (05). Perteneciente a las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.		
Codigo:	AMA05-OP0322-P13-M		
Sector:	Juana Saltitopa 2da (05)	No. Contrato	022-2022 BIS
Cub. No.	1		
Fecha:	05 de julio 2022		

Periodo:	Junio -Julio 2022
Monto Contratado:	3,893,746.39
Monto a Ejecutar:	3,288,637.16
Monto a ejecutar mas Impuestos:	3,893,746.39
Avance Inicial:	778,749.28
Avance de Obra:	33.18%

		PRESUPUESTO CONTRATADO				CUBICACION No.1 (ACTUAL)			CUBICACION ANTERIOR			CUBCIACION ACUMALADA		
No.	PARTIDAS	Cantidad	Unidad	Costo Uni.	Valor	Cantidad	Valor	%	Cantidad	Valor	%	Cantidad	Valor	%
	ETAPA I													
I	**Preliminar**													
1.01	Valla Informativa Informativa	1.00	P.A.	13,000.00	13,000.00	1.00	13,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	13,000.00	100.00%
					13,000.00									
II	**MOVIMIENTO DE TIERRA**													
2.01	Excavación para el Peatón Coranel Fernández (13.2*1.90*0.10)	2.51	m3	315.00	790.02	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.02	Excavación para aceras para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	4.12	m3	315.00	1,297.80	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.03	Excavación para contenes para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	1.85	m3	315.00	584.01	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.04	Excavación para aceras en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	10.80	m3	315.00	3,402.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.05	Excavación para contenes en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	4.88	m3	315.00	1,536.57	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.06	Excavación para aceras en la C/Respaldo 17, desde la calle Duarte hasta el final (101.50*1*0.10)*2	20.30	m3	315.00	6,394.50	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.07	Excavación de material inservible en el callejón de la respaldo 17 (13*3*0.10)	3.90	m3	315.00	1,228.50	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.08	Excavación de material inservible en el callejón de la casa No. 4 (12.5*3*0.10)	3.75	m3	315.00	1,181.25	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.09	Excavación para aceras en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*1*0.10)*2	22.00	m3	315.00	6,930.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.1	Excavación para contenes en la en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*0.45*0.10)*2	9.90	m3	315.00	3,118.50	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%

2.11	Excavación para aceras en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 (Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye)(94.5*1*0.10)*2	18.90	m3	315.00	5,953.50	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.12	Excavación para contenes en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 (Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye)(94.50*0.45*0.10)*2	8.51	m3	315.00	2,679.08	4.04	1,271.49	47.46%	0.00	0.00	0.00%	4.04	1,271.49	47.46%
2.13	Excavación para aceras en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close (Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye),(56.80*1*0.10)*2	11.36	m3	315.00	3,578.40	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.14	Excavación para contenes en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close (Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye), (56.80*0.45*0.10)*2	5.11	m3	315.00	1,610.28	4.98	1,567.77	97.36%	0.00	0.00	0.00%	4.98	1,567.77	97.36%
,	Excavación para aceras en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 (Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final) (50*1*0.10)*2	10.00	m3	315.00	3,150.00	8.45	2,660.81	84.47%	0.00	0.00	0.00%	8.45	2,660.81	84.47%
2.16	Excavación para contenes en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 (Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)(50*0.45*0.10)*2	4.50	m3	315.00	1,417.50	3.50	1,102.82	77.80%	0.00	0.00	0.00%	3.50	1,102.82	77.80%
2.17	Excavación para aceras en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 (Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye)(266.70*1*0.10)*2	53.34	m3	315.00	16,802.10	36.55	11,514.48	68.53%	0.00	0.00	0.00%	36.55	11,514.48	68.53%
2.18	Excavación para contenes en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 (Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye) (266.70*0.45*0.10)*2	24.00	m3	315.00	7,560.95	22.47	7,077.80	93.61%	0.00	0.00	0.00%	22.47	7,077.80	93.61%
2.19	Excavación para aceras en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*1*0.10)*2	40.00	m3	315.00	12,600.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.2	Excavación para contenes en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*0.45*0.10)*2	18.00	m3	315.00	5,670.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.21	Demolición de Baden en la C/ Coronel Fernóndez (7.9*2.0)	15.80	m2	750.00	11,850.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.22	Demolición de Baden en la C/ El Canal (6*2.0)	12.00	m2	750.00	9,000.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
2.23	Demolición de Baden en la C/ El Canal próximo al colmado Raymundo (3.5*2.0)	7.00	m2	750.00	5,250.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
					113,584.95									
	RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION													
.1	Relleno en caliche para Peatón Coronel Fernández (13.2*1.90*0.10)	2.51	m3	525.00	1,316.70	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.02	Relleno en caliche para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	4.12	m3	525.00	2,163.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.03	Telford para contenes para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	1.85	m3	1,703.67	3,158.60	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.04	Relleno en caliche para aceras en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	10.80	m3	525.00	5,670.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.05	Telford para contenes en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	4.88	m3	1,703.67	8,310.50	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.06	Relleno en caliche para aceras en la C/Respaldo 17, desde la calle Duarte hasta el final (101.50*1*0.10)*2	20.30	m3	525.00	10,657.50	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.07	Relleno en caliche para el callejón de la respaldo 17 (13*3*0.10)	3.90	m3	525.00	2,047.50	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%

GRUPO SECHAS, E.I.R.L.
RNC: 132-18907-1
Santo Domingo, R.D.

3.08	Relleno en caliche para el callejón de la casa No. 4 (12.5*3*0.10)	3.75	m3	525.00	1,968.75	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.09	Relleno en caliche para aceras en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*1*0.10)*2	22.00	m3	525.00	11,550.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.1	Telford para contenes en la en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*0.45*0.10)*2	9.90	m3	1,703.67	16,866.33	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.11	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye)** (94.5*1*0.10)*2	18.90	m3	525.00	9,922.50	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.12	Telford para contenes en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye)** (94.50*0.45*0.10)*2	8.51	m3	1,703.67	14,489.71	4.04	6,876.82	47.46%	0.00	0.00	0.00%	4.04	6,876.82	47.46%
	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye)**(56.80*1*0.10)*2	11.36	m3	525.00	5,964.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
3.14	Telford para contenes en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye),** (56.80*0.45*0.10)*2	5.11	m3	1,703.67	8,709.16	4.98	8,479.24	97.36%	0.00	0.00	0.00%	4.98	8,479.24	97.36%
3.15	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 **(Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)**(50*1*0.10)*2	10.00	m3	525.00	5,250.00	8.45	4,434.68	84.47%	0.00	0.00	0.00%	8.45	4,434.68	84.47%
3.16	Telford para contenes en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 **(Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)** (50*0.45*0.10)*2	4.50	m3	1,703.67	7,666.52	3.50	5,964.55	77.80%	0.00	0.00	0.00%	3.50	5,964.55	77.80%
3.17	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye)** (266.70*1*0.10)*2	53.34	m3	525.00	28,003.50	36.55	19,190.80	68.53%	0.00	0.00	0.00%	36.55	19,190.80	68.53%
3.18	Telford para contenes en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye),** (266.70*0.45*0.10)*2	24.00	m3	1,703.67	40,893.19	22.47	38,280.12	93.61%	0.00	0.00	0.00%	22.47	38,280.12	93.61%
3.19	Relleno en caliche para aceras en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*1*0.10)*2	40.00	m3	525.00	21,000.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
	Telford para contenes en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*0.45*0.10)*2	18.00	m3	1,703.67	30,666.06	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
					236,273.53									
IV	**HORMIGON SIMPLE**													
4.01	Construcción de contenes para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	41.20	ml	792.86	32,665.83	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
4.02	Construcción de aceras en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	108.00	m2	785.31	84,813.48	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
4.03	Construcción de contenes en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/peru (54.20*1*0.10)*2	108.40	ml	792.86	85,946.02	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%

GRUPO SECHAS, E.I.R.L. RNC: 132-18981-7 Santo Domingo, R.D.

4.04	Construcción de aceras en la C/Respaldo 17, desde la calle Duarte hasta el final (101.50*1*0.10)*2	203.00	m2	785.31	159,417.93	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
4.05	Construcción de aceras en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*1*0.10)*2	220.00	m2	785.31	172,768.20	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
4.06	Construcción de contenes en la en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*0.45*0.10)*2	220.00	ml	792.86	174,429.20	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
4.07	Construcción de aceras en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye, desde la C/ La Torre hasta los Cuernos),** (94.5*1*0.10)*2	189.00	m2	785.31	148,423.59	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
4.08	Construcción de contenes en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 **(Nombre actual C/ Marisol lado izquierdo de la Ye, desde la C/ La Torre hasta los Cuernos),** (94.50*0.45*0.10)*2	189.00	ml	792.86	149,850.54	89.70	71,119.54	47.46%	0.00	0.00	0.00%	89.70	71,119.54	47.46%
4.09	Construcción de aceras en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye, desde la C/La Torre hasta C/ Los Cuernos)**(56.80*1*0.10)*2	113.60	m2	785.31	89,211.22	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
4.1	Construcción de contenes en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmadfo primavera close **(Nombre actual C/ Respaldo 6 lado derecho de la Ye)** (56.80*0.45*0.10)*2	113.60	ml	792.86	90,068.90	110.60	87,690.32	97.36%	0.00	0.00	0.00%	110.60	87,690.32	97.36%
4.11	Construcción de aceras en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31**(Nombre actual C/ Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)** (50*1*0.10)*2	100.00	m2	785.31	78,531.00	84.47	66,335.14	84.47%	0.00	0.00	0.00%	84.47	66,335.14	84.47%
4.12	Construcción de contenes en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 (Nombre actual C/ **Ruth Delania desde la C/ La Torre hasta el final)**(50*0.45*0.10)*2	100.00	ml	792.86	79,286.00	77.80	61,684.51	77.80%	0.00	0.00	0.00%	77.80	61,684.51	77.80%
4.13	Construcción de aceras en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye)**(266.70*1*0.10)*2	533.40	m2	785.31	418,884.35	365.54	287,062.22	68.53%	0.00	0.00	0.00%	365.54	287,062.22	68.53%
4.14	Construcción de contenes en la C/19, desde C/ Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 **(Nombre actual C/ La Torre desde la calle 7 hasta la Ye)** (266.70*0.45*0.10)*2	533.40	ml	792.86	422,911.52	499.30	395,875.00	93.61%	0.00	0.00	0.00%	499.30	395,875.00	93.61%
4.15	Construcción de aceras en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*1*0.10)*2	400.00	m2	785.31	314,124.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
4.16	Construcción de contenes en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*0.45*0.10)*2	400.00	ml	792.86	317,144.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
					2,818,475.79									
V	**HORMIGON ARMADO**													
5.01	Reconsonstruccion de Baden en la C/ Coronel Fernández (7.9*2.0)	15.80	m2	2,652.38	41,907.63	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
5.02	Reconsonstruccion de Baden en la C/ El Canal (6*2.0)	12.00	m2	2,652.38	31,828.58	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
5.03	Reconsonstruccion de Baden en la C/ El Canal próximo al colmado Raymundo (3.5*2.0)	7.00	m2	2,652.38	18,566.67	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
					92,302.89									

GRUPO SEMAS, E.I.R.L. RNC: 132-18896-7 Santo Domingo, R.D.

VII	**LIMPIEZA FINAL**													
6.01	Limpieza final	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
					15,000.00									
	Sub-Total General				**3,288,637.16**		**1,091,188.07**						**1,091,188.07**	
B	*GASTOS INDIRECTOS:*													
1.000	*DIRECCION TECNICA Y RESP. CIVIL.*			*10.000%*	328,863.72		109,118.81						109,118.81	
1.001	*GASTOS ADMINISTRATIVOS.*			*3.000%*	98,659.11		32,735.64						32,735.64	
1.002	*SEGUROS Y FIANZAS.*			*2.500%*	82,215.93		27,279.70						27,279.70	
1.003	*LIQUIDACION Y PRESTS . LABORALES. Ley 686*			*1.000%*	32,886.37		10,911.88						10,911.88	
1.004	*CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus dependencias*			*0.100%*	3,286.64		1,091.19						1,091.19	
1.005	*ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo I)*			*18.000%*	59,195.47		19,641.39						19,641.39	
	Total Gastos Indirectos				**605,109.24**		**200,778.60**						**200,778.60**	
	TOTAL CUBICADO HASTA LA FECHA				**3,893,746.39**		**1,291,966.675**						**1,291,966.67**	
	Amortizacion 20% valor cubicado												**258,393.33**	
	TOTAL A PAGAR DE CUB. 1												**1,033,573.34**	

Nota: **Los datos procesados en esta cubicacion fueron suministrado por el supervisor de dicha obra.** La presente Cubicacion se expide a total responsabilidad del Depto de Supervicion, mediante los supervisores actuantes en la misma.-

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA REVISADO

GRUPO SECHAS, E.I.R.L. RNC: 132-18981-7 Santo Domingo, R.D.

SECS

Procesada Por:

Ing. Deldania Hernández
Enc. Del Depto. de Cubicación de OP

Datos suministrados por:

Ing. Avipail Polanco G
Supervisor del AMA

Revisado por:

Sr. César Puala Fulas
Enc. de Supervision

Aprobado Por:

GRUPO SERCHAS/ING.SAMUEL EUGENIO CHALAS SANTANA
Contratista

GRUPO SECHAS, E.I.R.L.
RNC. 132-18981-2
Santo Domingo, R.D.

Aprobado Por:

Ing. Freddy M. Dini Lebron
Director de la Dirección de Obras Publicas Municipal

DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0222952597485**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **GRUPO SECHAS EIRL,** RNC No. **132189817**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN** , Administración Local **ADM LOCAL LA FERIA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• **ITBIS**	• **ACTIVOS IMPONIBLES**
• **IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES**	

DEPARTAMENTO DE RENTAS REVISADO

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los **veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil veintidos (2022).**

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (**30**) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

Código de firma: Q1HX-T3JZ-AGE1-6565-3638-5354
sha1: 1oY7ZKwqAEK3AMvA5HxbSBudUXg=
DGII - OFICINA VIRTUAL
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
Q1HX-T3JZ-AGE1-6565-3638-5354

Verifique la legitimidad de la presente certificación en **http://www.dgii.gov.do/verifica** o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

"DESPACHO DEL ALCALDE"

18 de mayo del 2022.

Al : **Ing. Freddy M. Dini Lebrón**
Director de Obras Públicas.

Asunto : Aprobación.

Anexo : Copia de la solicitud.

Distinguido Ing. :

Luego de un cordial saludo, presente es para remitir y aprobar la solicitud de su departamento referente al GRUPO SECHAS EIRL, bajo el contrato 22-2022BIS, mediante el proceso CCC-CP-2022-0007, para la construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes calles del sector (5) Juana Saltitopa 2da.

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO

Sin otro particular se despide.

Cordialmente:

Sr. CRISTIAN ENCARNACION
Alcalde Municipal de Los Alcarrizos.

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

Dirección de Obras Públicas Municipal.

16 de mayo 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde del AMA.

Del : **Ing. Freddy M. Dini Lebrón**.
Director de Obras Públicas Municipal

Asunto : Informe

Después de extenderle un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de comunicarle que en fecha 11mayo del 2022, fue adjudicado el GRUPO SECHAS EIRL, bajo el número de contrato 22-2022BIS, mediante el proceso CCC-CP-2022-0007, para la construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes calles del Sector (5) Juana Saltitopa 2da. En la licitación de las diferentes calles del Sector Juana Saltitopa 2da., existen calles que no corresponde con los nombres que fueron contratado, debido a que al momento de los levantamientos para fines de presupuesto los nombres suministrado por los comunitarios no eran los reales, de dichas calles, debido a esta situación se procederá a colocar los nombres correspondiente a tales calles.
Las calles actuales son: C/La Torre, C/ Marisol, C/Resp.6, y la C/Ruth Delania, anterior eran la calle 19.

Sin otro particular se despide:

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director De Obras Pública Municipal









F255



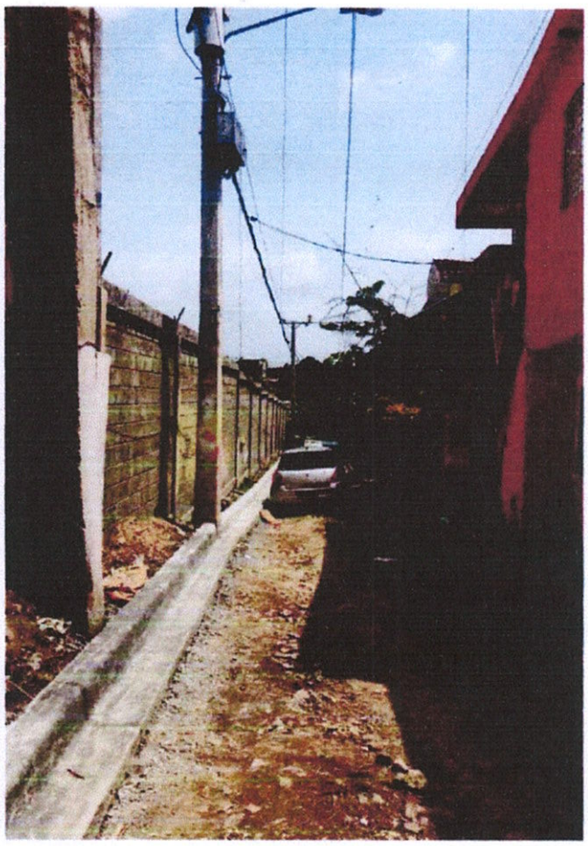

Calle [illegible]e #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

4 de Julio del 2022

"DESPACHO DEL ALCALDE"

A : **Ing. Freddy Dini Lebrón.**
Director de Obras Públicas.

Asunto : **Autorización.**

Luego de extenderle un cordial saludo, por este medio me permito remitirle la autorización a realizar el pago de las partidas correspondientes a (Demoliciones & Badenes) en las cubicaciones, cumpliendo con el pliego de condiciones, correspondientes a las licitaciones realizadas por esta institución con el presupuesto de la Liga Municipal Dominicana.

NO. DE REFERENCIA	SECTOR
AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2022-0003	Sector La Esmeralda.
AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2022-0004	Sector Villa Progreso.
AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2022-0005	Residencial Las Mercedes, Bloque C.
AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2022-0007	Sector Juana Saltitopa.

Sin otro particular y espera de sus buenos oficios le saluda.

Cordialmente:

CRISTIAN ENCARNACION
Alcalde Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS"
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNCIPALES

Al construir las calles de nuestro municipio Los Alcarrizos las pendientes transversales y longitudinales son de vital importancia para la conducción de las aguas pluviales a través de contenes, aceras, badenes e imbornales, ademas de garantizar la capacidad de conducción y escorrentía de las aguas que se acumulan en la calzada durante los tiempos de lluvias.

Las aceras son las superficies que se construyen con el objetivo de facilitar la movilidad de los peatones en las zonas urbanas, estas además de las obras de arte (contenes, badenes e imbornales) que también son fundamentales para garantizar mayor durabilidad y facilidad de las mismas.

Es por esto que luego de una licitación en la que se ha incluido badenes, relleno, Telford y demoliciones el **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos** no se encuentra en capacidad econonomica de pagar fuera de la misma esos elementos mencionados anteriormente, seria contradictorio para la cámara de cuenta al momento de una auditoria encontrar un proceso licitado dos veces y del mismo sector.

A pesar de que la Liga Municipal nos habia mandado una ficha técnica para este proceso, nosotros, es decir, El Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos tenemos programado el presupuesto del año entendemos que para mayor factibilidad es necesario que esos items fueran incluidos en el proyecto nosotros como institucion y para mayor transparenciaa en los fondos asignados a traves de la liga municipal dominicana debemos pagar las cubicaciones con los mismos, tal cual se haya hecho en el proceso de licitacion en el cual se encuentran incluidas estas partidas .

Sin otro particular se despide:

Ing. Freddy Manuel Dini Lebrón

Dir. De Obras Públicas Municipales
Del Municipio de los Alcarrizos

Fecha	Concepto	Valor
19/07/2022	P/R PAGO A FAVOR DE GRUPO SECHAS EIRL, POR CONCEPTO CUBICACI ON #1, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA E	1,012,901.87

7281

Clave Municipal No.

No. 018616

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
PROGRAMA DE INVERSION

DIA	MES	AÑO
19	07	2022

0018886

RNC: 430-04253-6
DO28BRRD00000000002440009274

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO SECHAS EIRL

RD$ *1,012,901.87

*** UN MILLON DOCE MIL NOVECIENTOS UNO CON 87/100 ***

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

I Rodriguez

FIRMA(S)

"018616" 211112727131:0244000927 4" 28

Cap. No. _____ *Sub-Objeto* _____ *Fondo* _____ *Comprobante No.* _____ *Fecha* _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
No. Comprobante .. : 2202925 P/R PAGO A FAVOR DE GRUPO SECHAS EIRL, POR CONCEPTO CUBICACION #1, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA EN LOS ALCARRIZOS, C		Estructura Clasific. 0011010100 272401	1,012,901.87
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2202925
FECHA 19/07/2022
SECUENCIAL: 2966

TIPO COMPROBANTE: 2202924 **Etapa:** Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 18158 **RNC/CED/PAS:** 132-18981-7
BENEFICIARIO: GRUPO SECHAS EIRL
DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 **Inversión**

Detalle

P/R PAGO A FAVOR DE GRUPO SECHAS EIRL, POR CONCEPTO CUBICACION #1, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA EN LOS ALCARRIZOS, CONTRATO NO. 22/2022. ANEXO***UN MILLON DOCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON 87/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0100	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,033,573.34
					Menos las siguientes Retenciones	
00 11 01 0100	272401	40	9992	103	MENOS 2% De: 1,033,573.34	(20,671.47)
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 1,012,901.87

CK No.	Monto	Fecha

GRUPO SECHAS, E.I.R.L. RNC: 132-18981-7

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2202924
FECHA 19/07/2022
SECUENCIAL: 2965

TIPO COMPROBANTE: 2202925 **Etapa:** Devengado
CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 18158 **RNC/CED/PAS:** 132-18981-7
BENEFICIARIO: GRUPO SECHAS EIRL
DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R PAGO A FAVOR DE GRUPO SECHAS EIRL, POR CONCEPTO CUBICACION #1, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA EN LOS ALCARRIZOS, CONTRATO NO. 22/2022. ANEXO***UN MILLON TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 34/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0100	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,033,573.34
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 1,033,573.34

CK No.	Monto	Fecha

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

DIRECCION ADMINISTRATIVA

18 de julio de 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde Municipal

Vía : Dirección Financiera

De la : Dirección Administrativa

Asunto : Pago **cubicación #1**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCION FINANCIERA
AUTORIZADO
Firma
Fecha 19/7/2022

Distinguidos Señores:

Cortésmente le estamos solicitando el pago a favor de**: Grupo Sechas E.R.L.**

Codia: Contrato No. **22/2022**. RNC: **132189817**

Monto a pagar**: RD$1,033,573.34 (Un Millón Treinta Y Tres Mil Quinientos Setenta Y Tres Pesos Con 34/100).**

Por concepto de Pago: **cubicación No.1**, para la construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes calles del sector Juana Saltitopa en los Alcarrizos.

Atentamente,

Lcda. Luisana Guzmán
Administrativa

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo R.D.

DEPARTAMENTO LEGAL
REVISADO

Fecha	Concepto	Valor
26/05/2022	P/R: PAGO A FAVOR DE GRUPO SECHAS EIRL, POR CONCEPTO DE AVAN CE INICIAL DEL 20%, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA EN	763,135.98

7281

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
PROGRAMA DE INVERSION

No. 018527

DIA	MES	ANO
26	05	2022

0016799

RNC 430-04294-6
DO28BRRD00000000002440009274

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO SECHAS EIRL **RD$** *763,135.98

*** SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 98/100 ***

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈018527⑈ 244122722713:0244000927 4⑈ 28

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
No. Comprobante ... : 2201824 P/R: PAGO A FAVOR DE GRUPO SECHAS EIRL, POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL DEL 20%, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA EN LOS ALCARRIZOS, SE		Estructura Clasific. 0011010100 272401	763,135.98

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta

TOTAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE No. 2201824
FECHA 26/05/2022
SECUENCIAL: 1846

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2201823 — Etapa: Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original — Comp. que modifica:
CODIGO BENEFICIARIO: 18158 — RNC/CED/PAS: 132-18981-7
BENEFICIARIO: GRUPO SECHAS EIRL
DIRECCION: — TELEFONO:
CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R: PAGO A FAVOR DE GRUPO SECHAS EIRL, POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL DEL 20%, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN COMUNICACION D/F: 25/05/2022. ANEXO***SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 98/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0100	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	778,710.18
					Menos las siguientes Retenciones	
00 11 01 0100	272401	40	9992	103	MENOS 2% De: 778,710.18	(15,574.20)
					**** Debajo de esta linea no hay nada escrito ****	
					Total RD$	763,135.98

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Telefono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE No. 2201823
FECHA 26/05/2022
SECUENCIAL: 1845

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2201824 — Etapa: Devengado
CLASE DOCUMENTO: Original — Comp. que modifica:
CODIGO BENEFICIARIO: 18158 — RNC/CED/PAS: 132-18981-7
BENEFICIARIO: GRUPO SECHAS E/RL
DIRECCION: — TELEFONO:
CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R. PAGO A FAVOR DE GRUPO SECHAS EIRL, POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL DEL 20%, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN COMUNICACION D/F: 25/05/2022. ANEXO***SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 18/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0100	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	778,710.18
					**** Debajo de esta linea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 778,710.18

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Búsqueda de contribuyente

Por RNC/Cédula

Por Nombre/Razón Social

Listado de todos los RNC

Parámetros de búsqueda

RNC/Cédula

Buscar

Resultados de la búqueda

Cédula/RNC	132-18981-7
Nombre/Razón Social	GRUPO SECHAS EIRL
Nombre Comercial	GRUPO SECHAS
Categoría	
Régimen de pagos	NORMAL
Estado	ACTIVO
Actividad Economica	OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. (INCL. LOS TRABAJOS GRALES. DE CONSTRUC. PARA LA MINERÍA Y LA INDUSTRIA, DE CENTRALES ELÉCTRICAS
Administracion Local	ADM LOCAL LA FERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE LOS ALCARRIZOS
GESTIÓN 2020-2024

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

0110

DIRECCION ADMINISTRATIVA

25 de mayo de 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde Municipal

Vía : Dirección Financiera

De la : Dirección Administrativa

Asunto : Pago Avance Inicial **del 20%**

Distinguidos Señores:

Cortésmente le estamos solicitando el pago a favor de**: Grupo Sechas E.R.L.**

Codia: Contrato No. **22/2022**. RNC: **132189817**

Monto a pagar**: RD$778,710.18 (Setecientos Setenta Y Ocho Mil Setecientos Diez Pesos Con 18/100).**

Por concepto de Pago de: Avance inicial del **20%,** para la construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes calles del sector Juana Saltitopa en los Alcarrizos.

Atentamente,

Lcda. Luisana Guzmán
Administrativa

CONTRATO DE OBRA DETERMINADA

AÑO- **2022**
CONTRATO NO **22-2022**
No. Presupuesto. **AMA05-OP0322OP0322-P13-M**

ENTRE:EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS, RNC [No.430-04253-6] institución del Estado Dominicano creada en virtud de **La Ley 176-07** sobre el Distrito Nacional y los municipios, de fecha 17/07/2007, con domicilio y asiento social en **C/ Duarte No. 359,** Sector Landia, Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, debidamente representado por su Alcalde **CRISTIAN ENCARNACION**, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0582396-7, domiciliado y residente en éste municipioquien para los fines del presente Contrato, se denominará **LA ENTIDAD CONTRATANTE.** La compañia **GRUPO SECHAS E.R.L, RNC, 1-32-18981-7,** con domicilio Social en la calle Portal, No.57, Átala, D .N, Santo domingo, debidamente representado por el **ING.SAMUEL EUGENIO CHALAS SANTANA,** dominicano, mayor de edad, Soltero, titular de la cedula de identidad y electoral NO- 402-2410708-2, domiciliado(a) y residente en la calle Portal,No.57, Atala,D.N, Santo domingo. Quien para los fines del presente Contrato, se denominará **"EL CONTRATISTA".** Para referirse a ambos se les denominará **LAS PARTES.**

PREÁMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la COMPARACION DE PRECIOS.

POR CUANTO: El Reglamento No.543-12, que regula la Ley 340-06, establece en el Art.58 que "En caso de contrataciones de obras por montos inferiores al umbral mínimo establecido para la comparación de precios, deberá utilizarse el procedimiento por comparación de precios."

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 1, establece además que: *Comparación de Precios es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores.*

POR CUANTO: El Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selección del Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratación.

POR CUANTO: El Órgano Rector, emitió la resolución No.01-2021, mediante la cual aprobó los umbrales para este año, siendo el umbral para la Comparación de Precios un monto que va desde la suma de RD$98,574,934.00 hasta un monto de RD$394,299,732.00 para la contratación de obras y tomando en cuenta lo dispuesto por el Art.58 del reglamento 543-12.

POR CUANTO: El monto al cual asciende la presente obra está por debajo del umbral tope.-

POR CUANTO: En fecha Trece (13) de Abril del año **2022**, el **AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, procedió a hacer una convocatoria amplia a los proveedores inscritos en el registro de proveedores del Estado, en el portal transaccional del sistema nacional de contrataciones públicas de la República Dominicana.

POR CUANTO: Que el día Nueve (9) Mayo del año 2022, fue adjudicada la Obra, a través del portal del Órgano Rector y que además cumplió con las especificaciones del pliego de condiciones. Contrato de Ejecución de Obra: **PARA AMA-CCC-CP-20222-0007, CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADENES DE LA CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA 2DA, PERTENECIENTE A LAS ACERAS, CONTENES BADENES, RELLENOS, ALCANTARILLADO, IMPRIMACION, SEÑALIZACION DE LAS CALLES ,PLAN PRO-ASFALTO,DE ESTE MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS. POR LO TANTO,** y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato.

ARTÍCULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES: Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que expresa a continuación: **Certificado de recepción definitiva**: El o los certificados expedidos por el supervisor a **EL CONTRATISTA** al final del o de los periodos de garantía, en el que se declare que **EL CONTRATISTA** ha cumplido sus obligaciones contractuales. **Contratista**: Nombre de la persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutará el objeto del Contrato. **Contrato**: El presente documento **Coordinador**: Persona designada como tal por **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** para realizar las funciones de coordinación de todas las actividades relacionadas con la Obra y que tengan injerencia en la ejecución del Contrato. **Desglose de precios unitarios**: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado. **Emplazamiento**: Los terrenos proporcionados por **AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** en que deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamiento. **Entidad Contratante**: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS, Instalación:** Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporación a la Obra. **Lista de precios**: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que **EL CONTRATISTA** presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del Contrato de precio unitario. **Monto del Contrato**: El importe señalado en el Contrato. **Obras**: Las obras que deban realizarse, con carácter temporal o permanente, con arreglo al Contrato. **Período de Garantía**: El período estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha de aprobación provisional, durante el cual **EL CONTRATISTA** se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las indicaciones del supervisor. **Planos detallados**: Los planos proporcionados por **EL CONTRATISTA** de acuerdo a la solicitud de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** y aprobados por la Supervisión para la ejecución de las obras. **Plazos:** Los plazos del Contrato que empezará a contar a partir del día siguiente a la fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el último día del plazo coincidiere con un día festivo, el plazo expirara al final del día laborable siguiente al último día de plazo. **Presupuesto Detallado**: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio unitario correspondiente. **Representante del Supervisor**: Cualquier persona física o jurídica designada como tal con arreglo al Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el cumplimiento de las funciones que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante, toda referencia que se haga al primero se entenderá hecha al segundo. **Sub-Contratista**: Persona natural o jurídica, o asociación de estas, la cual celebra Contrato directamente con **EL CONTRATISTA**, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecución de la obra. **Supervisor**: Persona natural o jurídica de Derecho Público, competente, designada por **(AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS),** responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el diseño, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construcción del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien **(el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS),** puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al Contrato. **Especificaciones Técnicas:** Condiciones exigidas por **(el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS),** para la realización de las Obras.

ARTÍCULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO: Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo. a) El Contrato propiamente dicho., b)Pliegos de Condiciones Especificas., c)Especificaciones Técnicas y de Construcción., d)Cálculos Estructurales., e)Planos Aprobados por el Ayuntamiento correspondiente. f)Presupuesto., g)Planes de Manejo Ambiental., h)Cronograma de Ejecución de Obras., i)Garantías .,y J)Documentos ofertados ,a saber: Póliza de fianza ., Fianza de fiel cumplimiento o ejecución ,Informe de ficha técnica., Informe final., Acta de comprobación con traslado de notario., Registro de participante., oferta económica., certificación de impuestos internos., fianza de licitación o mantenimiento de oferta., presupuesto., Presentación de oferta., Registro de proveedor del estado., Plan de trabajo., Equipos del oferente., certificación de impuestos internos.,

ARTÍCULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO:EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantías de hecho y de derecho, de acuerdo con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demàs anexos que forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a continuación, **CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADENES DE LA CALLES DEL SECTOR JUANA SALTITOPA 2DA, PERTENECIENTE A LAS ACERAS, CONTENES BADENES, RELLENOS, ALCANTARILLADO, IMPRIMACION, SEÑALIZACION DE LAS CALLES ,PLAN PRO-ASFALTO,DE ESTE MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS. EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programación general acordada y establecida previamente entre **LAS PARTES** (Cronograma de Ejecución de Obra), la cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato.

ARTÍCULO 4.- MONTO DEL CONTRATO: **LAS PARTES** convienen que el monto total a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma de **(RD$3, 893,550.92) TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 92/100 PESOS CON CENTAVOS MONEDA LEGAL NACIONAL,** En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan Las partidas, sub-partidas y el costo general de la Obra.

ARTÍCULO 5.- FORMA DE PAGO: Los pagos se harán de la siguiente manera: Un primer pago o anticipo correspondiente al 20% del valor total de la obra, cuya suma tiene un valor de **(RD$ (778,710.18) SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ CON 18 /100 CENTAVOS MONEDA LEGAL NACIONAL,** Este pago se hara después de la firma del contrato .. EL **CONTRATISTA** utilizara el Anticipo únicamente para operaciones relacionada con la ejecución de la obra, la suma restante será pagada en pagos parciales a el **CONTRATISTA**, mediante cubicaciones periódicas por obra realizada y certificada por la supervisión., El monto de la primera cubicación realizada por el **CONTRATISTA** ,deberá exceder o por lo menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo o Avance Inicial., Podrán cubicarse Obras adicionales elaboradas como ordenes de Cambio , y serán pagadas en la medida en que sean ejecutadas ,previo acuerdo de precios entre **LAS PARTES**., Estas Obras adicionales serán regidas por las condiciones de este contrato a menos que sea acordado de manera diferente entre las **PARTES**.

ARTÍCULO 6.- TIEMPO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a más tardar **CINCO (05)** días después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Artículo **05**, y deberá entregarla totalmente terminada y a satisfacción de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** en un plazo no mayor de **SESENTA] (60)** días calendario, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato. **EL CONTRATISTA** deberá entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la Ruta Crítica de Ejecución de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecución establecido.

ARTÍCULO 7.- COMPENSACIÓN POR DEMORA: Si **EL CONTRATISTA** no entrega la Obra en el plazo convenido en el Artículo 7 de este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, **EL CONTRATISTA** adeudará a **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** como justa indemnización por daños y perjuicios, una compensación correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para la terminación del Contrato. Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de la Obra, y serán descontadas del pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a **EL CONTRATISTA**. El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios, no exonerará a **EL CONTRATISTA** de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto **EL CONTRATISTA** declara que queda constituido en mora por el sólo vencimiento del plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

ARTÍCULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO: Ni el **AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** ni **EL CONTRATISTA** serán responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situación que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, Huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: a) Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte., b) Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. c) Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato. La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, **EL CONTRATISTA** no concluye sus labores en el plazo establecido, **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** extenderá el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual **EL CONTRATISTA** no pudo cumplir, debido únicamente a esta causa. **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago o los

pagos establecidos en el presente Contrato durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendrá derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Si **EL CONTRATISTA** dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido dentro del período especificado, se considerará que ha renunciado a su derecho en relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS: Queda convenido que **EL CONTRATISTA** no tendrá derecho a reclamar incrementos de precios durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra.

ARTÍCULO 10.- SUPERVISIÓN: La Supervisión representará a **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** y será intermediaria entre ésta y **EL CONTRATISTA**, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato. **EL CONTRATISTA** permitirá que **[AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS]** o su representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTÍCULO 11.- NO RELACIÓN LABORAL: LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República Dominicana. **EL CONTRATISTA** acuerda, por este medio, liberar a **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** de toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecución del presente Contrato.

ARTÍCULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA: En un plazo de quince (15) días después de constituirse la Garantía de Fiel Cumplimiento que dispone el Artículo [18] **EL CONTRATISTA** suministrará a **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** y al Supervisor, un ejemplar en copia dura y otro electrónico de los planos elaborados para la ejecución de El Contrato, así como las Especificaciones Técnicas definitivas, presupuesto y otros documentos de El Contrato. En el momento de expedirse el Certificado de Garantía, o en el momento de la recepción definitiva, **EL CONTRATISTA** suministrará al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** y al Supervisor todos los planos, en copia dura y electrónica, como construido (**As Built**) y cualquier otro documento requerido por **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** y El Supervisor.

ARTÍCULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA ejecutará y concluirá las Obras y subsanará cualquier deficiencia de las mismas identificadas por **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** con el cuidado y la diligencia debidos y en Riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato. **El CONTRATISTA** será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de la obra, respondiendo por los errores de interpretación incurridos durante la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva por parte de la Entidad Contratante. **EL CONTRATISTA** se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando **EL CONTRATISTA** considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan El Contrato, deberá notificarlo a El Supervisor en un plazo de treinta (30) días a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecución de la orden administrativa no se suspenderá como consecuencia de dicha notificación. **EL CONTRATISTA,** ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecución de tales trabajos, en este último caso, **EL CONTRATISTA** quedará exento de responsabilidad. Asimismo, **EL CONTRATISTA** será responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta. **EL CONTRATISTA** respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en el Estado Dominicano. Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institución privada o pública, para la realización de los trabajos de construcción y ejecución de El Proyecto, cuya obtención sea usualmente responsabilidad de un contratista general, deberán ser obtenidas por **EL CONTRATISTA**.

ARTÍCULO 14.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA dirigirá personalmente las Obras o nombrará a un representante suyo para que lo haga. El representante de **EL CONTRATISTA** tendrá plena autoridad para adoptar cualquier decisión que sea necesaria para la ejecución de las Obras, para recibir y llevar a cabo órdenes administrativas. En cualquier caso, será responsabilidad de **EL**

CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y según el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas.

ARTÍCULO 15.- APROBACIÓN DEL PERSONAL: La aceptación de la Oferta por parte de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** se considera como acuerdo con el personal propuesto. Con relación a cualquier otro personal de **EL CONTRATISTA** deberá someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** para su revisión y aprobación. Si **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** no lo objeta dentro de los primeros diez (10) días de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestión ha sido aprobado.

ARTÍCULO 16.- REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PERSONAL: EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa autorización de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** la cual no será negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de **EL CONTRATISTA** sea necesario el reemplazo de cualquier personal, **EL CONTRATISTA** se compromete a reemplazarlo por una persona con semejantes aptitudes y experiencia. **EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo. **PÁRRAFO: EL CONTRATISTA** deberá entregar a El **Supervisor** del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** un listado con cada una de las personas que trabajarán en el periodo de construcción acordado. Este personal deberá estar debidamente identificado como empleado de **EL CONTRATISTA**, y dicha identificación deberá considerar los siguientes datos personales. a) Nombre completo., b) Cédula de Identidad Personal, .c) Cargo o responsabilidad., d) Dirección. ,e) Teléfono .Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTÍCULO 17.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de las Obras como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y molestias a personas y Propiedades resultantes de contaminación, ruido y otros derivados de sus operaciones. **EL CONTRATISTA** se asegurará de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al Terreno durante el periodo del Contrato estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley. La seguridad del área de la Obra durante el periodo de construcción es responsabilidad de **EL CONTRATISTA**. Es responsabilidad de **EL CONTRATISTA** asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia relacionadas con el público y la seguridad de la construcción, así como obedecer todas las regulaciones establecidas por **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** Es obligación aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la Obra y/o ejecución de trabajos: a)Uso de casco de seguridad., b)Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura., c)Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de protección., d)Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores. ,e) Uso de andamios seguros, f) Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo. Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberán cumplir completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** cooperará en lo concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se permitirán menores en los lugares de trabajo en ningún momento. El Supervisor de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** podrá expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas. **EL CONTRATISTA** cumplirá en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construcción.

ARTÍCULO 18.- GARANTÍA DE ANTICIPO: Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, **EL CONTRATISTA** deberá proporcionar una garantía del mismo, constituyendo una póliza de seguro de fidelidad a entera satisfacción de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** por un valor equivalente al monto del avance inicial. La presente garantía se reducirá automáticamente y en la misma proporción en que el anticipo se impute a los abonos, y permanecerá en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el Contrato hasta que ***AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS*** haya recibido del Contratista el reembolso total de ese monto.

ARTÍCULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCIÓN DE CONTRATO: EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposición de la Obra, así como también, por la provisión de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra necesarios para tales fines. Si en cualquier momento o en el curso de la realización de la Obra surgiera o se presentara algún error de disposición, dimensiones o alineación de alguna parte de la Obra, EL CONTRATISTA,

a requerimiento de ***AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS*** o la Supervisión, deberá, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfacción.

ARTÍCULO 20.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato **EL CONTRATISTA** hace formal entrega de una garantía bancaria o una póliza (No.2-1206-9180).De la Compañía de Seguro APS, por un valor del 4% del monto de RD$(,155,749.86) de seguros a favor de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 111 y 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha treinta (30) de agosto del dos mil siete (2007), por un valor equivalente al Cuatro por ciento (04%) del monto del Contrato. (cuya póliza para este caso no es exigible de acuerdo al artículo 118 de reglamento 543-12 que establece que las Adjudicaciones que estén por debajo de Diez mil dólares) **PARRAFO I**. Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan a **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la ejecución de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTÍCULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL: EL CONTRATISTA será el único responsable por los daños y perjuicios causados a las personas que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, así como también, asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos deberá presentar para la suscripción del presente Contrato la póliza de responsabilidad civil general, correspondiente.**EL CONTRATISTA** mantendrá a **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamación, compensación, pérdidas o Gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por **EL CONTRATISTA**. Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destrucción de la propiedad física. **EL CONTRATISTA** obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo que **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** esté indemnizada.

SEC3

ARTÍCULO 22.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: Al finalizar los trabajos, **EL CONTRATISTA** deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas por él a satisfacción del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, (Garantía de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al **Veinte Por Ciento (20%)** del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantía deberá ser por un (1) año, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**. Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano. **EL CONTRATISTA** también será responsable por los daños que ocasione a las Obras existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no haya sido advertido por **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** hasta el momento de recibir la Obra terminada.

ARTÍCULO 23.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando **EL CONTRATISTA** presente los siguientes documentos: a)Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras, b)Certificado de Descargo de la Secretaría de Estado de Trabajo., c)Pago de Liquidación de todos los compromisos de la Seguridad Social, d)Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta., e)Comprobante de pagos de las tasas del CODIA.

ARTÍCULO 24.- IMPUESTOS: EL CONTRATISTA no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del presente Contrato y por tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTÍCULO 25.- EQUILIBRIO ECONÓMICO: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por **EL CONTRATISTA** para la ejecución de la obra, los pagos y los gastos reembolsables pagables a **EL CONTRATISTA**, en virtud de este Contrato, aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional y

que de igual manera si ocurriera lo contrario entonces esa diminución se interpretaría a favor del Ayuntamiento Municipal De Los Alcarrizos (AMA).

ARTÍCULO 26.- SUB-CONTRATACIONES: **EL CONTRATISTA** no podrá ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún beneficio o participación o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**. El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, no eximirá a **EL CONTRATISTA** de ninguna responsabilidad y obligación estipulada en El Contrato. De igual manera, queda entendido que **EL CONTRATISTA** será también responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTÍCULO 27.- RESCISIÓN: EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS] se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de que **EL CONTRATISTA** diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones. **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL** podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, así como ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si **EL CONTRATISTA** fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administración judicial, o si se presentase una petición de declaración en quiebra, o si hiciese algún convenio con sus acreedores o una cesión a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la Supervisión certificase por escrito a **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** que en su opinión **EL CONTRATISTA: a)**Ha abandonado las Obras., b)Ha dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) días, no obstante habersele requerido proseguir por escrito., c)No está ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o está constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las órdenes emitidas por la Supervisión., d)Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,. e)** Si **EL CONTRATISTA** cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores; f) Si se le asigna un administrador judicial a **EL CONTRATISTA** a causa de su insolvencia. g) Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato.De igual modo, podrá procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas de este Contrato, que a juicio de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** sean violadas por **EL CONTRATISTA**. En tal caso, **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podrá rescindir este Contrato y procederá a evaluar los daños y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a **EL CONTRATISTA** ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTÍCULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO: Constituirá una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, las enunciadas a continuación: a) La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria.

ARTÍCULO 29.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS tomará posesión de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas de terminación y se haya expedido un certificado de recepción provisional. Tras la recepción provisional de las Obras, **EL CONTRATISTA** desmantelará y retirará las estructuras provisionales así como los materiales que ya no se utilicen para la ejecución del Contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos, y restablecerá toda modificación en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

ARTÍCULO 30.- CUBICACIÓN DE CIERRE: **EL CONTRATISTA** producirá una cubicación final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El Contrato. La Supervisión deberá validar la cubicación final dentro de **Sesenta Días** (60) días de recibida, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitará a **EL CONTRATISTA** que realice toda corrección o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicación final, no fuese satisfactoria, **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** deberá determinar el monto a pagar a **EL CONTRATISTA**.

ARTÍCULO 31.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Al expirar el período de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el Supervisor extenderá a **EL CONTRATISTA** un certificado de recepción definitiva y remitirá una copia del mismo a **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** con indicación de la fecha en que **EL CONTRATISTA** haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfacción del Supervisor. El Supervisor entregará el certificado de recepción definitiva a más tardar **indicar en letras y números el plazo** días, después de que expire el período arriba mencionado, o, después de dicho período, tan pronto como se haya terminado a satisfacción del Supervisor toda obra ordenada. Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado a **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, con una copia para **EL CONTRATISTA**.

ARTÍCULO 32.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO: Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre **LAS PARTES**, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS.**

ARTÍCULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS: LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al desarrollo del presente Contrato y su interpretación.

ARTÍCULO 34.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) *y de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje. Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08. de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).*

ARTÍCULO 35.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 36.- IDIOMA OFICIAL: El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente documento.

ARTÍCULO 37.- TITULOS: Los títulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado de este Contrato.

ARTÍCULO 38.- LEGISLACIÓN APLICABLE: EL CONTRATISTA realizará sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la República Dominicana.

ARTÍCULO 39.- ELECCIÓN DE DOMICILIO: Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, **LAS PARTES** eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente Contrato, su ejecución y terminación.

ARTÍCULO 40.- ACUERDO INTEGRO: El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre **LAS PARTES**; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una **de LAS PARTES**, y el otro para los fines correspondientes, En el Municipio de Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los Once(11) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintidós (10/02/2022).

Por el Ayuntamiento,-

CRISTIAN ENCARNACION
Contratante

la Compañía **GRUPO SECHAS E.R.L**

ING.SAMUEL EUGENIO CHALAS SANTANA
Contratista

YO, DR. BARTOLO A. LALANE DE LA CRUZ, Notario público de los del número para del Municipio Los Alcarrizos, registrado en el Colegio Dominicano de Notarios con el número 7780, con estudio profesional abierto en esta ciudad., Certifico y doy fe que las firmas que aparecen en el presente documento fueron puestas, en mi presencia libre y voluntariamente por los señores: **CRISTIAN ENCARNACION Y GRUPO SECHAS E.R.L y/o ING.SAMUEL EUGENIO CHALAS SANTANA,** quienes me declararon bajo la fe del juramento que esas son las firmas que ellos acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas, tanto públicas como privadas. En el Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, a los Once (11) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintidós (10/02/2022).-

DR. BARTOLO A. LALANE DE LA CRUZ
Notario Público

GRUPO SECHAS

C/Portal No. 57, Átala, D.N., República Dominicana. Telf. 809-299-3245
809-661-2920, Email: samuelchalas95@gmail.com RNC 1-32-18981-7

PRESUPUESTO :

Para la Construcción de aceras contenes y badenes de las calles del sector Juana Saltitopa 2da (05). Perteneciente a las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

UBICADA EN EL SECTOR : Juana Saltitopa
MUNICIPIO: Los Alcarrizos
PROVINCIA: Santo Domingo
FECHA: 25 de abril del 2022

N°	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
I	**PRELIMINARES**					
1.01	Valla informativa de la obra.	1.000	P.A.	13,000.00	13,000.00	**13,000.00**
II	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
2.01	Excavación para el Peatón Coronel Fernández (13.2*1.90*0.10)	2.508	m3	315.00	790.02	
2.02	Excavación para aceras para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	4.120	m3	315.00	1,297.80	
2.03	Excavación para contenes para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	1.854	m3	315.00	584.01	
2.04	Excavación para aceras en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/Perú (54.20*1*0.10)*2	10.800	m3	315.00	3,402.00	
2.05	Excavación para contenes en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/Perú (54.20*1*0.10)*2	4.878	m3	315.00	1,536.57	
2.06	Excavación para aceras en la C/Respaldo 17, desde la calle Duarte hasta el final (101.50*1*0.10)*2	20.300	m3	315.00	6,394.50	
2.07	Excavación de material inservible en el callejón de la respaldo 17 (13*3*0.10)	3.900	m3	315.00	1,228.50	
2.08	Excavación de material inservible en el callejón de la casa No. 4 (12.5*3*0.10)	3.750	m3	315.00	1,181.25	
2.09	Excavación para aceras en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*1*0.10)*2	22.000	m3	315.00	6,930.00	
2.10	Excavación para contenes en la en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*0.45*0.10)*2	9.900	m3	315.00	3,118.50	
2.11	Excavación para aceras en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 (94.5*1*0.10)*2	18.900	m3	315.00	5,953.50	

GRUPO SECHAS
C/Portal No. 57, Átala, D.N., República Dominicana. Telf. 809-299-3245
809-661-2920, Email: samuelchalas95@gmail.com RNC 1-32-18981-7

PRESUPUESTO :

Para la Construcción de aceras contenes y badenes de las calles del sector Juana Saltitopa 2da (05). Perteneciente a las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

UBICADA EN EL SECTOR : Juana Saltitopa
MUNICIPIO: Los Alcarrizos
PROVINCIA: Santo Domingo
FECHA: 25 de abril del 2022

Nº	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
2.12	Excavación para contenes en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 (94.50*0.45*0.10)*2	8.510	m3	315.00	2,680.65	
2.13	Excavación para aceras en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmado primavera close (56.80*1 *0.10)*2	11.360	m3	315.00	3,578.40	
2.14	Excavación para contenes en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmado primavera close (56.80*0.45*0.10)*2	5.110	m3	315.00	1,609.65	
2.15	Excavación para aceras en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 (50*1*1.10)*2	10.000	m3	315.00	3,150.00	
2.16	Excavación para contenes en la C/19, desde C/Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 (50*0.45*0.10)*2	4.500	m3	315.00	1,417.50	
2.17	Excavación para aceras en la C/19, desde C/Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20(266.70*1*0.10)*2	53.340	m3	315.00	16,802.10	
2.18	Excavación para contenes en la C/19, desde C/Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 (266.70*0.45*0.10)*2	24.000	m3	315.00	7,560.00	
2.19	Excavación para aceras en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*1 *0.10)*2	40.000	m3	315.00	12,600.00	
2.20	Excavación para contenes en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*0.45*0.10)*2	18.000	m3	315.00	5,670.00	
2.21	Demolición de Baden en la C/ Coronel Fernández (7.9*2.0)	15.800	m2	750.00	11,850.00	
2.22	Demolición de Baden en la C/ El Canal (6*2.0)	12.000	m2	750.00	9,000.00	
2.23	Demolición de Baden en la C/ El canal próximo al colmado Raymundo (3.5*2.0)	7.000	m2	750.00	5,250.00	113,584.95

III-	RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION					
2.01	Relleno en caliche para el Peatón Coronel Fernández (13.2*1.90*0.10)	2.508	m3	525.00	1,316.70	

GRUPO SECHAS
C/Portal No. 57, Átala, D.N., República Dominicana. Telf. 809-299-3245
809-661-2920, Email: samuelchalas95@gmail.com RNC 1-32-18981-7

PRESUPUESTO :
Para la Construcción de aceras contenes y badenes de las calles del sector Juana Saltitopa 2da (05). Perteneciente a las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

UBICADA EN EL SECTOR : Juana Saltitopa
MUNICIPIO: Los Alcarrizos
PROVINCIA: Santo Domingo
FECHA: 25 de abril del 2022

Nº	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
2.02	Relleno en caliche para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	4.120	m3	525.00	2,163.00	
2.03	Telford para contenes para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	1.854	m3	1,703.67	3,158.60	
2.04	Relleno en caliche para aceras en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/Perú (54.20*1*0.10)*2	10.800	m3	525.00	5,670.00	
2.05	Telford para contenes en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/Perú (54.20*1*0.10)*2	4.878	m3	1,703.67	8,310.50	
2.06	Relleno en caliche para aceras en la C/Respaldo 17, desde la calle Duarte hasta el final (101.50*1*0.10)*2	20.300	m3	525.00	10,657.50	
2.07	Relleno en caliche para el callejón de la respaldo 17 (13*3*0.10)	3.900	m3	525.00	2,047.50	
2.08	Relleno en caliche para el callejón de la casa No. 4 (12.5*3*0.10)	3.750	m3	525.00	1,968.75	
2.09	Relleno en caliche para aceras en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*1*0.10)*2	22.000	m3	525.00	11,550.00	
2.10	Telford para contenes en la en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*0.45*0.10)*2	9.900	m3	1,703.67	16,866.33	
2.11	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 (94.5*1*0.10)*2	18.900	m3	525.00	9,922.50	
2.12	Telford para contenes en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 (94.50*0.45*0.10)*2	8.510	m3	1,703.67	14,498.23	
2.13	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmado primavera close (56.80*1 *0.10)*2	11.360	m3	525.00	5,964.00	

GRUPO SECHAS
C/Portal No. 57, Atala, D.N., República Dominicana. Telf. 809-299-3245
809-661-2920, Email: samuelchalas95@gmail.com RNC 1-32-18981-7

PRESUPUESTO :
Para la Construcción de aceras contenes y badenes de las calles del sector Juana Saltitopa 2da (05). Perteneciente a las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

UBICADA EN EL SECTOR : Juana Saltitopa
MUNICIPIO: Los Alcarrizos
PROVINCIA: Santo Domingo
FECHA: 25 de abril del 2022

Nº	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
2.14	Telford para contenes en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmado primavera close (56.80*0.45*0.10)*2	5.110	m3	1,703.67	8,705.75	
2.15	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 (50*1*1.10)*2	10.000	m3	525.00	5,250.00	
2.16	Telford para contenes en la C/19, desde C/Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 (50*0.45*0.10)*2	4.500	m3	1,703.67	7,666.52	
2.17	Relleno en caliche para aceras en la C/19, desde C/Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20(266.70*1*0.10)*2	53.340	m3	525.00	28,003.50	
2.18	Telford para contenes en la C/19, desde C/Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 (266.70*0.45*0.10)*2	24.000	m3	1,703.67	40,888.08	
2.19	Relleno en caliche para aceras en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*1 *0.10)*2	40.000	m3	525.00	21,000.00	
2.20	Telford para contenes en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*0.45*0.10)*2	18.000	m3	1,703.67	30,666.06	**236,273.53**

IV-	HORMIGON SIMPLE					
4.01	Construcción de contenes para el callejón de la C/Canal desde la C/14 hasta Duarte (20.6*1*0.10)*2	41.200	ml	792.86	32,665.83	
4.02	Construcción de aceras en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/Perú (54.20*1*0.10)*2	108.000	m2	785.31	84,813.48	
4.03	Construcción de contenes en la C/Canal, desde el colmado Yordany hasta la C/Perú (54.20*1*0.10)*2	108.400	ml	792.86	85,946.02	
4.04	Construcción de aceras en la C/Respaldo 17, desde la calle Duarte hasta el final (101.50*1*0.10)*2	203.000	m2	785.31	159,417.93	
4.05	Construcción de aceras en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*1*0.10)2	220.000	m2	785.31	172,768.20	

GRUPO SECHAS
C/Portal No. 57, Átala, D.N., República Dominicana. Telf. 809-299-3245
809-661-2920, Email: samuelchalas95@gmail.com RNC 1-32-18981-7

PRESUPUESTO :
Para la Construcción de aceras contenes y badenes de las calles del sector Juana Saltitopa 2da (05). Perteneciente a las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

UBICADA EN EL SECTOR : Juana Saltitopa
MUNICIPIO: Los Alcarrizos
PROVINCIA: Santo Domingo
FECHA: 25 de abril del 2022

Nº	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
4.06	Construcción de contenes en la C/Canal, desde la C/ Coronel Fernández hasta la C/ 18 (110*0.45*0.10)2	220.000	ml	792.86	174,429.20	
4.07	Construcción de aceras en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 (94.5*1*0.10)*2	189.000	m2	785.31	148,423.59	
4.08	Construcción de contenes en la C/19, desde la C/ Duarte hasta la C/ 17 (94.50*0.45*0.10)*2	189.000	ml	792.86	149,850.54	
4.09	Construcción de aceras en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmado primavera close (56.80*1 *0.10)*2	113.600	m2	785.31	89,211.22	
4.10	Construcción de contenes en la C/19, desde el callejón bellaco hasta el colmado primavera close (56.80*0.45*0.10)*2	113.600	ml	792.86	90,068.90	
4.11	Construcción de aceras en la C/19, desde C/ Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 (50*1*1.10)*2	100.000	m2	785.31	78,531.00	
4.12	Construcción de contenes en la C/19, desde C/Colmado Yasiel hasta la Casa No. 31 (50*0.45*0.10)*2	100.000	ml	792.86	79,286.00	
4.13	Construcción de aceras en la C/19, desde C/Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20(266.70*1*0.10)*2	533.400	m2	785.31	418,884.35	
4.14	Construcción de contenes en la C/19, desde C/Prolongación 17 hasta la C/ Respaldo 20 (266.70*0.45*0.10)*2	533.400	ml	792.86	422,911.52	
4.15	Construcción de aceras en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*1 *0.10)*2	400.000	m2	785.31	314,124.00	
4.16	Construcción de contenes en la C/Prolongación 17, desde C/ 17 hasta el final (200*0.45*0.10)*2	400.000	ml	792.86	317,144.00	2,818,475.79

V-	HORMIGON ARMADO					
5.01	Reconstrucción de Baden en la C/ Coronel Fernández (7.9*2.0)	15.80	m2	2,652.38	41,907.63	

GRUPO SECHAS

C/Portal No. 57, Átala, D.N., República Dominicana. Telf. 809-299-3245
809-661-2920, Email: samuelchalas95@gmail.com RNC 1-32-18981-7

PRESUPUESTO :

Para la Construcción de aceras contenes y badenes de las calles del sector Juana Saltitopa 2da (05). Perteneciente a las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

UBICADA EN EL SECTOR : Juana Saltitopa
MUNICIPIO: Los Alcarrizos
PROVINCIA: Santo Domingo
FECHA: 25 de abril del 2022

Nº	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
5.02	Reconstrucción de Baden en la C/ El Canal (6*2.0)	12.00	m2	2,652.38	31,828.58	
5.03	Reconstrucción de Baden en la C/ El Canal próximo al colmado Raymundo (3.5*2.0)	7.00	m2	2,652.38	18,566.67	92,302.89
VI-	**LIMPIEZA FINAL**					
6.01	Limpieza general y final	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					3,288,637.15

GASTOS INDIRECTOS

Dirección Técnica y Resp. Civil.	10.00%	328,863.72	
Gastos Administrativos.	3.00%	98,659.11	
Seguros y finanzas.	2.50%	82,215.93	
Liquidación y Prest. Laborales. Ley 686.	1.00%	32,886.37	
Codia 1x1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus dependencias.	0.10%	3,288.64	
ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo I).	18.00%	59,195.47	605,109.24
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO			3,893,746.39

GRUPO SECHAS, E.I.R.L. RNC: 132-18981-7 Santo Domingo, R.D.

Ing. Samuel Eugenio Chalas Santana
Gerente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
12 de octubre de 2022

Contrato No: 021-2022
No. Oficio: 001-2022

Al : **Sr. Cristian Encamación**
Alcalde del AMA

Vía : **Lic. Luisana Guzmán**
Directora de Administrativo

Del : **Ing. Freddy M. Dini Lebrón**
Director de Obras Publicas Municipal

Anexo : Fotos y Soporte Técnico.

Asunto	: **Solicitud 1er Pago a avance a deuda de Cub. 3 y final**

Muy cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el 1er pago a avance a deuda del cierre de la Cub.3 y final, Correspondiente a la Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sánchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte, C/Boy scout, en el sector Villa progreso, Chavón (06). Por un monto de **RD$ 1, 679,657.10 (Un Millón Seiscientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Siete pesos con 10/100).**

El mismo a nombre de **Ing. Antonio Rodriguez Hilario,** Portador de la cédula de Identidad y electoral **No.001-0737283-1.**

Sin otro particular se despide:

Atentamente:

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario
Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
12 de octubre de 2022

Al	:	**Sr. Cristian Encamación** Alcalde del AMA
Vía	:	**Lic. Luisana Guzmán** Directora Administrativa
Del	:	**Ing. Freddy M. Dini Lebrón** Director de Obras Publicas Municipal
Asunto	:	Informe de inspección a nombre del **Ing. Antonio Rodriguez Hilario,** Portador de la cédula de Identidad y electoral **No. 001-0737283.1. CODIA 21826.**
Anexo	:	Fotos y Soporte Técnico.

Muy cortésmente, me dirijo a usted, para remitirle el informe de Inspección del cierre de la **cubicación No.3 y final**, perteneciente al contrato 021-2022, correspondiente a la Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sánchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte, C/Boy scout, en el sector Villa progreso, Chavón (06). Esta obra se encuentran ejecutada en un **100.00%.**

Este informe fue suministrado, evaluado y autorizado por la parte interesadas:

Ing. Francisco Antonio Suarez
Supervisor

Ing. Antonio Rodriguez Hilario
Contratista

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

"AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS"

(AMA)

Dirección de Obras Públicas Municipales

Contratista: **ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO**

Obras: Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sánchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte, C/Boy scout, en el sector Villa progreso, Chavón (06).

Cod: AMA17-OP1221-P32-M

Sector: Villa progreso, Chavón (06)

No. Contrato 021-2022

Cub. No. 3 y final

Fecha: 12 de octubre de 2022

Periodo: Julio-Octubre 2022

Monto Contratado:	6,212,299.63
Monto a Ejecutar:	5,246,840.24
Monto a ejecutar mas Impuestos:	6,212,299.63
Avance Inicial:	1,242,459.93
Avance de Obra:	100.00%
Monto Adicional 25% del Monto Contratado:	1,553,074.91
Avance de Adicional:	61.94%

	ETAPA I	PRESUPUESTADO				CUBICACION No.1 (Anterior)			CUBICACION No.2 (Actual)			CUBICACION No.3 (Actual)			CUBICACION ACUMULADA		
No.	**PARTIDAS**	**Cantidad**	**Unidad**	**Costo Uni.**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**%**	**Cantidad**	**Valor**	**%**	**Cantidad**	**Valor**	**%**	**Cantidad**	**Valor**	**%**
1.01	Valla informativa de la obra.	1.00	Ud.	15,000.00	15,000.00	1.00	15000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	15000.00	100.00%
					15,000.00											**15,000.00**	
II	**MOVIMIENTO DE TIERRA**																
2.01	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martínez hasta la C/Sánchez (122.87*1.00*0.10)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	24.574	m^3	365.00	8,969.51	12.41	4531.40	50.52%	0.00	0.00	0.00%	12.16	4438.11	49.48%	24.57	8,969.51	100.00%
2.02	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martínez hasta la C/Sánchez (122.87*0.50*0.10)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	12.29	m^3	365.00	4,484.76	12.29	4484.76	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.29	4,484.76	100.00%
	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Sánchez desde la C/Santa fe hasta la C/Napoleón (253.66*1.00*0.10)*2 **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	50.73	m^3	365.00	18,517.18	40.93	14938.55	80.67%	0.00	0.00	0.00%	9.02	3290.65	17.77%	49.94	18,229.20	98.44%
2.04	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Sánchez desde la C/Santa Fe hasta la C/Napoleón (253.66*0.50*0.10)*2 **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	25.366	m^3	365.00	9,258.59	25.05	9142.86	98.75%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	25.05	9,142.86	98.75%
2.05	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*1.00*0.10)*2 **Nota: C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	50.73	m^3	365.00	18,517.18	50.73	18517.18	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	50.73	18,517.18	100.00%
2.06	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*0.50*0.10)*2 **Nota: C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	25.37	m^3	365.00	9,258.59	23.01	8400.41	90.73%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	23.01	8,400.41	90.73%
2.07	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*1.00*0.10)*2	32.99	m^3	365.00	12040.62	0.00	0.00	0.00	19.51	7121.15	59.14%	0.00	0.00	0.00%	19.51	7,121.15	59.14%

2.08	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*0.50*0.10)*2	16.49	m^3	365.00	6,020.31	0.00	0.00	0.00%	12.31	4493.15	74.63%	0.00	0.00	0.00%	12.31	4,493.15	74.63%
2.09	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63*1.00*0.10)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	57.93	m^3	365.00	21,142.99	20.52	7491.17	35.43%	0.00	0.00	0.00%	1.86	678.62	3.21%	22.38	8,169.80	38.64%
2.1	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63*0.50*0.10)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	28.96	m^3	365.00	10,571.50	27.46	10022.83	94.81%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	27.46	10,022.83	94.81%
2.11	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	6.86	m^3	365.00	2,503.72	6.69	2440.75	97.49%	0.00	0.00	0.00%	0.17	62.97	2.52%	6.86	2,503.72	100.00%
2.12	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.50*0.10)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	4.57	m^3	365.00	1,669.15	4.57	1669.15	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.57	1,669.15	100.00%
3	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	6.86	m^3	365.00	2,503.72	4.72	1721.88	68.77%	0.00	0.00	0.00%	2.14	781.84	31.23%	6.86	2,503.72	100.00%
2.14	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.50*0.10)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	4.57	m^3	365.00	1,669.15	4.57	1669.15	100.00%	2.14	781.10	46.80%	0.00	0.00	0.00%	6.71	2,450.25	146.80%
2.15	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/11 (desde la C/8 hasta la Cañada**	6.86	m^3	365.00	2,503.72	5.40	1969.62	78.67%	1.46313135	534.04	21.33%	0.00	0.00	0.00%	6.86	2,503.67	100.00%
2.16	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.50*0.10)*2 **NOTA: C/11(desde la C/8 hasta la Cañada**	4.57	m^3	365.00	1,669.15	4.57	1669.15	100.00%	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	4.57	1,669.15	100.00%
					131,299.81											**110,850.48**	
III	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION**																
3.01	Relleno en caliche para aceras en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martínez hasta la C/Sánchez (122.87*1.00*0.10)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	24.57	m^3	650.00	15,973.10	12.41	8069.61	50.52%	0.00	0.00	0.00%	12.16	7903.49	49.48%	24.57	15,973.10	100.00%
3.02	Telford para contenes en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martínez hasta la C/Sánchez (122.87*0.45*0.10)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	12.29	m^3	2,344.26	28,803.92	12.29	28803.92	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.29	28,803.92	100.00%
3.03	Relleno en caliche para aceras en la C/Sánchez desde la C/Santa fe hasta la C/Napoleón (253.66*1.00*0.10)*2 **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	50.73	m^3	650.00	32,975.80	40.93	26602.90	80.67%	0.00	0.00	0.00%	9.02	5860.05	17.77%	49.94	32,462.95	98.44%
3.04	Telford para contenes en la C/Sánchez desde la C/Santa Fe hasta la C/Napoleón (253.66*0.45*0.10)*2 **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	22.83	m^3	2,344.26	53,518.05	22.55	52861.38	98.77%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	22.55	52,861.38	98.77%
3.05	Relleno en caliche para aceras en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*1.00*0.10)*2 Nota: **C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	50.73	m^3	650.00	32,975.80	50.73	32975.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	50.73	32,975.80	100.00%
3.06	Telford para contenes en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*0.45*0.10)*2 **Nota: C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	22.83	m^3	2,344.26	53,518.05	20.71	48557.46	90.73%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20.71	48,557.46	90.73%
3.07	Relleno en caliche para aceras en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*1.00*0.10)*2	32.99	m^3	650.00	21,442.20	0.00	0.00	0.00%	19.51	12680.20	59.14%	0.00	0.00	0.00%	19.51	12,680.20	59.14%
3.08	Telford para contenes en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*0.45*0.10)*2	14.84	m^3	2,344.26	34,799.60	0.00	0.00	0.00%	11.08	25972.06	74.63%	0.00	0.00	0.00%	11.08	25,972.06	74.63%
3.09	Relleno en caliche para aceras en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63*1.00*0.10)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	57.93	m^3	650.00	37,651.90	20.52	13340.44	35.43%	0.00	0.00	0.00%	1.86	1208.51	3.21%	22.38	14,548.95	38.64%

3.1	Telford para contenes en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63*0.45*0.10)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	26.07	m^3	2,344.26	61,107.12	24.71	57935.66	94.81%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	24.71	57,935.66	94.81%
3.11	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	6.86	m^3	650.00	4,458.68	6.69	4346.54	97.49%	0.00	0.00	0.00%	0.17	112.14	2.52%	6.86	4,458.68	100.00%
3.12	Telford para contenes en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.45*0.10)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	4.12	m^3	2,344.26	9,648.27	4.12	9648.27	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.12	9,648.27	100.00%
3.13	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	6.86	m^3	650.00	4,458.68	4.717	3066.36	68.77%	0.00	0.00	0.00%	2.14	1392.31	31.23%	6.86	4,458.68	100.00%
3.14	Telford para contenes en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.45*0.10)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	4.12	m^3	2,344.26	9,648.27	4.12	9648.27	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.12	9,648.27	100.00%
3.15	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2**NOTA: C/11 (desde la C/8 hasta la Cañada**	6.86	m^3	650.00	4,458.68	5.40	3507.55	78.67%	0.00	0.00	0.00%	1.46	951.12	21.33%	6.86	4,458.68	100.00%
3.16	Telford para contenes en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.45*0.10)*2**NOTA: C/11 (desde la C/8 hasta la Cañada**	4.12	m^3	2,344.26	9,648.27	4.12	9648.27	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.12	9,648.27	100.00%
					415,086.38											**365,092.32**	
IV	**HORMIGON SIMPLE**																
4.01	Construcción de aceras en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martínez hasta la C/Sánchez (122.87*1.00)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	245.74	m^2	921.53	226,456.78	124.15	114405.97	50.52%	0.00	0.00	0.00%	121.59	112050.82	49.48%	245.74	226456.78	100.00%
4.02	Construcción de contenes en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martínez hasta la C/Sánchez (122.87ml)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	245.74	ml	946.78	232,661.72	245.74	232661.72	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	245.74	232661.72	100.00%
4.03	Construcción de aceras en la C/Sánchez desde la C/Santa fe hasta la C/Napoleón (253.66*1.00)*2 **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	507.32	m^2	921.53	467,510.60	409.28	377159.50	80.67%	0.00	0.00	0.00%	90.15	83080.23	17.77%	499.43	460239.73	98.44%
4.04	Construcción de contenes en la C/Sánchez desde la C/Santa Fe hasta la C/Napoleón (253.66ml)*2 **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	507.32	ml	946.78	480,320.43	501.10	474426.90	98.77%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	501.10	474426.90	98.77%
	Construcción de aceras en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*1.00)*2 **Nota: C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	507.32	m^2	921.53	467,510.60	507.3	467510.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	507.32	467510.60	100.00%
4.06	Construcción de contenes en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66ml)*2 **Nota: C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	507.32	ml	946.78	480,320.43	460.30	435799.53	90.73%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	460.30	435799.53	90.73%
4.07	Construcción de aceras en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*1.00)*2	329.88	m^2	921.53	303,994.32	0.00	0.00	0.00%	195.08	179772.07	59.14%	0.00	0.00	0.00%	195.08	179772.07	59.14%
4.08	Construcción de contenes en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94ml)*2	329.88	ml	946.78	312,323.79	0.00	0.00	0.00%	246.20	233097.24	74.63%	0.00	0.00	0.00%	246.20	233097.24	74.63%
4.09	Construcción de aceras en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63*1.00)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	579.26	m^2	921.53	533,805.47	205.24	189,132.6153	35.43%	0.00	0.00	0.00%	18.59	17133.45	3.21%	223.83	206266.06	38.64%
4.10	Construcción de contenes en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63ml)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	289.63	ml	946.78	274,215.89	274.60	259,984.0866	94.81%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	274.60	259984.09	94.81%
4.11	Construcción de aceras en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	91.46	m^2	921.53	84,283.13	89.16	82163.41	97.49%	0.00	0.00	0.00%	2.30	2119.72	2.52%	91.46	84283.13	100.00%

4.12	Construcción de contenes en la C/ Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73ml)*2 NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.	91.46	ml	946.78	86,592.50	91.46	86592.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	91.46	86592.50	100.00%
4.13	Construcción de aceras en la C/ Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	91.46	m^2	921.53	84,283.13	62.90	57964.04	68.77%	28.56	26318.90	31.23%	0.00	0.00	0.00%	91.46	84282.94	100.00%
4.14	Construcción de contenes en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73ml)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	91.46	ml	946.78	86,592.50	91.46	86592.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	91.46	86592.50	100.00%
4.15	Construcción de aceras en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75)*2 **NOTA: C/11(desde la C/8 hasta la Cañada**	91.46	m^2	921.53	84,283.13	71.95	66303.86	78.67%	19.51	17979.05	21.33%	0.00	0.00	0.00%	91.46	84282.91	100.00%
4.16	Construcción de contenes en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73ml)*2 **Nota: C/11 /(desde la C/8 hasta la cañada)**	91.46	ml	946.78	86,592.50	91.46	86592.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	91.46	86592.50	100.00%
					4,291,746.92								0.00			**3,688,841.18**	
V	**HORMIGON ARMADO**																
5.01	Construcción de Baden transversal en la C/Juan Bosch (7.10*2.00)	14.20	m^2	3,198.54	45,419.27	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.02	Construcción de Baden Transversal en la C/Rosa Duarte (6.60*2.00)	13.20	m^2	3,198.54	42,220.73	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.03	Construcción de Baden en la C/Sánchez esq. C/Orquídea (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.04	Construcción de Baden en la C/Sánchez esq. C/Horacio Vázquez (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.05	Construcción de Baden en la C/la Enfermera esq. C/Sánchez (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.06	Construcción de Baden en la C/Santa Fe esq. C/Sánchez (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.07	Construcción de Baden en la C/Orlando Martínez esq. C/Orquídea (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.08	Construcción de Baden en la C/Orlando Martínez esq. C/Horacio Vázquez (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
[illegible]	Construcción de Baden en la C/la Enfermera esq. C/Orlando Martínez (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
																0.00	
		118.40			**378,707.14**												
VII	**LIMPIEZA FINAL**																
7.01	Limpieza general y final.	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	15000.00	100.00%	1.00	15000.00	100.00%
					15,000.00											**15,000.00**	
	CAMBIO DE PARTIDA																
V	**HORMIGON ARMADO**																
5.01	Construcción de Baden en la C/ #3 esq. C/ #4, Frente a la Iglesia La Profesia (7.00*2.00)	14.00	m^2	3,198.54	44,779.56	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	14.00	44779.56	100.00%	14.00	44,779.56	100.00%
5.02	Construcción de Baden en la C/ #4,Proxima esq. Iglesia Remanso (9.30*2.00)	18.60	m^2	3,198.54	59,492.84	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	18.60	59492.84	100.00%	18.60	59,492.84	100.00%
5.03	Construcción de Baden en la C/ #4, Frente a la Iglesia Remanso (11.30*2.00)	22.60	m^2	3,198.54	72,287.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	22.60	72287.00	100.00%	22.60	72,287.00	100.00%
5.04	Construcción de Baden en la C/ #4,Frenteal Colmado NuelyEno (8.30*2.00)	16.60	m^2	3,198.54	53,095.76	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	16.60	53095.76	100.00%	16.60	53,095.76	100.00%
5.05	Construcción de Baden en la C/ #6 esq. C/ #7,C/ Estrella Sadala (5.10*2.00)	10.20	m^2	3,198.54	32,625.11	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.20	32625.11	100.00%	10.20	32,625.11	100.00%

5.06	Construcción de Baden en la C/ #7,C/ Hnas. Mirabal esq.C/ Estrella Sadala (6.00*2.00)	12.00	m^2	3,198.54	38,382.48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	38382.48	100.00%	12.00	38,382.48	100.00%
5.07	Construcción de Baden en la C/ #5,Debajo de un arbol.Casi esq.C/Estrella Sadala (5.40*2.00)	10.80	m^2	3,198.54	34,544.23	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.80	34544.23	100.00%	10.80	34,544.23	100.00%
5.08	Construcción de Baden en la C/ #5,Frente al Colmo el Mismo Coro (5.00*2.00)	10.00	m^2	3,198.54	31,985.40	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	31985.40	100.00%	10.00	31,985.40	100.00%
5.09	Construcción de Baden en la C/ #8, Frente a Ferreteria A.F (8.00*2.00)	3.60	m^2	3,198.54	11,514.74	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.60	11514.74	100.00%	3.60	11,514.74	100.00%
		118.40			**378,707.14**											**378,707.14**	
	ADICIONAL DE CAMBIO DE PARTIDA																
V	**HORMIGON ARMADO**																
	Construcción de Baden en la C/ #8, Frente a Ferreteria A.F (8.00*2.00)	12.40	m^2	3,198.54	39,661.90	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.40	39661.90	100.00%	12.40	39,661.90	100.00%
					39,661.90											**39,661.90**	
	EXCEDENTE DE PRESUPUESTO A COMPENSAR																
	PARTIDA COMPENSACION DE VOLUMEN DE PRESUPUESTO	**Monto**	**20,449.33**														
VIII	**MOVIMIENTO DE TIERRA**																
8.01	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 3ra desde la C/ #8 hasta la C/ #4 (103.95*1.00*0.10)*2	20.79	m^3	365.00	7,588.35	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20.79	7588.35	100.00%	20.79	7,588.35	100.00%
8.02	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 3ra desde la C/ #8 hasta la C/ #4 (124.85*0.50*0.10)*2	12.49	m^3	365.00	4,557.03	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.49	4557.03	100.00%	12.49	4,557.03	100.00%
8.03	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 6ta desde la C/ #3ra hasta la C/ #5ta (103.00*1.00*0.10)*2	20.60	m^3	365.00	7,519.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20.60	7519.00	100.00%	20.60	7,519.00	100.00%
8.04	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 6ta desde la C/ #3ra hasta la C/ #5ta (91.50*0.50*0.10)*2	2.15	m^3	365.00	784.97	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.15	784.97	100.00%	2.15	784.97	100.00%
					20,449.34											**20,449.34**	
	RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION	**Monto**	**49,994.06**														
9.01	Relleno en caliche para aceras en la C/ 3ra desde la C/ #8 hasta la C/ #4 (103.95*1.00*0.10)*2	20.79	m^3	650.00	13,513.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20.79	13513.50	100.00%	20.79	13,513.50	100.00%
9.02	Telford para contenes para contenes en la C/ 3ra desde la C/ #8 hasta la C/ #4 (124.85*0.50*0.10)*2	12.49	m^3	2,344.26	29,279.81	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.49	29279.81	100.00%	12.49	29,279.81	100.00%
9.03	Relleno en caliche para aceras en la C/ 6ta desde la C/ #3ra hasta la C/ #5ta (103.00*1.00*0.10)*2	11.08	m^3	650.00	7,200.70	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11.08	7200.70	100.00%	11.08	7,200.70	100.00%
					49,994.01											**49,994.01**	
X	**HORMIGON SIMPLE**	**Monto**	**602,905.74**														
10.01	Construcción de aceras en la C/ 3ra desde la C/ #8 hasta la C/ #4 (103.95*1.00)*2	207.90	m^2	921.53	191,586.09	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	207.90	191586.09	100.00%	207.90	191,586.09	100.00%
10.02	Construcción de contenes en la C/ 3ra desde la C/ #8 hasta la C/ #4 (124.85*1.00)*2	249.70	ml	946.78	236,410.97	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	249.70	236410.97	100.00%	249.70	236,410.97	100.00%

10.03	Construcción de aceras en la C/ 6ta desde la C/ #3ra hasta la C/ #5ta (103.00*1.00)*2	189.80	m^2	921.53	174,908.70	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	189.80	174908.70	100.00%	189.80	174,908.70	100.00%
					602,905.75											**602,905.75**		
	ADICIONAL DE PARTIDA COMPENSACION																	
VIII	**MOVIMIENTO DE TIERRA**																	
8.04	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 6ta desde la C/ #3ra hasta la C/ #5ta (91.50*0.50*0.10)*2	7.00	m^3	365.00	2,554.78	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	2554.78	100.00%	7.00	2,554.78	100.00%
8.05	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/ Jose Fco. Peña Gomez desde la C/ #8 hasta el final (93.20*1.00*0.10)*2	18.64	m^3	365.00	6,803.60	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	18.64	6803.60	100.00%	18.64	6,803.60	100.00%
8.06	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ Jose Fco. Peña Gomez desde la C/ #8 hasta el final (93.20*0.50*0.10)*2	9.32	m^3	365.00	3,401.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.32	3401.80	100.00%	9.32	3,401.80	100.00%
					12,760.18											**12,760.18**		
IX	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION**																	
9.03	Relleno en caliche para aceras en la C/ 6ta desde la C/ #3ra hasta la C/ # 5ta (68.31*1.00*0.10)*2	9.52	m^3	650.00	6,189.30	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.52	6189.30	100.00%	9.52	6,189.30	100.00%
9.04	Telford para contenes para contenes en la C/ 6ta desde la C/ # 3ra hasta la C/ #5ta (91.50*0.50*0.10)*2	9.15	m^3	2,344.26	21,449.98	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.15	21449.98	100.00%	9.15	21,449.98	100.00%
9.05	Relleno en caliche para aceras en la C/ Jose Fco. Peña Gomez desde la C/ #8 hasta el final (93.20*1.00*0.10)*2	18.64	m^3	650.00	12,116.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	18.64	12116.00	100.00%	18.64	12,116.00	100.00%
9.06	Telford para contenes en la C/ Jose Fco. Peña Gomez desde la C/ #8 hasta el final (93.20*0.50*0.10)*2	9.32	m^3	2,344.26	21,848.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.32	21848.50	100.00%	9.32	21,848.50	100.00%
					61,603.78											**61,603.78**		
X	**HORMIGON SIMPLE**																	
10.03	Construcción de aceras en la C/ 6ta desde la C/ #3ra hasta la C/ #5ta (103.00*1.00)*2	16.20	m^2	921.53	14,926.48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	16.20	14926.48	100.00%	16.20	14,926.48	100.00%
1	Construcción de contenes en la C/ 6ta desde la C/ #3ra hasta la C/ #5ta (91.50*1.00)*2	183.00	ml	946.78	173,260.74	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	183.00	173260.74	100.00%	183.00	173,260.74	100.00%
10.05	Construcción de aceras en la C/ Jose Fco. Peña Gomez desde la C/ #8 hasta el final (93.20*1.00)*2	186.40	m^2	921.53	171,773.19	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	186.40	171773.19	100.00%	186.40	171,773.19	100.00%
10.06	Construcción de contenes en la C/ Jose Fco. Peña Gomez desde la C/ #8 hasta el final (93.20*1.00)*2	186.40	ml	946.78	176,479.79	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	186.40	176479.79	100.00%	186.40	176,479.79	100.00%
					536,440.21											**536,440.21**		
	ADICIONAL DE PARTIDAS POR EXCESO DE VOLUMETRIA																	
II	**MOVIMIENTO DE TIERRA**																	
2.01	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martínez hasta la C/Sánchez (12.47*1.00*0.10)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	2.49	m^3	365.00	910.31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.49	910.31	100.00%	2.49	910.31	100.00%
2.02	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martínez hasta la C/Sánchez (14.23*0.50*0.10)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	1.42	m^3	365.00	519.40	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.42	519.40	100.00%	1.42	519.40	100.00%

2.11	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (3.46*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	0.52	m^3	365.00	189.44	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.52	189.44	100.00%	0.52	189.44	100.00%
2.12	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (15.67*0.50*0.10)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	1.57	m^3	365.00	571.96	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.57	571.96	100.00%	1.57	571.96	100.00%
2.13	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (22.03*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	4.41	m^3	365.00	1,608.19	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.41	1608.19	100.00%	4.41	1,608.19	100.00%
2.14	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (18.87*0.50*0.10)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	1.89	m^3	365.00	688.76	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.89	688.76	100.00%	1.89	688.76	100.00%
2.15	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (5.52*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/11 (desde la C/8 hasta la Cañada**	1.10	m^3	365.00	402.96	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.10	402.96	100.00%	1.10	402.96	100.00%
2.16	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (25.22*0.50*0.10)*2 **NOTA: C/11(desde la C/8 hasta la Cañada**	2.52	m^3	365.00	920.53	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.52	920.53	100.00%	2.52	920.53	100.00%
					5,811.53											**5,811.53**	
III	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION**																
3.01	Relleno en caliche para aceras en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martínez hasta la C/Sánchez (12.47*1.00*0.10)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	2.49	m^3	650.00	1,621.10	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.49	1621.10	100.00%	2.49	1,621.10	100.00%
3.02	Telford para contenes en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martínez hasta la C/Sánchez (14.23*0.45*0.10)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	1.42	m^3	2,344.26	3,335.88	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.42	3335.88	100.00%	1.42	3,335.88	100.00%
3.11	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (3.46*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	0.52	m^3	650.00	337.35	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.52	337.35	100.00%	0.52	337.35	100.00%
3.12	Telford para contenes en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (15.67*0.45*0.10)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	1.57	m^3	2,344.26	3,673.46	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.57	3673.46	100.00%	1.57	3,673.46	100.00%
3.13	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (22.03*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	4.41	m^3	650.00	2,863.90	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.41	2863.90	100.00%	4.41	2,863.90	100.00%
	Telford para contenes en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (18.87*0.45*0.10)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	1.89	m^3	2,344.26	4,423.62	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.89	4423.62	100.00%	1.89	4,423.62	100.00%
3.15	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (5.52*0.75*0.10)*2**NOTA: C/11 (desde la C/8 hasta la Cañada**	1.10	m^3	650.00	717.60	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.10	717.60	100.00%	1.10	717.60	100.00%
3.16	Telford para contenes en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (25.22*0.45*0.10)*2**NOTA: C/11 (desde la C/8 hasta la Cañada**	2.52	m^3	2,344.26	5,912.22	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.52	5912.22	100.00%	2.52	5,912.22	100.00%
					22,885.13											**22,885.13**	
IV	**HORMIGON SIMPLE**																
4.01	Construcción de aceras en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martínez hasta la C/Sánchez (12.47*1.00)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	24.94	m^2	921.53	22,982.96	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	24.94	22982.96	100.00%	24.94	22,982.96	100.00%
4.02	Construcción de contenes en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martínez hasta la C/Sánchez (14.23 ml)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	28.46	ml	946.78	26,945.36	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	28.46	26945.36	100.00%	28.46	26,945.36	100.00%

4.11	Construcción de aceras en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (3.46*0.75)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	6.92	m^2	921.53	6,376.99	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.92	6376.99	100.00%	6.92	6,376.99	100.00%
4.12	Construcción de contenes en la C/ Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (15.67 ml)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	31.34	ml	946.78	29,672.09	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	31.34	29672.09	100.00%	31.34	29,672.09	100.00%
4.13	Construcción de aceras en la C/ Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (22.03*0.75)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	44.06	m^2	921.53	40,602.61	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	44.06	40602.61	100.00%	44.06	40,602.61	100.00%
4.14	Construcción de contenes en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (18.87 ml)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	37.74	ml	946.78	35,731.48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	37.74	35731.48	100.00%	37.74	35,731.48	100.00%
4.15	Construcción de aceras en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (5.52*0.75)*2 **NOTA: C/11(desde la C/8 hasta la Cañada**	11.04	m^2	921.53	10,173.69	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11.04	10173.69	100.00%	11.04	10,173.69	100.00%
	Construcción de contenes en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (25.22 ml)*2 **Nota: C/11 /(desde la C/8 hasta la cañada)**	50.44	ml	946.78	47,755.58	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	50.44	47755.58	100.00%	50.44	47,755.58	100.00%
					220,240.75											**220,240.75**	
	PARTIDA ADICIONAL POR EXCESO DE VOLUMETRIA																
III	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION**																
3.01	Relleno en caliche para aceras en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martínez hasta la C/Sánchez (20.00*0.25*0.15) **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	0.75	m^3	650.00	487.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.75	487.50	100.00%	0.75	487.50	100.00%
3.02	Telford para contenes en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martínez hasta la C/Sánchez (20.00*0.45*0.13) **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	1.17	m^3	2,344.26	2,742.78	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.17	2742.78	100.00%	1.17	2,742.78	100.00%
3.03	Relleno en caliche para aceras en la C/Sánchez desde la C/Santa fe hasta la C/Napoleón (35.00*0.70*0.05)+(14.00*0.50*0.05) **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	1.58	m^3	650.00	1,023.75	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.58	1023.75	100.00%	1.58	1,023.75	100.00%
3.04	Telford para contenes en la C/Sánchez desde la C/Santa Fe hasta la C/Napoleón (35.00*0.45*0.05)+(14.00*0.45*0.05) **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	1.10	m^3	2,344.26	2,584.55	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.10	2584.55	100.00%	1.10	2,584.55	100.00%
3.05	Relleno en caliche para aceras en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (29.00*0.55*0.07) + (25.00*0.30*0.07) **Nota: C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	1.64	m^3	650.00	1,066.98	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.64	1066.98	100.00%	1.64	1,066.98	100.00%
	Telford para contenes en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (29.00*0.45*0.07) + (25.00*0.45*0.07) **Nota: C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	1.70	m^3	2,344.26	3,987.59	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.70	3987.59	100.00%	1.70	3,987.59	100.00%
3.09	Relleno en caliche para aceras en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (55.00*0.60*0.05) **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	1.65	m^3	650.00	1,072.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.65	1072.50	100.00%	1.65	1,072.50	100.00%
3.10	Telford para contenes en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (55.00*0.45*0.08) **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	1.98	m^3	2,344.26	4,641.63	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.98	4641.63	100.00%	1.98	4,641.63	100.00%

3.13	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (30.00*0.27*0.10) **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	0.81	m^3	650.00	526.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.81	526.50	100.00%	0.81	526.50	100.00%
3.14	Telford para contenes en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (30.00*0.45*0.05) **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	0.68	m^3	2,344.26	1,582.38	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.68	1582.38	100.00%	0.68	1,582.38	100.00%
3.15	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (23.00*0.64*0.25) **NOTA: C/11 (desde la C/8 hasta la Cañada**	3.68	m^3	650.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.68	2392.00	100.00%	3.68	2,392.00	100.00%
3.16	Telford para contenes en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (23.00*0.45*0.20) **NOTA: C/11 (desde la C/8 hasta la Cañada**	2.07	m^3	2,344.26	4,852.62	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.07	4852.62	100.00%	2.07	4,852.62	100.00%
					26,960.77											**26,960.77**		
XI	**PARTIDA ADICIONAL PRELIMINARES (NO PRESUPUESTADA)**																	
11.01	Corte de terreno en la C/ 3ra desde la C/ #8 hasta la C/ #4 (16.75*15.50*0.30)	77.89	m^3	245.00	19,082.44	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	77.89	19,082.44	100.00%	77.89	19,082.44	100.00%
11.02	Corte de 3 arboles JOBO en la C/ #4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)	1.00	P.A	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	5,000.00	100.00%	1.00	5,000.00	100.00%
11.03	Desmonte de palizada en calle #4,calle #5, calle #8, calle #9, calle #11	21.00	ml	550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	21.00	11,550.00	100.00%	21.00	11,550.00	100.00%
					35,632.44											**35,632.44**		
	Sub-Total de ADICIONALES				**961,996.69**											**961,996.69**		
	Sub-Total General				**5,246,840.24**											**5,246,840.22**		
B	*GASTOS INDIRECTOS:*								*GASTOS INDIRECTOS DE ADICIONALES:*									
1.000	*DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. CIVIL.*			*10.000%*						96,199.669						524,684.022		
1.001	*GASTOS ADMINISTRATIVOS.*			*3.000%*						28,859.901						157,405.207		
1.002	*SEGUROS Y FIANZAS.*			*2.500%*						24,049.917						131,171.006		
1.003	*LIQUIDACIÓN Y PRESTS . LABORALES. Ley 686*			*1.000%*						9,619.967						52,468.402		
1.004	*CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus dependencias*			*0.100%*						961.997						5,246.840		
1.005	*ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo I)*			*18.000%*						17,315.940						94,443.12		
	Total Gastos Indirectos									**177,007.39**						**965,418.60**		
	TOTAL CUBICADO HASTA LA FECHA															**6,212,258.82**		
	TOTAL DE CUB. 1															**4,061,088.20**		
	TOTAL DE CUB. 2															**882,740.42**		
	TOTAL DE CUB. 3 Y FINAL															**1,288,430.20**		

Villa progreso

→ Desmonte de palizada
en la c/4, 5, 9 y 11

L = 21 ml

	Amortizacion 20% de la CUB. 3 Y FINAL															257,568.64	
	MONTO ADICIONAL CUB. 3 Y FINAL															1,139,004.00	
	TOTAL MONTO CUB. 3 Y FINAL+ ADICIONAL															2,189,748.24	
	PENDIENTE A PAGAR CUB. 3 Y FINAL + ADICIONAL															490,991.14	
	TOTAL A PAGAR 1ER AVANCE A DEUDA CUB. 3 Y FINAL + ADICIONAL															1,279,657.12	

Nota: **Los datos procesados en esta cubicacion fueron suministrado por el supervisor de dicha obra, por tanto La presente Cubicacion se expide a total responsabilidad del Depto de Supervicion, mediante los supervisores actuantes en la misma.-**

Preparado Por

Joisy Castillo Mañon
Enc. del Depto. De Cubicacion

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
DEPTO. DE CUBICACIONES
DGOP
Prov. Sto. Dgo. R.D.

Revisado por:

Sr. Oscar Mala Frias
Enc. de Supervicion

Aprobado Por

ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
Contratista

Dado Conformidad por:

Ing. Francisco Antonio Suarez
Supervisor del AMA

Aprobado por:

Ing. Angela M. Diaz Adrian
Director de la Direccion de Obras Publicas Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL
DE OBRA PUBLICAS

Escaneado con CamScanner

JUNTA DE VECINOS
Villa Progreso II
Barrio Villa Progreso II, Municipio Los Alcarrizos
Tel. 849-885-0782 / 849-865-1027

Santo Domingo, R. D.
01 de junio del 2022

A : Alcalde Cristian Encarnación

Cortésmente nos dirigimos a nuestro exelectismo Alcalde Cristian Encarnación. Asunto: que se dé su conocimiento que los sobrantes de la calle primera (1), calle tercera (3), calle cinco (5), se van hacer la calle seis (6) ,calle siete (7) calle ocho (8) y calle nueve (9) faltante para terminar el proyecto de la primera etapa del progresoII.

Atentamente:

RAUL RODRIGUEZ MORONTA
Presidente Junta de Vecinos

KEYLA FELIZ CARRASCO
Secretaria Junta de Vecinos

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario.
Dirección de Obras Públicas Municipal

DATOS PARA CUBICACION

Nombre del Proyecto: Construcción de Calles, Contenes y Aceras.

Sector: Villa Progreso (Liga)

Ubicación: Los Alcarrizos, Santo Domingo

Nombre de Contratista: Antonio Hilario

Contrato No.

Cubicación No. General **Fecha:** 10-08-22

Supervisor: Ing. Francisco Antonio Guerra


OBSERVACIONES:

Han realizado un buen trabajo en Sector de Villa Progreso.

Ing.

05-08-22.

Medición de los Costenes y Aceras del Sector Villa Progreso.

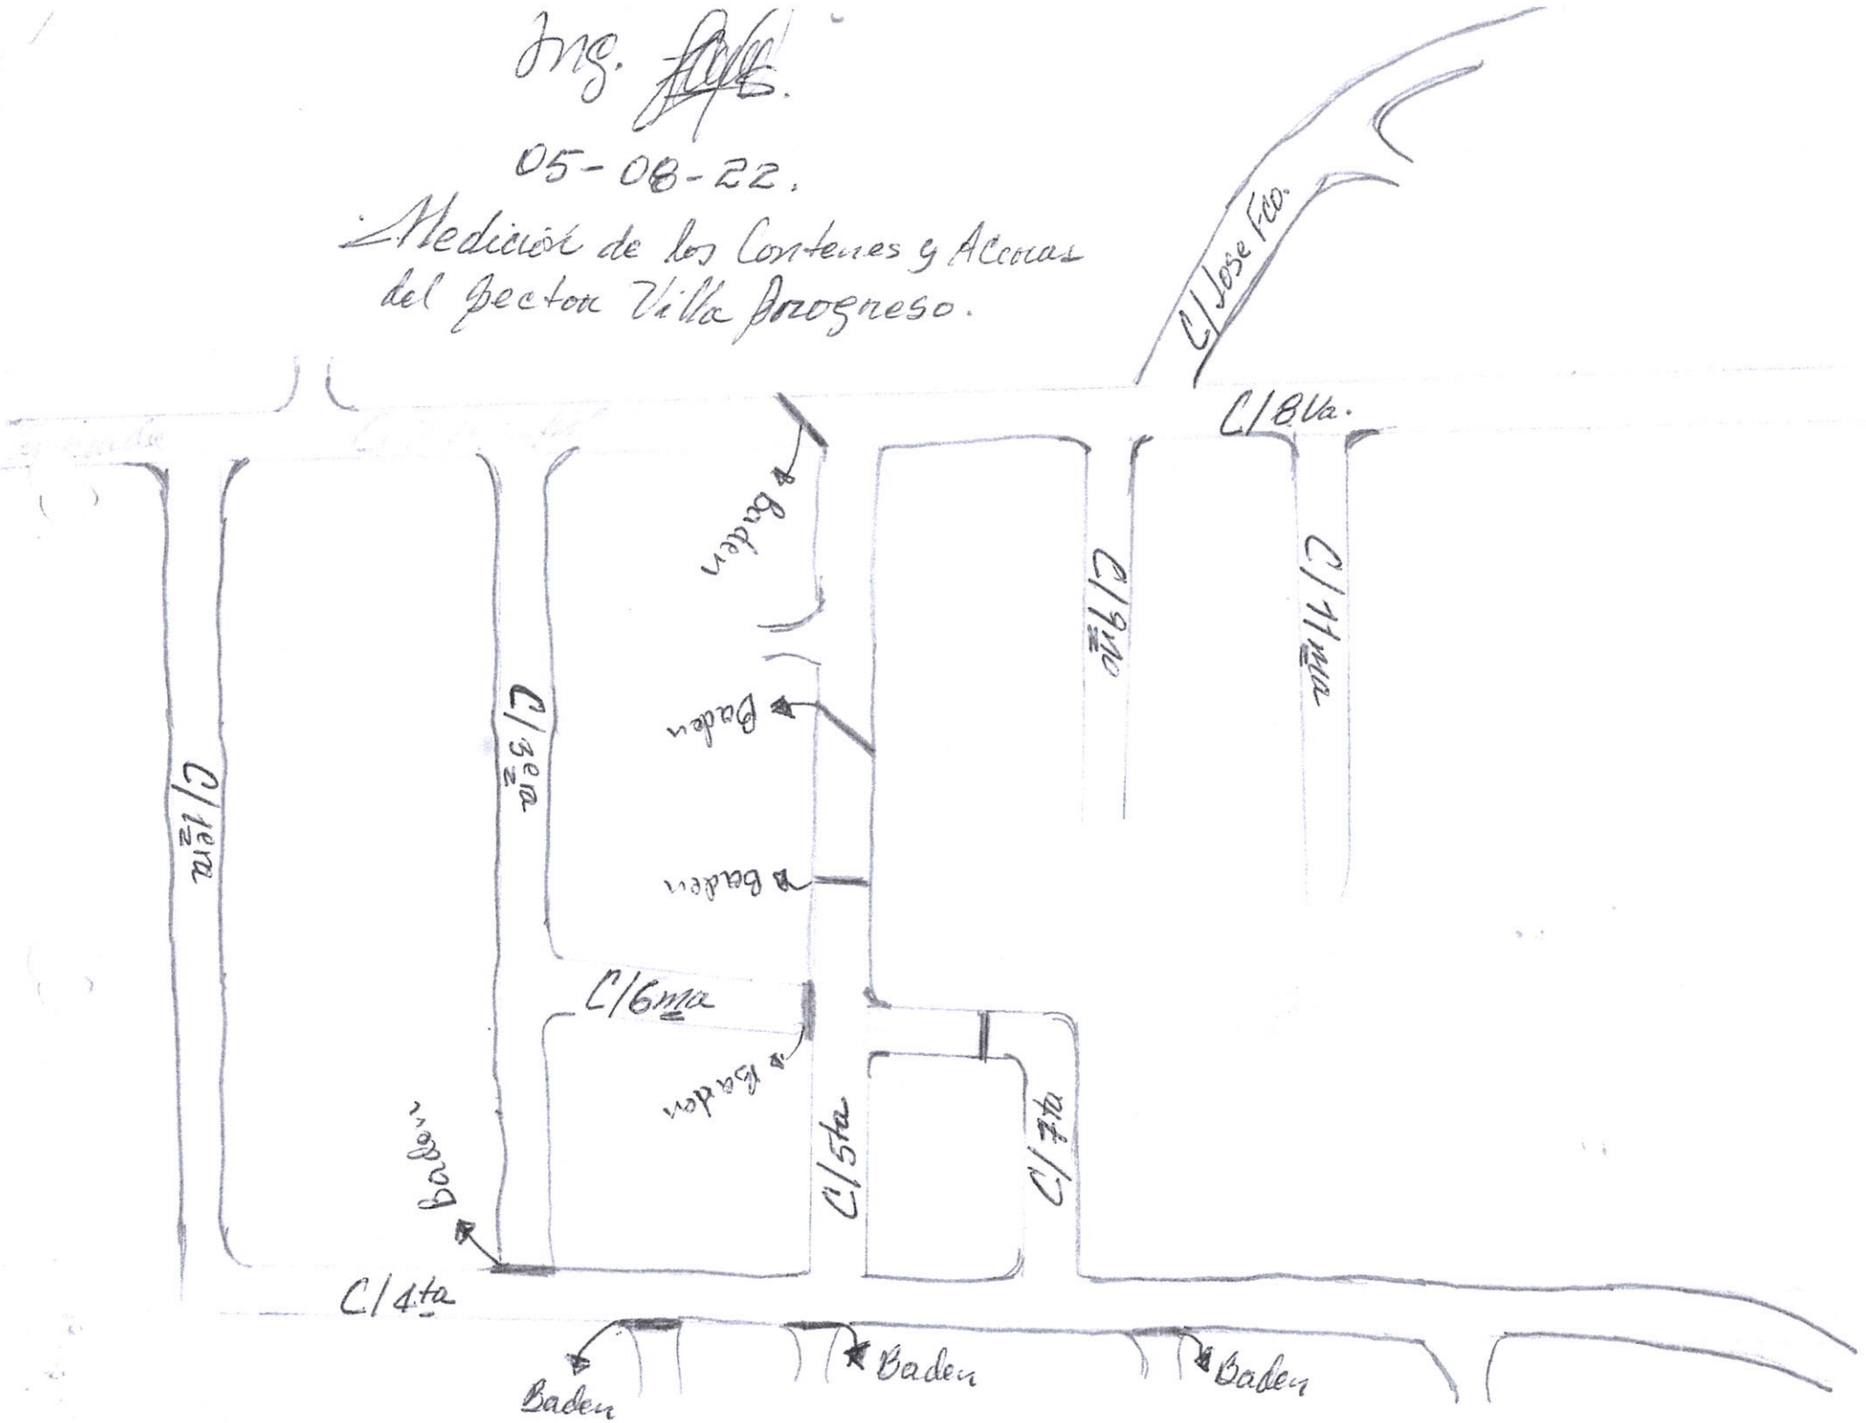

- Calle 1era; desde la C/#8; hasta C/#4.

LDd = Contén

55 + 37 + 56 = 148mL

LDI =

44.40 + 10.20 + 51.10 + 14.20 =

= 119.9 ≅ 120mL

Total = 267.9 mL

Acera

55 * 1.00mts = 55 m²

37 * 0.85mts = 31.45 m²

56 * 0.40 mts = 22.40m²

Total = 108.85 m²

Acera

44.40 * 0.80 = 35.96m²

10.20 * 0.80 = 8.16 m²

51.10 * 1.10 = 56.21 m²

14.20 * 0.75 = 10.65 m²

Total = 114.98 m²

- Calle 3era; desde la C/#8; hasta la C/#4.

Contén

LDd = 71.30 + 52.70 = 124 mL

LDI = 43.30 + 20.9 + 40.30 + 21.20 = 125.70 mL

Acera

* 71.30 * 1.00 = 71.30 m²

52.70 * 1.00 = 52.70 m²

Total = 124.10 m²

* 43.3 * 0.85 = 36.81 m²

20.9 * 1.00 = 20.80 m²

40.30 * 0.65 = 26.20 m²

Total = 83.91 m²

- Calle 4ta; desde la C/1era.

Contén:

LDd = 98 + 34.5 + 24.8 + 27 + 13.4 + 15.40 ...

+ 26.8 + 18.9 = 258.80 mL

LDI = 93 + 43.5 + 10.8 + 45 + 34 = 224.30 mL

Acera LDd

98 * 1.3 = 127.4 m²

34.5 * 1.5 = 51.75 m²

24.8 * 1.5 = 37.20 m²

27.20 * 1.00 = 27.20 m²

15.40 * 0.5 = 7.7 m²

26.80 * 0.7 = 18.76 m²

total = 285.13 m²

Acera LDI

93 * 1.00 = 93 m²

43.5 * 0.80 = 34.8 m²

10.8 * 2.00 = 21.6 m²

45 * 0.80 = 36.00 m²

34 * 0.85 = 28.90 m²

Total = 214.30 m²

-Calle 5; desde la C/#4; hasta la C/ 3.

LDI Contem

30.50 + 13.80 + 33.70 + 56.90 = 144.90 mL (134.90)

LDd = 108.30 + 31.00 = 139.30 mL

Total = 274.20 mL

274.20

Acera

30.5 * 0.8 = 24.4 m²

13.8 * 2.2 = 30.36 mL

56.9 * 0.9 = 51.21 m²

33.7 * 0.8 = 26.96 m²

408.3 * 1.00 = 108.30 m²

31.00 * 0.85 = 29.45 m²

Total = 270.27 m.

270.68

- Calle 6ta; desde la C/3era; hasta la C/5ta.

LDd = 92 mL

LDI = 91 mL

183 mL

Acera

92 * 1.25 = 115 m²

91 * 1.00 = 91.00 m²

Total = 206.00 m²

- Calle 7ma; desde la C/#5; hasta la C/#4:

Contem LDd = 25.3 + 19.5 + 22.2 = 67 mL

Contem: LDI = 24.4 + 31.40 = 55.8 mL

122.8 mL

Acera

25.3 * 0.85 = 21.51 m²

19.5 * 0.75 = 14.63 m²

24.4 * 1.00 = 24.4 m²

31.4 * 1.10 = 37.84 m²

Total = 98.38 m²

- Calle 8; desde la Entrada hasta final.

Contem:

LDd = 33.10 + 93.8 + 10.70 + 17.4 + 17.7 + 23.2 = 215.9 mL

LDI = 172 + 25.4 + 34.9 = 232.3 mL

Total = 448.20 mL

"Acera LDd"

33.10 * 1.00 = 33.10 m²

93.80 * 0.90 = 84.42 m²

10.70 * 2.95 = 31.57 m²

17.4 * 1.10 = 27.40 m²

17.70 * 1.20 = 33.24 m²

23.20 * 1.00 = 23.20 m²

Total = 232.93 m²

"Acera LDI"

172 * 1.00 = 172 m²

25.4 * 1.00 = 25.4 m²

34.9 * 1.00 = 34.9 m²

Total = 232.30 m²

Total = 465.20 m²

- Calle 9; desde la C/#8; hasta el final

LDd; Corten 63.20mL

LDI; Corten 66.00mL

T29.20mL

Acera

63.20 * 1.10 = 69.52 m²

66.00 * 1.00 = 66.00 m²

Total = 135.52 m²

- Calle #11; desde la C/#8; hasta el final.

Corten LDd = 71.80 mL

Corten LDI = 19.10 + 32 + 19 = 70.10 mL

Acera

71.8 * 0.95 = 68.21 m²

19.10 * 0.90 = 17.19 m²

19.00 * 0.90 = 17.10 m²

Total = 102.50 m²

- Calle Jose Fco. Peña Gomez; desde la C/#8.

Corten LDd = 58.40 mL

Corten LDI = 128 mL

T186.40 mL

Acera

58.4 * 1.00 = 58.40 m²

128.00 * 1.00 = 128.00 m²

Total = 186.40 m²

186.40

"Cub...ción General" 10-08-22

Construcción de Contenes y Aceras.

C/1era
Conten = 267.9 mL
Acera = 223.48 m²

C/2da.
Conten = 448.20 mL
Acera = 465.20 m²

C/3era.
Conten = 148.70 mL
Acera = 331.00 m²

C/4ta.
Conten = 471.7 mL
Acera = 488.03 m²

C/5ta.
Conten = 284.20 mL
Acera = 265.27 m²

C/6ta.
Conten = 183 mL
Acera = 206 m²

C/7ma.
Conten = 122.80 mL
Acera = 98.38 m²

C/8va.
Conten = 448.20 mL
Acera = 465.20 m²

C/9na.
Conten = 129.20 mL
Acera = 135.52 m²

C/11ma.
Conten = 141.80 mL
Acera = 102.50 m²

C/José Fco. Peña Gomez
Conten = 186.40 mL
Acera = 166.40 m²

"Badenes"

#1; C/#4

2.07 * 8.80 mts. Intersección de la C/#3 con la C/#4.

#2; C/#4

11.40 * 2.00 mts. Frente a la casa del señor que recibe los materiales

#3; C/#4

2.30 * 14.60 mts. Frente a la Iglesia Remanso.

#4; C/#4

2.07 * 8.90 mts. Frente al Colmado Nuelyeno.

#5; C/#6

2.00 * 5.00 mts. Intersección de la C/#6 con la C/#7.

#6; C/#7

8.10 * 2.00 mts. Frente de una casa en construcción.

#7; C/#5

2.20 * 5.10 mts. Debajo de un árbol.

#8-1.97 * 5.30 mts. Al lado del colmado.

#9; C/Principal

2.75 * 9.20 mts. Frente a la ferretería.

"V. la Progreso"

C/ Sore' Francisco Peña Gómez.

Desde la C/#8 hasta la Banda.

Nota: Esta calle es para compensación de los metros faltantes para cerrar el Presupuesto 100%.


Llevó excavación y Relleno.

* Construcción de Acera. 180.07 m²

$-(2.70*0.90)+(11.6*0.90)+(5.1(0.85+0.70)+(5.7*1.0)$
$+(17.8(0.9+1.0)+(12.5*1.05)+(11.6(0.85+1.0)+(1.6*1.0)$
$+(8.50*0.8)+(10.90*0.60)+(18.3*(1.0+0.95)+(4.70*1.50)$
$+(2.20*1.0)+(8.30(0.40+0.65)+(3.10*1.0)+(5.55*0.90)$
$+(1.10*1.0)+(2.5*1.0)+(8.20(1.10+2.40)+(9*1.0)+(5.0*1.0)$
$+(6.0*1.0)+(6.8*1.2)+(11.90*0.9)+(7.8(0.8+0.90)=$

* Construcción de Contenes:

186.02 ml.

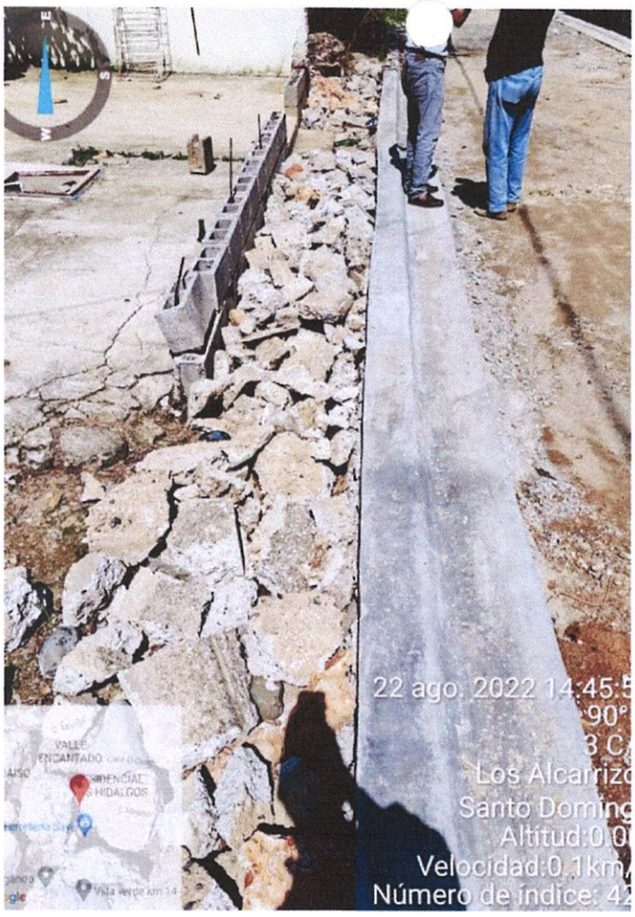
22 ago. 2022 14:45:5
90°
Los Alcarriz
Santo Doming
Altitud:0.0
Velocidad:0.1km/
Número de índice: 42




4 ago. 2022 10:46:5
79°
Los Alcarriz
Santo Doming
Altitud:71.0
Velocidad:0.6km/
Número de índice: 18


4 ago. 2022 10:45:1
280°
Los Alcarriz
Santo Doming
Altitud:18.0
Velocidad:0.0km/
Número de índice: 18









25 jul. 2022 10:11:0
285°
Los Alcarrizo
Santo Doming
Altitud:16.0
Velocidad:0.0km/
Número de índice: 4



4 ago. 2022 10:86:1
160°
Los Alcarrizo
Santo Doming
Altitud:28.0
Velocidad:0.3km/
Número de índice: 18


25 jul. 2022 10:04
250°
Los Alcarrizo
Santo Doming
Altitud:36.0
Velocidad:0.0km/
Número de índice:
Campamento Buenas Nuevas

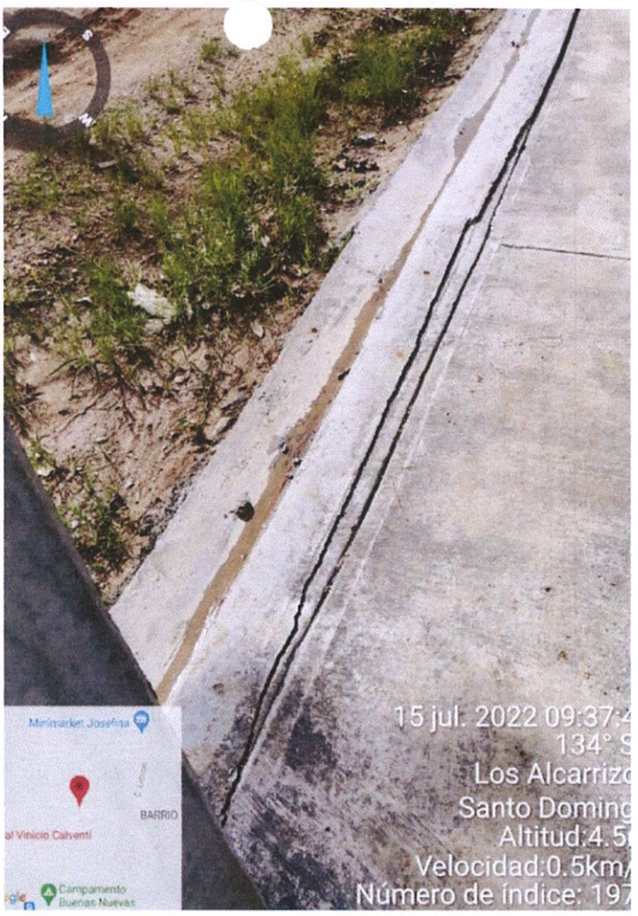

15 jul. 2022 09:37:4
134° S
Los Alcarrizo
Santo Doming
Altitud:4.5
Velocidad:0.5km/
Número de índice: 197
Minimarket Josefina
BARRIO
Campamento Buenas Nuevas

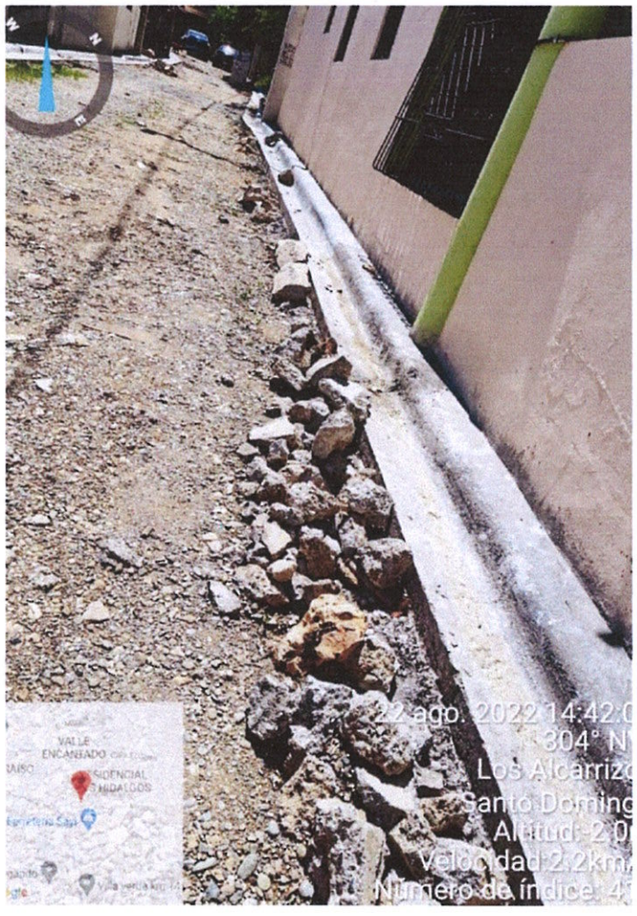

22 ago. 2022 14:42:0
304° N
Los Alcarrizo
Santo Doming
Altitud: 2.0
Velocidad:2.2km/
Número de índice: 47
VALLE ENCANTADO

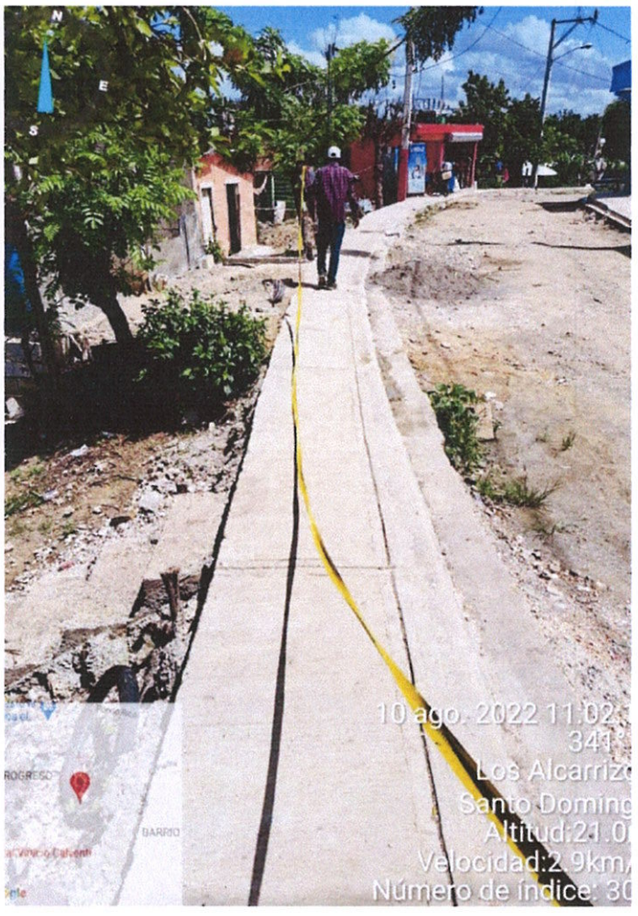
10 ago. 2022 11:02:
341°
Los Alcarrizo
Santo Doming
Altitud:21.0
Velocidad:2.9km/
Número de índice: 30
BARRIO

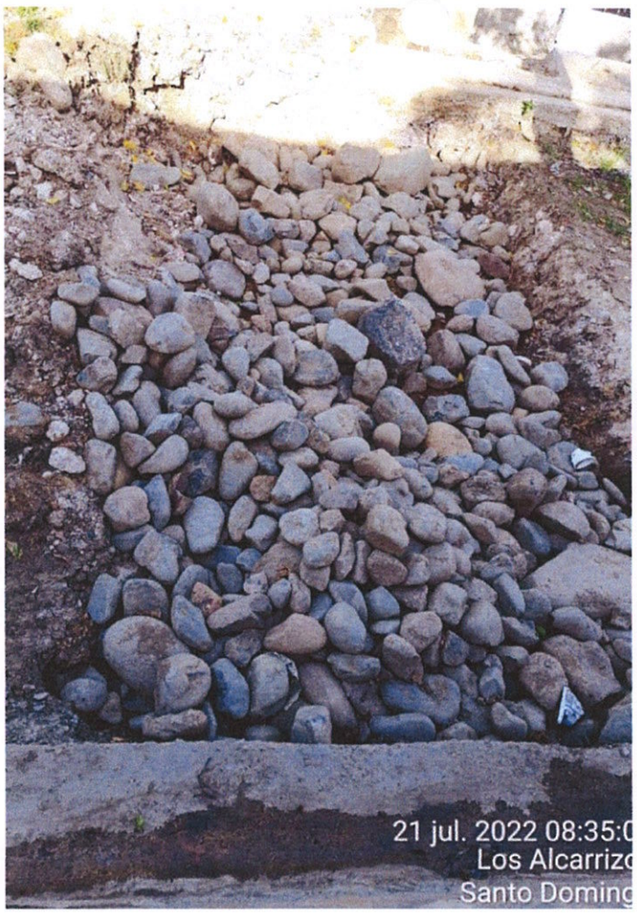
21 jul. 2022 08:35:0
Los Alcarrizo
Santo Doming



10 ago. 2022 11:01:
61° N
Los Alcarriz
Santo Doming
Altitud:23.0
Velocidad:0.0km/
Número de índice: 3

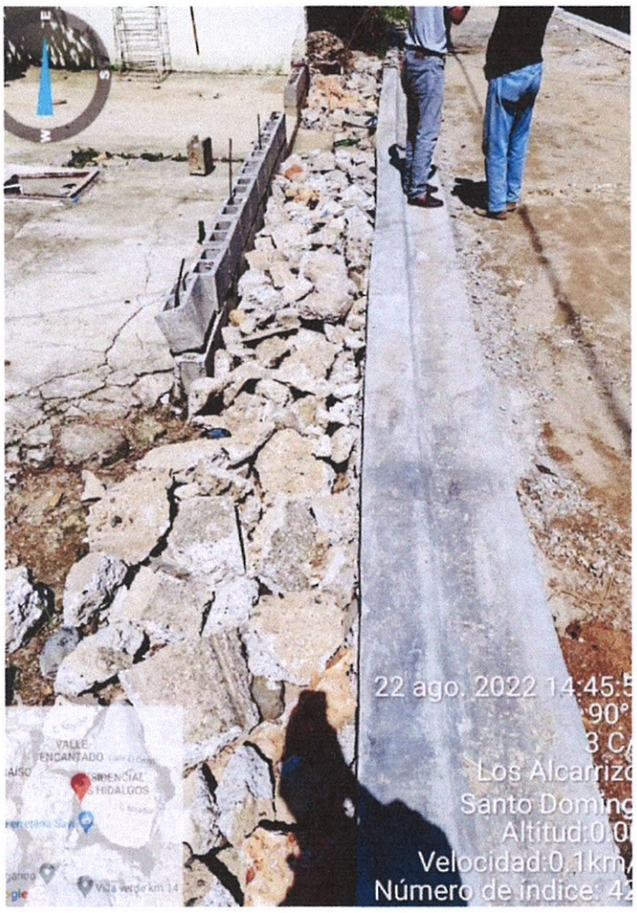
22 ago. 2022 14:45:5
90°
3 C
Los Alcarrizo
Santo Doming
Altitud:0.0
Velocidad:0.1km/
Número de índice: 42

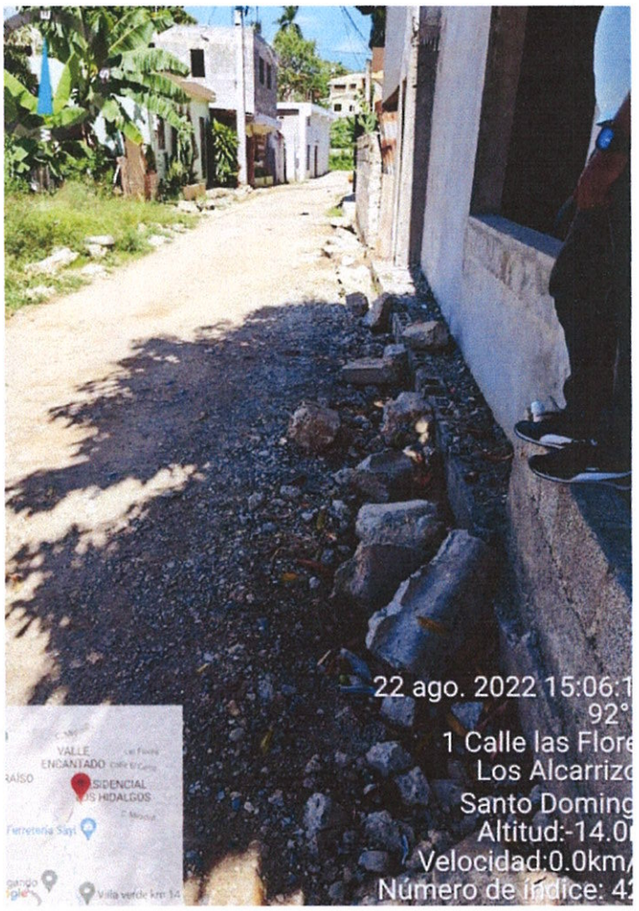
22 ago. 2022 15:06:1
92°
1 Calle las Flore
Los Alcarrizo
Santo Doming
Altitud:-14.0
Velocidad:0.0km/
Número de índice: 4


10 ago. 2022 10:54:3
219° S
Los Alcarrizo
Santo Doming
Altitud:22.0
Velocidad:0.0km/
Número de índice: 3


10 ago. 2022 11:05:1
67° N
Los Alcarrizo
Santo Doming
Altitud:13.0
Velocidad:0.0km/
Número de índice: 3

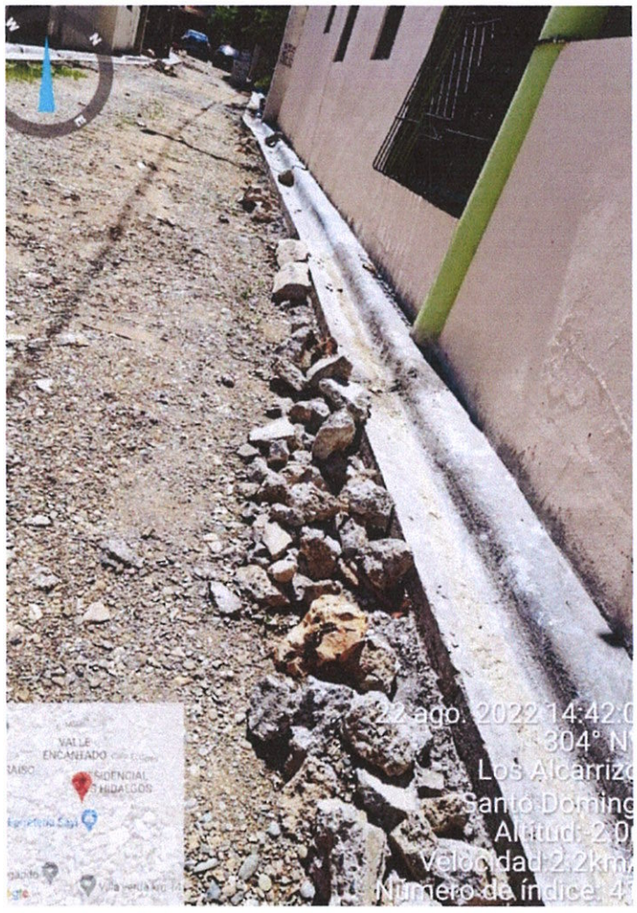
22 ago. 2022 14:42:0
304° N
Los Alcarrizo
Santo Doming
Altitud:-2.0
Velocidad:2.2km/
Número de índice: 4


22 ago. 2022 15:51:5
4°
Los Alcarrizo
Santo Doming
Altitud:1.0
Velocidad:0.7km/
Número de índice: 4

Fecha	Concepto	Valor
13/10/2022	P/R PAGO A FAVOR DE ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO, POR CONCEPTO DE CUBICACION #3 Y FINAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, C NTENES, BADENES Y CANALETAS, EN LAS DIFERENTES CALLES EN VIL	1,598,716.60

7261

Clave Municipal No.

No. 018740

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
PROGRAMA DE INVERSION

DIA	MES	AÑO
13	10	2022

RNC: 430-04253-6
DO28BRRD00000000002440009274

0017003

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO **RD$** **1,598,716.60

*** UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS CON 60/100 ***

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

I Rodriguez

FIRMA(S)

⑈018740⑈ 244122721310244000927 4⑈ 28

Cap. No. _____ *Sub-Objeto* _____ *Fondo* _____ *Comprobante No.* _____ *Fecha* _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
No. Comprobante . : 2204481 P/R PAGO A FAVOR DE ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO, POR CONCEPTO DE CUBICACION #3 Y FINAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y CANALETAS, EN LAS DIFERENTES CALLES EN VILLA PROGRESO DEL SCT		**Estructura Clasific.** 0011010097 272401 0011010096 272401 0011010098 272401 A	1,080,322.69 163,393.93 454,999.98

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

TOTAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL L LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2204481
FECHA 13/10/2022
SECUENCIAL: 4542

TIPO COMPROBANTE: 2204480 **Etapa:** Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 5066 **RNC/CED/PAS:** 00107372831
BENEFICIARIO: ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R PAGO A FAVOR DE ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO, POR CONCEPTO DE CUBICACION #3 Y FINAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y CANALETAS, EN LAS DIFERENTES CALLES EN VILLA PROGRESO DEL SCTOR (6) CHAVON, EN LOS ALCARRIZOS. SEGÚN COMUNICACIÓN D/F 13 DE OCTUBRE 2022. ANEXO***UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHOS SETECIETOS DIESISEIS PESOS CON 60/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0096	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	63,393.93
00 11 01 0097	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,161,263.19
					Menos las siguientes Retenciones	
00 11 01 0097	272401	40	9992	103	MENOS 2% De: 1,161,263.19	(23,225.26)
00 11 01 0097	272401	40	9992	103	CODIA 0.10 De: 1,161,263.19	(5,246.84)
00 11 01 0097	272401	40	9992	103	FOPETCONS De: 1,161,263.19	(52,468.40)
00 11 01 0098	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	454,999.98
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	
					Total RD$	1,598,716.60

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2204480
FECHA 13/10/2022
SECUENCIAL: 4541

TIPO COMPROBANTE: 2204481 **Etapa:** Devengado

CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 5066 **RNC/CED/PAS:** 00107372831

BENEFICIARIO: ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO

DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R PAGO A FAVOR DE ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO, POR CONCEPTO DE CUBICACION #3 Y FINAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y CANALETAS, EN LAS DIFERENTES CALLES EN VILLA PROGRESO DEL SCTOR (6) CHAVON, EN LOS ALCARRIZOS. SEGÚN COMUNICACIÓN D/F 13 DE OCTUBRE 2022. ANEXO***UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 10/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0096	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	63,393.93
00 11 01 0097	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,161,263.19
00 11 01 0098	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	454,999.98
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	
					Total RD$	1,679,657.10

CK No.	Monto	Fecha

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE LOS ALCARRIZOS
GESTIÓN 2020-2024

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

DIRECCION ADMINISTRATIVA

13 de octubre del 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCION FINANCIERA
AUTORIZADO
Firma
Fecha 13/10/2022

Al : Dirección Financiera

Vía : Departamento De Auditoria

De la : Dirección Administrativa

Asunto : Pago de avance a deuda cubicación **#3**

Distinguidos Señores:

Cortésmente le estamos solicitando el pago a favor de**: Antonio Rodríguez Hilario.**

Codia: 21826 Contrato No. **021/2022**. RNC: **001-0737283-1**

Monto a pagar**: RD$1,679,657.10 (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Pesos Con 10/100).**

Por concepto de Pago avance a deuda cubicación #3, para la construcción de aceras, contenes, badenes y canaletas, en diferentes calles en villa Progreso del sector (6), Chavón, en los Alcarrizos.

Atentamente,

Lcda. Luisana Guzmán
Administrativa

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Públicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
4 de Julio 2022

Contrato No: 021-2022
No. Oficio: 006-2022

Al : **Sr. Cristian Encamación**
Alcalde del AMA

Vía : **Lic. Luisana Guzmán**
Directora de Administrativo

Del : **Ing. Freddy M. Dini Lebrón**
Director de Obras Publicas Municipal

Anexo : Fotos y Soporte Técnico.

Asunto : **Solicitud Pago de Cub.2**

Muy cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el pago de la Cub.2 Correspondiente Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sánchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte, C/Boy scout, en el sector Villa progreso, Chavón (06). Por un monto de **RD$445,275.59 (Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Cinco con 59/100).**

El mismo a nombre de **Sr. Antonio Rodriguez Hilario,** Portador de la cédula de Identidad y electoral **No.001-0737283-1.**

Sin otro particular se despide:

Atentamente:

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario.

Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
4 de Julio 2022

Al	:	**Sr. Cristian Encarnación** Alcalde del AMA
Vía	:	**Lic. Luisana Guzmán** Directora del Departamento Administrativo
Del	:	**Ing. Freddy M. Dini Lebrón** Director de Obras Publicas Municipal
Asunto	:	Informe de inspección a nombre **ING.ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO** portador de la cedula de identidad y electoral **No. 001-0737283-1.**
Anexo	:	Presupuesto Autorizado, Fotos y Soporte T.

Muy cortésmente, me dirijo a usted para remitirle el informe de la Inspección de la cub.2 perteneciente al contrato (021-2022) correspondiente a la correspondiente Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sánchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte, C/Boy scout, en el sector Villa progreso, Chavón (06). . Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. Estas partidas se encuentran ejecutadas en un 74.33%

Este informe fue suministrado, evaluado y autorizado por la parte interesadas:

Ing. Francisco Antonio Suarez
Supervisor de Obras

ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
Contrastista

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipal

"AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS"
(AMA)
Dirección de Obras Públicas Municipales

Contratista:	**ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO**
Obras:	Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sánchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte, C/Boy scout, en el sector Villa progreso, Chirvón (D8)
Codigo	AMA17-OP1221-P32-M
Sector:	Villa progreso, Chirvón (D8)
Cub. No.	2
Fecha:	4 de Julio 2022

No. Contrato 021 2022

Periodo Junio Julio 2022

Monto Contratado	6,212,299.63
Monto a Ejecutar:	5,246,840.24
Monto a ejecutar mas Impuestos:	6,212,299.63
Avance Inicial:	1,242,459.93
Avance de Obra:	74.33%

	ETAPA I	PRESUPUESTADO				CUBICACION No.1 (Anterior)			CUBICACION No.2 (Actual)			CUBICACION ACUMULADA		
	PARTIDAS	**Cantidad**	**Unidad**	**Costo Uni.**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**%**	**Cantidad**	**Valor**	**%**	**Cantidad**	**Valor**	**%**
1.01	Valla informativa de la obra	1.00	Ud	15,000.00	15,000.00 **15,000.00**	1.00	15000.00 **15,000.00**	100.00%	0.00	0.00 **0.00**	0.00%	1.00	15000.00 **15,000.00**	100.00%
II	**MOVIMIENTO DE TIERRA**													
2.01	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martinez hasta la C/Sánchez (122.87*1.00*0.10)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	24.57	m^3	365.00	8,969.51	12.41	4531.40	50.52%		0.00	0.00%	12.41	4,531.40	50.52%
2.02	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martinez hasta la C/Sánchez (122.87*0.50*0.10)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	12.29	m^3	365.00	4,484.76	12.29	4484.76	100.00%		0.00	0.00%	12.29	4,484.76	100.00%
2.03	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Sánchez desde la C/Santa fe hasta la C/Napoleón (253.66*1.00*0.10)*2 **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	50.73	m^3	365.00	18,517.18	40.93	14938.55	80.67%		0.00	0.00%	40.93	14,938.55	80.67%
2.04	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Sánchez desde la C/Santa Fe hasta la C/Napoleón (253.66*0.50*0.10)*2 **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	25.37	m^3	365.00	9,258.59	25.05	9144.99	98.77%		0.00	0.00%	25.05	9,144.99	98.77%
2.05	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud Homme (253.66*1.00*0.10)*2 **Nota: C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	50.73	m^3	365.00	18,517.18	50.73	18517.18	100.00%		0.00	0.00%	50.73	18,517.18	100.00%
2.06	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud Homme (253.66*0.50*0.10)*2 **Nota: C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	25.37	m^3	365.00	9,258.59	23.01	8400.41	90.73%		0.00	0.00%	23.01	8,400.41	90.73%
2.07	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.84*1.00*0.10)*2	32.99	m^3	366.00	12,040.62	0.00	0.00	0.00%	19.51	7121.15	59.14%	19.51	7,121.15	59.14%

2.08	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*0.50*0.10)*2	16.49	m³	365.00	6,020.31	0.00	0.00	0.00%	12.31	4493.15	74.63%	12.31	4,493.15	74.63%
2.09	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron Juan Pablo Duarte (289.63*1.00*0.10)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	57.93	m³	365.00	21,142.99	20.52	7491.17	35.43%	0.00	0.00%	20.52	7,491.17	35.43%
2.1	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron Juan Pablo Duarte (289.63*0.50*0.10)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	28.96	m³	365.00	10,571.50	27.46	10022.83	94.81%	0.00	0.00%	27.46	10,022.83	94.81%
2.11	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	6.86	m³	365.00	2,503.72	6.69	2440.75	97.49%	0.00	0.00%	6.69	2,440.75	97.49%
2.12	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.50*0.10)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	4.57	m³	365.00	1,669.15	4.57	1669.15	100.00%	0.00	0.00%	4.57	1,669.15	100.00%
2.13	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	6.86	m³	365.00	2,503.72	4.72	1721.88	68.77%	0.00	0.00%	4.72	1,721.88	68.77%
2.14	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.50*0.10)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	4.57	m³	365.00	1,669.15	4.57	1669.15	100.00%	2.14	781.10	46.80%	6.71	2,450.25	146.80%
2.15	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/11 (desde la C/8 hasta la Cañada**	6.86	m³	365.00	2,503.72	5.40	1969.67	78.67%	1.46	534.04	21.33%	6.86	2,503.67	100.00%
2.16	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.50*0.10)*2 **NOTA: C/11(desde la C/8 hasta la Cañada**	4.57	m³	365.00	1,669.15	4.57	1669.15	100.00%	0.00	0.00%	4.57	1,669.15	100.00%
					131,299.51		**86,670.98**			**12,529.44**			**101,600.42**	
III	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION**													
3.01	Relleno en caliche para aceras en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martinez hasta la C/Sánchez (122.87*1.00*0.10)*2 **Nota; C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	24.57	m³	650.00	15,973.10	12.41	8069.61	50.52%	0.00	0.00%	12.41	8,069.61	50.52%
3.02	Telford para contenes en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martinez hasta la C/Sánchez (122.87*0.45*0.10)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	12.29	m³	2,344.26	28,803.92	12.29	28803.92	100.00%	0.00	0.00%	12.29	28,803.92	100.00%
	Relleno en caliche para aceras en la C/Sánchez desde la C/Santa fe hasta la C/Napoleón (253.66*1.00*0.10)*2 **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	50.73	m³	650.00	32,975.80	40.93	26602.90	80.67%	0.00	0.00%	40.93	26,602.90	80.67%
3.04	Telford para contenes en la C/Sánchez desde la C/Santa Fe hasta la C/Napoleón (253.66*0.45*0.10)*2 **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	22.83	m³	2,344.26	53,518.05	22.55	52861.38	98.77%	0.00	0.00%	22.55	52,861.38	98.77%
3.05	Relleno en caliche para aceras en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*1.00*0.10)*2 Nota **C/6 (desde la C/napoleon hasta el final)**	50.73	m³	650.00	32,975.80	50.73	32975.80	100.00%	0.00	0.00%	50.73	32,975.80	100.00%
3.06	Telford para contenes en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*0.45*0.10)*2 **Nota: C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	22.83	m³	2,344.26	53,518.05	20.71	48557.46	90.73%	0.00	0.00%	20.71	48,557.46	90.73%
3.07	Relleno en caliche para aceras en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*1.00*0.10)*2	32.99	m³	650.00	21,442.39	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00		0.00%
3.08	Telford para contenes en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*0.45*0.10)*2	14.84	m³	2,344.26	34,799.66	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00		0.00%

DHG

3.09	Relleno en caliche para aceras en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron Juan Pablo Duarte (289.63*1.00*0.10)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	57.93	m^3	650.00	37,651.90	20.52	13340.44	35.43%		0.00	0.00%	20.52	13,340.44	35.43%
3.1	Telford para contenes en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron Juan Pablo Duarte (289.63*0.45*0.10)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	26.07	m^3	2,344.26	61,107.12	24.71	57935.66	94.81%		0.00	0.00%	24.71	57,935.66	94.81%
3.11	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	6.66	m^3	650.00	4,458.68	6.69	4346.54	97.49%		0.00	0.00%	6.69	4,346.54	97.49%
3.12	Telford para contenes en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.45*0.10)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	4.12	m^3	2,344.26	9,648.27	4.12	9648.27	100.00%		0.00	0.00%	4.12	9,648.27	100.00%
3.13	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	6.66	m^3	650.00	4,458.68	4.72	3066.36	68.77%		0.00	0.00%	4.72	3,066.36	68.77%
3.14	Telford para contenes en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.45*0.10)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	4.12	m^3	2,344.26	9,648.27	4.12	9648.27	100.00%		0.00	0.00%	4.12	9,648.27	100.00%
3.15	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2**NOTA: C/11 (desde la C/8 hasta la Cañada**	6.66	m^3	650.00	4,458.68	5.40	3507.55	78.67%		0.00	0.00%	5.40	3,507.55	78.67%
3.16	Telford para contenes en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.45*0.10)*2**NOTA: C/11 (desde la C/8 hasta la Cañada**	4.12	m^3	2,344.26	9,648.27	4.12	9648.27	100.00%		0.00	0.00%	4.12	9,648.27	100.00%
					415,085.38		**309,012.45**			**0.00**			**309,012.45**	
IV	**HORMIGON SIMPLE**													
4.01	Construcción de aceras en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martínez hasta la C/Sánchez (122.87*1.00)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	245.74	m^2	921.53	226,456.78	124.15	114405.97	50.52%		0.00	0.00%	124.15	114405.97	50.52%
4.02	Construcción de contenes en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martínez hasta la C/Sánchez (122.87ml)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	245.74	ml	946.78	232,661.72	245.74	232661.72	100.00%		0.00	0.00%	245.74	232661.72	100.00%
4.03	Construcción de aceras en la C/Sánchez desde la C/Santa fe hasta la C/Napoleón (253.66*1.00)*2 **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	507.32	m^2	921.53	467,510.60	409.28	377159.50	80.67%		0.00	0.00%	409.28	377159.50	80.67%
4.04	Construcción de contenes en la C/Sánchez desde la C/Santa Fe hasta la C/Napoleón (253.66ml)*2 **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	507.32	ml	946.78	480,320.43	501.10	474426.90	98.77%		0.00	0.00%	501.10	474426.90	98.77%

4.05	Construcción de aceras en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*1.00)*2 **Nota: C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	507.32	m^2	921.53	467,510.60	507.32	467,510.60	100.00%		0.00	0.00%	507.32	467,510.60	100.00%
4.06	Construcción de contenes en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66ml)*2 **Nota: C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	507.32	ml	946.78	480,320.43	460.30	435,799.53	90.73%		0.00	0.00%	460.30	435,799.53	90.73%
4.07	Construcción de aceras en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*1.00)*2	329.88	m^2	921.53	303,994.32	0.00	0.00	0.00%	196.08	179,772.07	59.14%	196.08	179,772.07	59.14%
4.08	Construcción de contenes en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94ml)*2	329.88	ml	946.78	312,323.79	0.00	0.00	0.00%	246.20	233,097.24	74.63%	246.20	233,097.24	74.63%
4.09	Construcción de aceras en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63*1.00)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	579.26	m^2	921.53	533,805.47	205.24	189,132.62	35.43%			0.00%	205.24	189,132.62	35.43%
4.10	Construcción de contenes en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63ml)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	289.63	ml	946.78	274,215.89	274.60	259984.09	94.81%			0.00%	274.60	259984.09	94.81%
4.11	Construcción de aceras en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	91.46	m^2	921.53	84,283.13	89.16	82163.41	97.49%			0.00%	89.16	82163.41	97.49%
4.12	Construcción de contenes en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73ml)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	91.46	ml	946.78	86,592.50	91.46	86592.50	100.00%			0.00%	91.46	86592.50	100.00%
4.13	Construcción de aceras en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	91.46	m^2	921.53	84,283.13	82.90	57964.04	68.77%	28.56	26,318.90	31.23%	91.46	84282.94	100.00%
4.14	Construcción de contenes en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73ml)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	91.46	ml	946.78	86,592.50	91.46	86592.50	100.00%			0.00%	91.46	86592.50	100.00%
4.15	Construcción de aceras en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75)*2 **NOTA: C/11(desde la C/8 hasta la Cañada**	91.46	m^2	921.53	84,283.13	71.95	66303.86	78.67%	19.51	17,979.05	21.33%	91.46	84282.91	100.00%
4.16	Construcción de contenes en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73ml)*2 **Nota: C/11 /(desde la C/8 hasta la cañada)**	91.46	ml	946.78	86,592.50	91.46	86592.50	100.00%			0.00%	91.46	86592.50	100.00%
					4,291,746.92		**3,017,289.72**			**457,167.26**			**3,474,456.97**	
V	**HORMIGON ARMADO**													
5.01	Construcción de Baden transversal en la C/Juan Bosch (7.10*2.00)	14.20	m^2	3,198.54	45,419.27	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.02	Construcción de Baden Transversal en la C/Rosa Duarte (6.60*2.00)	13.20	m^2	3,198.54	42,220.73	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.03	Construcción de Baden en la C/Sánchez esq. C/Orquidea (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.04	Construcción de Baden en la C/Sánchez esq. C/Horacio Vazquez (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.05	Construcción de Baden en la C/la Enfermera esq. C/Sánchez (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.06	Construcción de Baden en la C/Santa Fe esq. C/Sánchez (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.07	Construcción de Baden en la C/Orlando Martinez esq. C/Orquidea (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

5.08	Construcción de Baden en la C/Orlando Martinez esq C/Horacio Vázquez (6.50*2.00)	13.00	m²	3,198.64	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.09	Construcción de Baden en la C/la Enfermera esq. C/Orlando Martinez (6.50*2.00)	13.00	m²	3,198.64	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
					378,707.14		**0.00**			**0.00**			**0.00**	
VII	**LIMPIEZA FINAL**													
6.01	Limpieza general y final	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
					15,000.00		**0.00**			**0.00**			**0.00**	
	Sub-Total General				**5,246,840.24**		**3,429,973.14**			**470,096.70**			**3,900,069.84**	
B	*GASTOS INDIRECTOS.*													
1.000	*DIRECCION TECNICA Y RESP. CIVIL.*			*10.000%*	524,684.024		342,997.314			47,009.670			390,006.98	
1.001	*GASTOS ADMINISTRATIVOS.*			*3.000%*	157,405.207		102,899.194			14,102.901			117,002.10	
1.002	*SEGUROS Y FIANZAS.*			*2.500%*	131,171.006		85,749.329			11,752.417			97,501.75	
	LIQUIDACION Y PRESTS. LABORALES. Ley 686 CODIA IX1600. Ley 6166 de 1963 para el estado y sus			*1.000%*	52,468.402		34,299.731			4,700.967			39,000.70	
1.003	*dependencias.*			*0.100%*	5,246.840		3,429.973			470.097			3,900.07	
1.005	*ITBIS (Sobre el 18% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo I)*			*18.000%*	94,443.124		61,739.517			8,461.741			70,201.26	
	Total Gastos Indirectos				**965,418.60**		**631,115.06**			**86,497.79**			**717,612.85**	
	TOTAL CUBICADO HASTA LA FECHA				**6,212,258.85**		**4,061,088.20**			**556,594.49**			**4,617,682.69**	
	Amortizacion 20% valor cubicado						**812,217.64**			111,318.90			**923,536.54**	
	TOTAL A PAGADA DE CUB. 1						**3,248,870.56**			**445,275.59**			**3,248,870.56**	
	TOTAL A PAGAR DE CUB. 2												**445,275.59**	

Nota: La presente Cubicacion se expide a total responsabilidad del Depto de Supervicion, mediante los supervisores actuantes en la misma.-

Preparado por:

Ana Deldanila Hernandez
Asistente de Presupuesto y Cubicación de OP

Revisador por:

Ing. Nikaudy Rodriguez
Enc. Del Depto. De Cubicación de OP

Aprobado Por:

ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
Contratista

Datos suministrados por:

Ing. Francisco Antonio Suarez
Supervisor del AMA

Revisador por:

Sr. Cesar Zaila Frias
Enc. de Supervición

Aprobado Por:

Ing. Freddy M. Diaz Lebron
Director de la Dirección de Obras Publicas Municipal

Parc cultivación #2

Urb. Villa Progreso

Procesado 4/7/2022 LHB

→ c/3 (c/Hermanos Veliz) (Desde la c/4 hasta la c/8)

- Uconst de Aceros
  195.08 m² 59.14% 19.51 m³
- Uconst de Conteras
  246.20 ml 74.63% 12.31

→ c/9 (c/Boy Scout 2da) (Desde la c/8 hasta la cañada)


- Uconst de Aceros
  28.56 m² 31.23% 2.14

→ c/11 (c/Boy Scout 3ra) (Desde la c/8 hasta la Cañada)

- Uconst de Aceros
  19.51 m² 21.33% 1.46

29/06/2022

Villa Progreso → Para Cub. #2

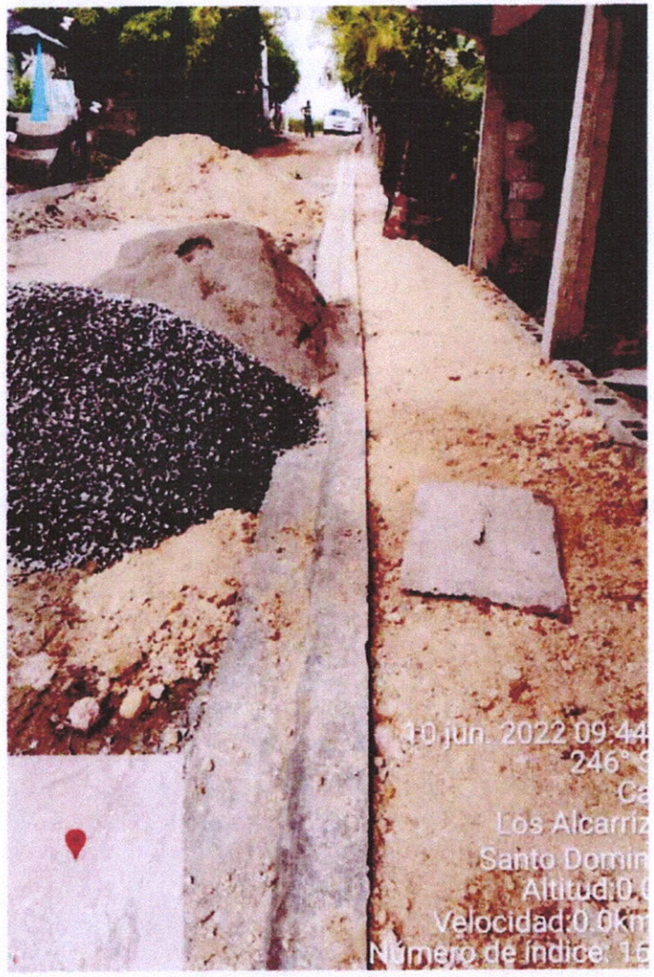



1


30 may. 2022
255°
Vía sin nomb
Los Alcarriz
Santo Domin
Altitud 22
Número de índice: 15


8 jun. 2022
254°
Vía sin nomb
Los Alcarriz
Santo Domin
Altitud 24
Velocidad 0.7km
Número de índice: 16


31 may. 2022 12:03
274°
Los Alcarriz
Santo Domin
Altitud:14.
Velocidad:0.3km
Número de índice: 15


14 jun. 2022 11:26
180
Los Alcarri
Santo Domin
Altitud:31
Velocidad:0.2km
Número de índice: 17

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

4 de Julio del 2022

"DESPACHO DEL ALCALDE"

A : **Ing. Freddy Dini Lebrón.**
Director de Obras Públicas.

Asunto : **Autorización.**

Luego de extenderle un cordial saludo, por este medio me permito remitirle la autorización a realizar el pago de las partidas correspondientes a (Demoliciones & Badenes) en las cubicaciones, cumpliendo con el pliego de condiciones, correspondientes a las licitaciones realizadas por esta institución con el presupuesto de la Liga Municipal Dominicana.

NO. DE REFERENCIA	SECTOR
AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2022-0003	Sector La Esmeralda.
AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2022-0004	Sector Villa Progreso.
AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2022-0005	Residencial Las Mercedes, Bloque C.
AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2022-0007	Sector Juana Saltitopa.

Sin otro particular y espera de sus buenos oficios le saluda,

Cordialmente:

CRISTIAN ENCARNACION
Alcalde Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS"
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNCIPALES

Al construir las calles de nuestro municipio Los Alcarrizos las pendientes transversales y longitudinales son de vital importancia para la conducción de las aguas pluviales a través de contenes, aceras, badenes e imbornales, además de garantizar la capacidad de conducción y escorrentia de las aguas que se acumulan en la calzada durante los tiempos de lluvias.

Las aceras son las superficies que se construyen con el objetivo de facilitar la movilidad de los peatones en las zonas urbanas, estas además de las obras de arte (contenes, badenes e imbornales) que también son fundamentales para garantizar mayor durabilidad y facilidad de las mismas.

Es por esto que luego de una licitación en la que se ha incluido badenes, relleno, Telford y demoliciones el **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos** no se encuentra en capacidad econonomica de pagar fuera de la misma esos elementos mencionados anteriormente, sería contradictorio para la cámara de cuenta al momento de una auditoria encontrar un proceso licitado dos veces y del mismo sector.

Fecha	Concepto	Valor
8/07/2022	P/R: PAGO A FAVOR DEL SR. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO, POR CON CEPTO DE CUBICACION #2, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONT NES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES VILLA PROGRESOS DEL S	423,011.81

7261

Clave Municipal No.

No. 018602

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
PROGRAMA DE INVERSION

DIA	MES	AÑO
08	07	2022

0016874

RNC: 430-04253-6
DO28BRRD00000000002440009274

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO

RD$ *423,011.81

*** CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES MIL ONCE CON 81/100 ***

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

IRodriguez

FIRMA(S)

⑈018602⑈ 244112727134:0244000927 4⑈ 28

Cap. No. _____ *Sub-Objeto* _____ *Fondo* _____ *Comprobante No.* _____ *Fecha* _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
No. Comprobante .. : 2202782 P/R: PAGO A FAVOR DEL SR. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO, POR CONCEPTO DE CUBICACION #2, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES VILLA PROGRESOS DEL SECTOR (6) EN LOS AL		Estructura Clasific. 0011010096 272401	423,011.81
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2202782
FECHA 8/07/2022
SECUENCIAL: 2822

TIPO COMPROBANTE: 2202781 **Etapa:** Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 5066 **RNC/CED/PAS:** 00107372831
BENEFICIARIO: ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R: PAGO A FAVOR DEL SR. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO, POR CONCEPTO DE CUBICACION #2, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES VILLA PROGRESOS DEL SECTOR (6) EN LOS ALCARRIZOS, CONTRATO NO. 021/2022. D/F 07/07/2022. ANEXO***CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL ONCE PESOS CON 81/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0096	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	445,275.59
					Menos las siguientes Retenciones	
00 11 01 0096	272401	40	9992	103	Menos 5% De: 445,275.59	(22,263.78)
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 423,011.81

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPA. DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2202781
FECHA 8/07/2022
SECUENCIAL: 2821

TIPO COMPROBANTE: 2202782 **Etapa:** Devengado
CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 5066 **RNC/CED/PAS:** 00107372831
BENEFICIARIO: ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R: PAGO A FAVOR DEL SR. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO, POR CONCEPTO DE CUBICACION #2, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES VILLA PROGRESOS DEL SECTOR (6) EN LOS ALCARRIZOS, CONTRATO NO. 021/2022. D/F 07/07/2022. ANEXO***CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 59/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0096	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	445,275.59
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 445,275.59

CK No.	Monto	Fecha

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Beneficiario

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

liga municipal

DIRECCION ADMINISTRATIVA

07 de julio de 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde Municipal

Vía : Dirección Financiera

De la : Dirección Administrativa

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCION FINANCIERA
AUTORIZADO
Firma
Fecha 8/7/2022

Asunto : Pago cubicación #2

Distinguidos Señores:

Cortésmente le estamos solicitando el pago a favor de**: Antonio Rodríguez Hilario.**

Codia: 21826 Contrato No. **021/2022**. RNC: **001-0737283-1**

Monto a pagar**: RD$445.275.59 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Pesos Con 59/100).**

Por concepto de Pago de cubicación #2, para la construcción de aceras, contenes, badenes y canaletas, en diferentes calles en villa Progreso del sector (6), Chavón, en los Alcarrizos.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO
Prov. Sto. Dgo., R.D.

Atentamente,

Lcda. Luisana Guzmán
Administrativa

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Santo Domingo R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Públicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
31 mayo 2022

Contrato No: 021-2022
No. Oficio: 005-2022

Al : **Sr. Cristian Encamación**
Alcalde del AMA

Via : **Lic. Luisana Guzmán**
Directora de Administrativo

Del : **Ing. Freddy M. Dini Lebrón**
Director de Obras Publicas Municipal

Anexo : Fotos y Soporte Técnico.

Asunto : **Solicitud Pago de Cub.1**

Muy cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el pago de la Cub.1 Correspondiente Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sánchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte, C/Boy scout, en el sector Villa progreso, Chavón (06). Por un monto de **RD$3, 248,870.56 (Tres Millones Doscientos Cuarenta Ocho Mil, Ochocientos Setenta con 56/100).**

El mismo a nombre de **Sr. Antonio Rodriguez Hilario,** Portador de la cédula de Identidad y electoral **No.001-0737283-1.**

Sin otro particular se despide:

Atentamente:

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipal

AYTO. MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario.

Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
31 mayo 2022

Al	:	**Sr. Cristian Encarnación** Alcalde del AMA
Vía	:	**Lic. Luisana Guzmán** Directora del Departamento Administrativo
Del	:	**Ing. Freddy M. Dini Lebrón** Director de Obras Publicas Municipal
Asunto	:	Informe de inspección a nombre **ING.ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO** portador de la cedula de identidad y electoral **No. 001-0737283-1.**
Anexo	:	Presupuesto Autorizado, Fotos y Soporte T.

Muy cortésmente, me dirijo a usted para remitirle el informe de la Inspección de la cub.1 perteneciente al contrato (021-2022) correspondiente a la correspondiente Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sánchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte, C/Boy scout, en el sector Villa progreso, Chavón (06). . Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. Estas partidas se encuentran ejecutadas en un 65.37%

Este informe fue suministrado, evaluado y autorizado por la parte interesadas.

Ing. Francisco Antonio Suarez
Supervisor de Obras

ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
Contrastista

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Publicas Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0222952170663**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO**, RNC No. **00107372831**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO NORTE** , Administración Local **ADM LOCAL VILLA MELLA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:


Nombre del Impuesto

- **ITBIS**
- **RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA**
- **IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.**
- **OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM**
- **ANTICIPO RENTA 3 CUOTAS**
- **IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA**

***Dada en la OFICINA VIRTUAL**, a los* **treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil veintidos (2022)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (**30**) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Para la legitimidad de la presente certificación en **http://www.dgii.gov.do/verifica** o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-200-5440 desde el interior sin cargos).

"AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS"
(AMA)
Dirección de Obras Públicas Municipales

Contratista:	ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
Obras:	Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sánchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte, C/Boy scout, en el sector Villa progreso, Chavón (06)
Codigo:	AMA17-OP1221-P32-M
Sector:	Villa progreso, Chavon (06)
Cuh:	1
Fecha:	31 de mayo de 2022

No. Contrato: 021-2022

Periodo: Marzo-Mayo2023

Monto Contratado:	6,212,299.63
Monto a Ejecutar:	5,246,840.24
Monto a ejecutar mas Impuestos:	6,212,299.63
Avance Inicial:	1,242,459.93
Avance de Obra:	65.37%

No.	ETAPA I / PARTIDAS	PRESUPUESTADO				CUBICACION ACTUAL			CUBICACION ANTERIOR			CUBICACION ACUMULADA		
		Cantidad	Unidad	Costo Unt.	Valor	Cantidad	Valor	%	Cantidad	Valor	%	Cantidad	Valor	%
1.01	Valla informativa de la obra	1.00	Ud.	15,000.00	15,000.00	1.00	15000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	15000.00	100.00%
					15,000.00									
II	MOVIMIENTO DE TIERRA													
2.01	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martinez hasta la C/Sánchez (122.87*1.00*0.10)*2 Nota: **C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	24.57	m^3	365.00	8,969.51	12.41	4531.40	50.52%	0.00	0.00	0.00%	12.41	4531.40	50.52%
2.02	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martinez hasta la C/Sánchez (122.87*0.50*0.10)*2 Nota: **C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	12.29	m^3	365.00	4,484.76	12.29	4484.76	100.00%	0.00	0.00	0.00%	12.29	4484.76	100.00%
2.03	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Sánchez desde la C/Santa fe hasta la C/Napoleón (253.66*1.00*0.10)*2 Nota: **C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	50.73	m^3	365.00	18,517.18	40.93	14938.55	80.67%	0.00	0.00	0.00%	40.93	14938.55	80.67%
[illegible]	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Sánchez desde la C/Santa Fe hasta la C/Napoleon (253.66*0.50*0.10)*2 Nota: **C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	25.37	m^3	365.00	9,258.59	25.05	9144.99	98.77%	0.00	0.00	0.00%	25.05	9144.99	98.77%
2.05	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*1.00*0.10)*2 Nota: **C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	50.73	m^3	365.00	18,517.18	50.73	18517.18	100.00%	0.00	0.00	0.00%	50.73	18517.18	100.00%
2.06	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*0.50*0.10)*2 Nota: **C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	25.37	m^3	365.00	9,258.59	23.01	8400.41	90.73%	0.00	0.00	0.00%	23.01	8400.41	90.73%
2.07	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*1.00*0.10)*2	32.99	m^3	365.00	12,040.62	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

2.10	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*0.50*0.10)*2	16.49	m^3	365.00	6,020.11	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.11	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63*1.00*0.10)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	57.93	m^3	365.00	21,142.99	20.53	7493.17	35.43%	0.00	0.00	0.00%	20.53	7493.17	35.43%
2.12	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63*0.50*0.10)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	28.96	m^3	365.00	10,571.50	27.46	10022.83	94.81%	0.00	0.00	0.00%	27.46	10022.83	94.81%
2.13	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva**	6.86	m^3	365.00	2,503.72	6.69	2440.75	97.49%	0.00	0.00	0.00%	6.69	2440.75	97.49%
2.14	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.50*0.10)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva**	4.57	m^3	365.00	1,669.15	4.57	1669.15	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.57	1669.15	100.00%
2.15	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	6.86	m^3	365.00	2,503.72	4.72	1721.88	68.77%	0.00	0.00	0.00%	4.72	1721.88	68.77%
2.16	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.50*0.10)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	4.57	m^3	365.00	1,669.15	4.57	1669.15	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.57	1669.15	100.00%
2.17	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/11 (desde la C/8 hasta la Cañada**	6.86	m^3	365.00	2,503.72	5.40	1969.62	78.67%	0.00	0.00	0.00%	5.40	1969.62	78.67%
2.18	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.50*0.10)*2 **NOTA: C/11(desde la C/8 hasta la Cañada**	4.57	m^3	365.00	1,669.15	4.57	1669.15	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.57	1669.15	100.00%
					131,299.81									
III	RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION													
3.01	Relleno en caliche para aceras en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martinez hasta la C/Sánchez (122.87*1.00*0.10)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	24.57	m^3	650.00	15,973.10	12.41	8069.61	50.52%	0.00	0.00	0.00%	12.41	8069.61	50.52%
3.02	Telford para contenes en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martinez hasta la C/Sánchez (122.87*0.45*0.10)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	12.29	m^3	2,344.26	28,803.92	12.29	28803.93	100.00%	0.00	0.00	0.00%	12.29	28803.93	100.00%
3.03	Relleno en caliche para aceras en la C/Sánchez desde la C/Santa fe hasta la C/Napoleón (253.66*1.00*0.10)*2 **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	50.73	m^3	650.00	32,975.80	40.93	26602.90	80.67%	0.00	0.00	0.00%	40.93	26602.90	80.67%
3.04	Telford para contenes en la C/Sánchez desde la C/Santa Fe hasta la C/Napoleón (253.66*0.45*0.10)*2 **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	22.83	m^3	2,344.26	53,518.05	22.55	52861.38	98.77%	0.00	0.00	0.00%	22.55	52861.38	98.77%
3.05	Relleno en caliche para aceras en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*1.00*0.10)*2 Nota: **C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	50.73	m^3	650.00	32,975.80	50.73	32975.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%	50.73	32975.80	100.00%
3.06	Telford para contenes en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*0.45*0.10)*2 Nota: **C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	22.83	m^3	2,344.26	53,518.05	20.71	48557.46	90.73%	0.00	0.00	0.00%	20.71	48557.46	90.73%
3.07	Relleno en caliche para aceras en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*1.00*0.10)*2	32.99	m^3	650.00	21,442.28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

3.08	Telford para contenes en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*0.45*0.10)*2	14.84	m^3	2,344.26	34,799.60	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.09	Relleno en caliche para aceras en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63*1.00*0.10)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	57.93	m^3	650.00	37,651.90	20.52	13340.44	35.43%	0.00	0.00	0.00%	20.52	13340.44	35.43%
3.1	Telford para contenes en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63*0.45*0.10)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	26.07	m^3	2,344.26	61,107.12	24.71	57935.66	94.81%	0.00	0.00	0.00%	24.71	57935.66	94.81%
3.11	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva**	6.86	m^3	650.00	4,458.68	6.69	4346.54	97.49%	0.00	0.00	0.00%	6.69	4346.54	97.49%
3.12	Telford para contenes en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.45*0.10)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva**	4.12	m^3	2,344.26	9,648.27	4.12	9648.27	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.12	9648.27	100.00%
3.13	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	6.86	m^3	650.00	4,458.68	4.72	3066.36	68.77%	0.00	0.00	0.00%	4.72	3066.36	68.77%
3.14	Telford para contenes en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.45*0.10)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	4.12	m^3	2,344.26	9,648.27	4.12	9648.27	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.12	9648.27	100.00%
3.15	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2**NOTA: C/11 (desde la C/8 hasta la Cañada**	6.86	m^3	650.00	4,458.68	5.40	3507.55	78.67%	0.00	0.00	0.00%	5.40	3507.55	78.67%
3.16	Telford para contenes en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.45*0.10)*2**NOTA: C/11 (desde la C/8 hasta la Cañada**	4.12	m^3	2,344.26	9,648.27	4.12	9648.27	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.12	9648.27	100.00%
					415,086.38									
IV	HORMIGON SIMPLE													
4.01	Construcción de aceras en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martinez hasta la C/Sánchez (122.87*1.00)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	245.74	m^2	921.53	226,456.78	124.15	114405.97	50.52%	0.00	0.00	0.00%	124.15	114405.97	50.520000%
4.02	Construcción de contenes en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martinez hasta la C/Sánchez (122.87ml)*2 **Nota: C/5 desde la C/4 hasta la C/8**	245.74	ml	946.78	232,661.72	245.74	232661.72	100.00%	0.00	0.00	0.00%	245.74	232661.72	100.00%
4.03	Construcción de aceras en la C/Sánchez desde la C/Santa fe hasta la C/Napoleón (253.66*1.00)*2 **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	507.32	m^2	921.53	467,510.60	409.28	377159.50	80.67%	0.00	0.00	0.00%	409.28	377159.50	80.67%
4.04	Construcción de contenes en la C/Sánchez desde la C/Santa Fe hasta la C/Napoleón (253.66ml)*2 **Nota: C/4 (desde la C/1ra hasta la C/dama)**	507.32	ml	946.78	480,320.43	501.10	474426.90	98.77%	0.00	0.00	0.00%	501.10	474426.90	98.77%

4.05	Construcción de aceras en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud Homme (253.66*1.00)*2 **Nota: C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	507.32	m^2	921.53	467,510.60	507.32	467510.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%	507.32	467,510.60	100.00%
4.06	Construcción de contenes en la C/Princesa desde la C/Sánchez hasta la C/Emilio Prud Homme (253.66ml)*2 **Nota: C/8 (desde la C/napoleon hasta el final)**	507.32	ml	946.78	480,320.43	469.39	445799.53	92.78%	0.00	0.00	0.00%	469.39	445,799.53	92.78%
4.07	Construcción de aceras en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*1.00)*2	329.88	m^2	921.53	303,994.32	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4.08	Construcción de contenes en la C/Hermanos deline desde la C/José Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94ml)*2	329.88	ml	946.78	312,333.79	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4.09	Construcción de aceras en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63*1.00)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	579.26	m^2	921.53	533,805.47	205.24	189132.62	35.43%	0.00	0.00	0.00%	205.24	189,132.62	35.43%
4.10	Construccion de contenes en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63ml)*2 **NOTA: C/1ra (desde la C/2 hasta la C/8)**	289.63	ml	946.78	274,215.89	274.60	259984.09	94.81%	0.00	0.00	0.00%	274.60	259,984.09	94.81%
4.11	Construcción de aceras en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	91.46	m^2	921.53	84,283.13	89.16	82163.41	97.48%	0.00	0.00	0.00%	89.16	82,163.41	97.48%
4.12	Construcción de contenes en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73ml)*2 **NOTA: C/7(desde la C/4 hasta la C/curva.**	91.46	ml	946.78	86,592.50	91.46	86592.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%	91.46	86,592.50	100.00%
4.13	Construcción de aceras en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	91.46	m^2	921.53	84,283.13	62.90	57964.04	68.77%	0.00	0.00	0.00%	62.90	57,964.04	68.77%
4.14	Construcción de contenes en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73ml)*2 **NOTA: C/9 (desde la C/8 hasta la Cañada**	91.46	ml	946.78	86,592.50	91.46	86592.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%	91.46	86,592.50	100.00%
4.15	Construcción de aceras en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75)*2 **NOTA: C/11(desde la C/8 hasta la Cañada**	91.46	m^2	921.53	84,283.13	71.95	66303.86	78.67%	0.00	0.00	0.00%	71.95	66,303.86	78.67%
4.16	Construcción de contenes en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73ml)*2 **Nota: C/11 (desde la C/8 hasta la cañada)**	91.46	ml	946.78	86,592.50	91.46	86592.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%	91.46	86,592.50	100.00%
					4,291,746.92									
V	HORMIGON ARMADO													
5.01	Construcción de Baden transversal en la C/Juan Bosch (7.10*2.00)	14.20	m^2	3,198.54	45,419.27	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.02	Construcción de Baden Transversal en la C/Rosa Duarte (6.60*2.00)	13.20	m^2	3,198.54	42,220.73	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.03	Construcción de Baden en la C/Sánchez esq. C/Orquídea (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.04	Construcción de Baden en la C/Sánchez esq. C/Horacio Vázquez (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.05	Construcción de Baden en la C/1a Enfermera esq. C/Sánchez (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.06	Construcción de Baden en la C/Santa Fe esq. C/Sánchez (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.07	Construcción de Baden en la C/Orlando Martinez esq. C/Orquídea (6.50*2.00)	13.00	m^2	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

5.08	Construcción de Baden en la C/Orlando Martinez esq C/Horacio Vázquez (6.50*2.00)	13.00	m²	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.09	Construcción de Baden en la C/la Enfermera esq. C/Orlando Martinez (6.50*2.00)	13.00	m²	3,198.54	41,581.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
					378,707.14									
VII	**LIMPIEZA FINAL**													
6.01	Limpieza general y final	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
					15,000.00									
	Sub-Total General				**6,348,848.28**		**3,429,973.14**							**6,429,973.14**
B	*GASTOS INDIRECTOS*													
1.000	*DIRECCION TECNICA RESP. (CD)*				*10.000%*									342,997.31
1.001	*GASTOS ADMINISTRATIVOS*				*3.000%*									102,899.19
1.002	*SEGUROS Y FIANZAS*				*2.500%*									85,749.33
1.003	*LIQUIDACION LIBROS LABORALES Ley 806*				*1.000%*									34,299.73
1.004	*CODIA LEY 806 Ley 6.161 de 1963 para el estudio y su dependencias*				*0.100%*									3,429.97
1.005	*ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4 Parrafo I)*				*18.000%*									61,739.52
	Total Gastos Indirectos													**630,115.05**
	TOTAL EJECUCADO HASTA LA FECHA													**6,061,888.36**
	Amortizacion 20% sobre cubicado													**812,217.62**
	TOTAL A PAGAR DE CUB 1													**5,249,670.96**

Nota: La presente Cubicacion se expide a total responsabilidad del Depto de Supervicion, mediante los supervisores actuantes en la misma.-



Preparado Por

Ing. Nikaudy Rodriguez

Exc. Del Depto. de Habilitación de OS

Datos tomados por:

Ing. Francisco Antonio Suarez

SUPERVISOR DEL AMG

Revisado por:

Dr. Cesar Pujols Frias

Exc. de Supervision

Aprobado Por

ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO

Director

Revisado Por

Ing. Freddy M. Cruz Lantigua

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Fecha	Concepto	Valor
3/06/2022	P/R: PPAGO A FAVOR DEL SR. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO, POR CO NCEPTO DE CUBICACION #1, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CON ENES, BADENES Y CATALETAS, EN DIFERENTES CALLES EN VILLA PRO	3,183,893.15

7261

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
PROGRAMA DE INVERSION

No. 018537

DIA	MES	AÑO
03	06	2022

0018009

RNC: 430-04253-6
DO28BRRD00000000002440009274

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO** **RD$** *3,183,893.15

*** TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 15/100 ***

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

I Rodriguez

FIRMA(S)

⑈018537⑈ 244122722713:0244000927 4⑈ 28

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
No. Comprobante .. : 2202059 P/R: PPAGO A FAVOR DEL SR. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO, POR CONCEPTO DE CUBICACION #1, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y CATALETAS, EN DIFERENTES CALLES EN VILLA PROGRESO DEL SECTOR 6		Estructura Clasific. 0011010096 272401	3,183,893.15

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

TOTAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2202059
FECHA 3/06/2022
SECUENCIAL: 2094

TIPO COMPROBANTE: 2202058
CLASE DOCUMENTO: Original
Etapa: Pagado
Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 5066
BENEFICIARIO: ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
RNC/CED/PAS: 00107372831

DIRECCION:
TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R. PPAGO A FAVOR DEL SR. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO, POR CONCEPTO DE CUBICACION #1, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y CATALETAS, EN DIFERENTES CALLES EN VILLA PROGRESO DEL SECTOR (6), CHAVON, EN LOS ALARRIZOS SEGUN COMUNICACION D/F: 01/06/2022. ANEXO***TRES MILLONES CIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 15/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0096	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	3,248,870.56
					Menos las siguientes Retenciones	
00 11 01 0096	272401	40	9992	103	MENOS 2% De: 3,248,870.56	(64,977.41)
					**** Debajo de esta linea no hay nada escrito ****	

CK No.	Monto	Fecha

Total RD$ 3,183,893.15

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2202058
FECHA 3/06/2022
SECUENCIAL: 2093

TIPO COMPROBANTE: 2202059
CLASE DOCUMENTO: Original
Etapa: Devengado
Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 5066
BENEFICIARIO: ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
RNC/CED/PAS: 00107372831
DIRECCION:
TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R: PPAGO A FAVOR DEL SR. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO, POR CONCEPTO DE CUBICACION #1, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y CATALETAS, EN DIFERENTES CALLES EN VILLA PROGRESO DEL SECTOR (6), CHAVON, EN LOS ALARRIZOS SEGUN COMUNICACION D/F: 01/06/2022. ANEXO***TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON 56/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0096	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	3,248,870.56
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 3,248,870.56

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE LOS ALCARRIZOS
GESTIÓN 2020-2024

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCION FINANCIERA
AUTORIZADO
Firma
Fecha 03/06/2022

00110100946
0172401

DIRECCION ADMINISTRATIVA

01 de junio de 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde Municipal

Vía : Dirección Financiera

De la : Dirección Administrativa

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA REVISADO

Asunto : Pago cubicación **#1**

Distinguidos Señores:

Cortésmente le estamos solicitando el pago a favor de**: Antonio Rodríguez Hilario.**

Codia: 21826 Contrato No. **021/2022**. RNC: **001-0737283-1**

Monto a pagar**: RD$3. 248.870.56 (Tres Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta Pesos Con 56/100).**

Por concepto de Pago de cubicación #1, para la construcción de aceras, contenes , badenes y canaletas, en diferentes calles en villa Progreso del sector (6), Chavón, en los Alcarrizos.

Atentamente,

Lcda. Luisana Guzmán
Administrativa

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo R.D.

Fecha	Concepto	Valor
22/04/2022	PAR. PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL 20%, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL VILLA PROGRESO DEL SECTOR 6	1,217,810.73

Clave Municipal No.

No. 018507

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
PROGRAMA DE INVERSION

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO

RD$ *1,217,810.73

*** UN MILLON DOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 73/100 ***

PESOS

BanReservas

#018507# 211112729136O2440009274# 28

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Valor(es)	Unidad Ejecutora	Valor
No. Comprobante : 220422 PAR. PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL 20%, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL VILLA PROGRESO DEL SECTOR 6 CHAVON DE LOS ALC		Estructura Cheque 2021000000 2022001	1,217,810.73
		TOTAL	

Form. 815

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)563-2736 Fax (809)621-6368
RNC : 430-04283-6

COMPROBANTE No. 2201425
FECHA 22/04/2022
SECUENCIAL: 1442

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2201424 — Etapa: Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original — Comp. que modifica:
CODIGO BENEFICIARIO: 5066 — RNC/CED/PAS: 00107372831
BENEFICIARIO: ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
DIRECCION: — TELEFONO:
CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

POR: PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL 20%, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL VILLA PROGRESO DEL SECTOR 6 CHAVON, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN COMUNICACION DIF 20/04/2022. ANEXO***UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON 73/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Específ.	Origen Financ.	Denominación		Valor RD$
00.11.01.0096	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas		1,242,459.93
					Menos las siguientes Retenciones		
00.11.01.0096	272401	40	9992	103	MENOS 2%	De 1,242,459.93	(24,849.20)

**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****

Total RD$ 1,217,610.73

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: 1 Original, 1 Expediente, 1 Contabilidad, 1 Tesorería, 1 Contraloría, 1 Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)

Calle Duarte #349, Sector Landia
Telefono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2201424
FECHA 22/04/2022
SECUENCIAL: 1440

TIPO COMPROBANTE: 2201425
CLASE DOCUMENTO: Original

Etapa: Devengado
Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 5066
BENEFICIARIO: ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
DIRECCION:

RNC/CED/PAS: 00107372831
TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

POR PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL 20%, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL VILLA PROGRESO DEL SECTOR 6 CHAVON, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN COMUNICACION DIF 20/04/2022. ANEXO***UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 93/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0046	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,242,459.93

**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****

Total RD$ 1,242,459.93

CK No. Monto Fecha

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no esta en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Opción: 1 Original 2 Modificación 3 Anulación
1 Devenga 2 Cancelación 4 Pagamento

CONTRATO DE OBRA DETERMINADA

AÑO: 2022
CONTRATO NO.021-2022
No. Presupuesto: **AMA06-OP0322-P11-M**

ENTRE EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS, RNC [No.430-04253-6] institución del Estado Dominicano creada en virtud de **La Ley** 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios, de fecha 17/07/2007, con domicilio y asiento social en **C/ Duarte No. 359**, Sector Landia, Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, debidamente representado por su Alcalde **CRISTIAN ENCARNACION**, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0582396-7, domiciliado y residente en este municipioquien para los fines del presente Contrato, se denominará **LA ENTIDAD CONTRATANTE**. Debidamente representado por el **ING.ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO,** dominicano, mayor de edad, Soltero, titular de la cedula de identidad y electoral NO.001-0737283-1, domiciliado(a) y residente en la AUTOPISTA LA VICTORIA, 11, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE. Quien para los fines del presente Contrato, se denominará **"EL CONTRATISTA"**. Para referirse a ambos se les denominará **LAS PARTES.**

DR. BARTOLO A. LALANE DE LA CRUZ
Abogado Notario Público
Mat. No. 7789
Los Alcarrizos, Prov. Santo Domingo

PREÁMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la COMPARACION DE PRECIOS.

POR CUANTO: El Reglamento No.543-12 que regula la Ley 340-06, establece en el Art.58 que "En caso de contrataciones de obras por montos inferiores al umbral mínimo establecido para la comparación de precios, deberá utilizarse el procedimiento por comparación de precios."

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 1, establece además que: *Comparación de Precios es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores.*

POR CUANTO: El Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selección del Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratación.

POR CUANTO: El Órgano Rector, emitió la resolución No.01-2021, mediante la cual aprobó los umbrales para este año, siendo el umbral para la Comparación de Precios un monto que va desde la suma del RD$98,574,934.00 hasta un monto de RD$394,299,732.00 para la contratación de obras y tomando en cuenta lo dispuesto por el Art.58 del reglamento 543-12.

POR CUANTO: El monto al cual asciende la presente obra está por debajo del umbral tope.-

POR CUANTO: En fecha Dieciséis (16) de Marzo del año **2022**, el **AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, procedió a hacer una convocatoria amplia a los proveedores inscritos en el registro de proveedores del Estado, en el portal transaccional del sistema nacional de contrataciones públicas de la República Dominicana.

POR CUANTO: Que el día Dieciséis (16) Marzo del año 2022, fue adjudicada la Obra, a través del portal del Órgano Rector y que además cumplió con las especificaciones del pliego de condiciones. Contrato de Ejecución de Obra **PARA: AMA-CCC-CP-2022-0004, CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR VILLA PROGRESO, CHAVON, (06), CORRESPONDIENTE A LA ETAPA I; PERTENECIENTE A LAS ACERAS, CONTENES, BADENES, RELLENOS, ALCANTARILLADOS, IMPRIMICION, SEÑALIZACION DE CALLES, PUENTES,**

DEL PLAN-PRO ASFALTO, DE (REFERENCIA: AMA-CCC-CP-2022-0004). POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato.

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES: Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que expresa a continuación: **Certificado de recepción definitiva**: El o los certificados expedidos por el supervisor a **EL CONTRATISTA** al final del o de los periodos de garantía, en el que se declare que **EL CONTRATISTA** ha cumplido sus obligaciones contractuales. **Contratista**: Nombre de la persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutara el objeto del Contrato. **Contrato**: El presente documento **Coordinador:** Persona designada como tal por **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, para realizar las funciones de coordinación de todas las actividades relacionadas con la Obra y que tengan injerencia en la ejecución del Contrato. **Desglose de precios unitarios**: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado. **Emplazamiento**: Los terrenos proporcionados por **AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, en que deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamiento. **Entidad Contratante**: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS. Instalación:** Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporación a la Obra. **Lista de precios**: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que **EL CONTRATISTA** presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del Contrato de precio unitario. **Monto del Contrato**: El importe señalado en el Contrato. **Obras**: Las obras que deban realizarse, con carácter temporal o permanente, con arreglo al Contrato. **Periodo de Garantía**: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha de aprobación provisional, durante el cual **EL CONTRATISTA** se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las indicaciones del supervisor. **Planos detallados**: Los planos proporcionados por **EL CONTRATISTA** de acuerdo a la solicitud de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, y aprobados por la Supervisión para la ejecución de las obras. **Plazos:** Los plazos del Contrato que empezara a contar a partir del día siguiente a la fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el último día del plazo coincidiere con un día festivo, el plazo expirara al final del día laborable siguiente al último día de plazo. **Presupuesto Detallado**: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio unitario correspondiente. **Representante del Supervisor**: Cualquier persona física o jurídica designada como tal con arreglo al Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el cumplimiento de las funciones que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante, toda referencia que se haga al primero se entenderá hecha al segundo. **Sub-Contratista**: Persona natural o jurídica, o asociación de estas, la cual celebra Contrato directamente con **EL CONTRATISTA**, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecución de la obra. **Supervisor**: Persona natural o jurídica de Derecho Público, competente designada por **(AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS)**, responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el diseño, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construcción del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien (el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**), puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al Contrato. **Especificaciones Técnicas:** Condiciones exigidas por (el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**), para la realización de las Obras.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO: Los siguientes documentos formar parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrínseca del mismo: a) El Contrato propiamente dicho., b)Pliegos de Condiciones Especificas., c)Especificaciones Técnicas y de Construccion., d)Calculos Estructurales., e)Planos Aprobados por el Ayuntamiento correspondiente., f)Presupuesto., g)Planes de Manejo Ambiental., h)Cronograma de Ejecución de Obras., i)Garantías ,y J)Documentos ofertados ,a saber: Poliza de fianza , Fianza de fiel cumplimiento o ejecucion ,Informe de ficha técnica., Informe final., Acta de comprobación con traslado de notario. Registro de participante., oferta económica., certificación de impuestos internos. fianza de licitacion o mantenimiento de oferta., presupuesto., Presentación de oferta. Registro de proveedor del estado., Plan de trabajo., Equipos del oferente., certificación de impuestos internos.

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO:EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantías de hecho y de derecho, de acuerdo con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demás anexos que forman parte integral del presente Contrato, la Obra que se describe a continuación, **CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR VILLA PROGRESO, CHAVON, (06), CORRESPONDIENTE A LA ETAPA I; PERTENECIENTE A LAS**

ACERAS, CONTENES, BADENES, RELLENOS, ALCANTARILLADOS, IMPRIMACION, SEÑALIZACION DE CALLES, PUENTES, DEL PLAN-PRO ASFALTO, DE I REFERENCIA AMA-CCC-CP-2022-0004). **EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar las Obras de conformidad con la programación general acordada y establecida previamente entre **LAS PARTES** (Cronograma de Ejecución de Obra) la cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato.

ARTICULO 4. MONTO DEL CONTRATO: **LAS PARTES** convienen que el monto total a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma de **(RD$6, 212,299.63) SEIS MILLONES DOCIENTOS DOCE MIL DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 63/100 CENTAVOS MONEDA LEGAL NACIONAL**. En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las cantidades, sub-partidas y el costo general de la Obra.

ARTICULO 5. FORMA DE PAGO: Los pagos se harán de la siguiente manera: Un primer pago o anticipo correspondiente al 20% del valor total de la obra, cuya suma tiene un valor de **(RD$ 1,242,459.93) UN MILLON DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 CENTAVOS MONEDA LEGAL NACIONAL**. Este pago se hará después de la firma del contrato. **EL CONTRATISTA** utilizará el Anticipo únicamente para los trabajos relacionados con la ejecución de la obra. La suma restante será pagada en pagos parciales a **EL CONTRATISTA** mediante cubicaciones periódicas por obra realizada y certificada por la supervisión. El importe de la primera cubicación realizada por **EL CONTRATISTA** deberá ascender a por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del monto del Anticipo o Avance inicial. Podrán ejecutarse Obras adicionales, elaboradas bajo Ordenes de Cambio, y serán pagadas en la medida en que estén realizadas, previo acuerdo de precios entre **LAS PARTES**. Estas Obras adicionales serán regidas por las condiciones de este contrato a menos que sea acordado de manera diferente entre las **PARTES**.

ARTICULO 6. TIEMPO DE EJECUCIÓN: **EL CONTRATISTA** se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato a más tardar **CINCO (05)** días después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Artículo **05** y deberá entregarla totalmente terminada y a satisfacción de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** en un plazo no mayor de **SESENTA (60)** días calendarios, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato. **EL CONTRATISTA** deberá entregar un Cronograma detallado de trabajo en el cual se especifique la Ruta Crítica de Ejecución de la Obra y de la cual, a partir de esa fecha, se contará el tiempo de ejecución establecido.

ARTICULO 7. COMPENSACIÓN POR DEMORA: Si **EL CONTRATISTA** no entrega la Obra en el plazo convenido en el Artículo 7 de este contrato salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, **EL CONTRATISTA** autoriza al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, como justa indemnización por daños y perjuicios, una Compensación correspondiente al costo de oportunidad del dinero conforme a los parámetros locales de la inversión y la fecha especificada para la terminación de la Obra. Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de la Obra, y serán descontadas del pago final y/o de las garantías constituidas en efecto. De las sumas acreditadas a **EL CONTRATISTA** en pago por la deducción de dichos daños y perjuicios no exonerará a **EL CONTRATISTA** de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni responsabilidades enunciadas en este Contrato. A este efecto **EL CONTRATISTA** declara que queda constituido en mora por el solo vencimiento del plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de ninguna clase.

ARTICULO 8. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO: Ni el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** ni **EL CONTRATISTA** serán responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato o su ejecución fue sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente Contrato Fuerza Mayor significa cualquier evento o situación que excluyen a control de una parte imprevisible e inevitable y no sea que este envuelta su negligencia o falta como por ejemplo enunciativo pero no limitativo: actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terrorismo, huelgas, fuegos, explosiones, tensiones de tierra, accidentes, catástrofes,

inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: a) Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte., b) Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. c) Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato. La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, **EL CONTRATISTA** no concluye sus labores en el plazo establecido, **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** extenderá el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual **EL CONTRATISTA** no pudo cumplir, debido únicamente a esta causa. **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendrá derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Si **EL CONTRATISTA** dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido dentro del periodo especificado, se considerará que ha renunciado a su derecho en relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS: Queda convenido que **EL CONTRATISTA** no tendrá derecho a reclamar incrementos de precios durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra.

ARTÍCULO 10.- SUPERVISIÓN: La Supervisión representará por el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** y será intermediana entre esta y **EL CONTRATISTA**, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato. **EL CONTRATISTA** permitirá que el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** o su representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTÍCULO 11.- NO RELACIÓN LABORAL: LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la Republica Dominicana. **EL CONTRATISTA** acuerda, por este medio, liberar al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** de toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecución del presente Contrato.

ARTÍCULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA: En un plazo de quince (15) días después de constituirse la Garantía de Fiel Cumplimiento que dispone el Artículo [18] **EL CONTRATISTA** suministrara al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** y al Supervisor, un ejemplar en copia dura y otro electrónico de los planos elaborados para la ejecución de El Contrato, así como las Especificaciones Técnicas definitivas, presupuesto y otros documentos de El Contrato. En el momento de expedirse el Certificado de Garantía, o en el momento de la recepción definitiva, **EL CONTRATISTA** suministrara a **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** y al Supervisor todos los planos, en copia dura y electrónica, como construido (**As Built**) y cualquier otro documento requerido por **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** y El Supervisor.

ARTÍCULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA ejecutará y concluirá las Obras y subsanará cualquier deficiencia de las mismas identificadas por **el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** con el cuidado y la diligencia debidos y en Riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato. **El CONTRATISTA** será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de la obra, respondiendo por los errores de interpretación incurridos durante la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva por parte de la Entidad Contratante. **EL CONTRATISTA** se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando **EL CONTRATISTA** considere que las exigencias de una orden

administrativa sobrepasan El Contrato, deberá notificarlo a El Supervisor en un plazo de treinta (30) días a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecución de la orden administrativa no se suspenderá como consecuencia de dicha notificación. **EL CONTRATISTA,** ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecución de tales trabajos, en este último caso, **EL CONTRATISTA** quedará exento de responsabilidad. Asimismo, **EL CONTRATISTA** será responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta. **EL CONTRATISTA** respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en el Estado Dominicano. Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institución privada o pública, para la realización de los trabajos de construcción y ejecución de El Proyecto, cuya obtención sea usualmente responsabilidad de un contratista general, deberán ser obtenidas por **EL CONTRATISTA**.

ARTÍCULO 14.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS: **EL CONTRATISTA** dirigirá personalmente las Obras o nombrará a un representante suyo para que lo haga. El representante de **EL CONTRATISTA** tendrá plena autoridad para adoptar cualquier decisión que sea necesaria para la ejecución de las Obras, para recibir y llevar a cabo órdenes administrativas. En cualquier caso, será responsabilidad de **EL CONTRATISTA** cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y según el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas.

ARTÍCULO 15.- APROBACIÓN DEL PERSONAL: La aceptación de la Oferta por parte del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** se considera como acuerdo con el personal propuesto. Con relación a cualquier otro personal de **EL CONTRATISTA** deberá someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** para su revisión y aprobación. Si el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** no lo objeta dentro de los primeros diez (10) días de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestión ha sido aprobado.

ARTÍCULO 16.- REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PERSONAL: EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa autorización del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** la cual no será negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de **EL CONTRATISTA** sea necesario el reemplazo de cualquier personal, **EL CONTRATISTA** se compromete a reemplazarlo por una persona con semejantes aptitudes y experiencia. **El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo. **PÁRRAFO: EL CONTRATISTA** deberá entregar a El **Supervisor** del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** un listado con cada una de las personas que trabajarán en el periodo de construcción acordado. Este personal deberá estar debidamente identificado como empleado de **EL CONTRATISTA**, y dicha identificación deberá considerar los siguientes datos personales: a) Nombre completo., b) Cédula de Identidad Personal,.c)Cargo ó responsabilidad., d)Dirección.e) Teléfono. Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTÍCULO 17.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de las Obras como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y molestias a personas y Propiedades resultantes de contaminación, ruido y otros derivados de sus operaciones. **EL CONTRATISTA** se asegurará de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al Terreno durante el periodo del Contrato estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley. La seguridad del área de la Obra durante el periodo de construcción es responsabilidad de **EL CONTRATISTA**. Es responsabilidad de **EL CONTRATISTA** asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia relacionadas con el público y la seguridad de la construcción, así como obedecer todas las regulaciones establecidas por el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** es obligación aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la Obra y/o ejecución de trabajos: a)Uso de casco de seguridad., b)Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para

trabajos en altura., c)Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de protección., d)Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores. ,e) Uso de andamios seguros, f) Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo. Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberán cumplir completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** cooperara en lo concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se permitirán menores en los lugares de trabajo en ningún momento. El Supervisor del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** podrá expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas. **EL CONTRATISTA** cumplirá en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construcción.

ARTÍCULO 18.- GARANTÍA DE ANTICIPO: Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, **EL CONTRATISTA** deberá proporcionar una garantía del mismo, constituyendo una póliza de seguro de fidelidad a entera satisfaccion del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** por un valor equivalente al monto del avance inicial. La presente garantía se reducirá automáticamente y en la misma proporción en que el anticipo se impute a los abonos, y permanecerá en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el Contrato hasta que el ***AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS*** haya recibido del Contratista el reembolso total de ese monto.

ARTÍCULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCIÓN DE CONTRATO: EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposición de la Obra, así como también, por la provisión de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra necesarios para tales fines. Si en cualquier momento o en el curso de la realización de la Obra surgiera o se presentara algún error de disposición, dimensiones o alineación de alguna parte de la Obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento del ***AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS*** o la Supervisión, deberá, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfacción.

ARTÍCULO 20.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato **EL CONTRATISTA** hace formal entrega de una garantía bancaria o una póliza (No.3-1206-9140). De Fecha Doce (12) del mes de Abril del 2022, De la Compañía de Seguros APS. por un valor del 4% del monto de RD(264,491.98) de seguros a favor del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 111 y 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha treinta (30) de agosto del dos mil siete (2007), por un valor equivalente al Cuatro por ciento (04%) del monto del Contrato. (cuya póliza para este caso no es exigible de acuerdo al artículo 118 de reglamento 543-12 que establece que las Adjudicaciones que estén por debajo de Diez mil dólares) **PARRAFO I**. Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la ejecución de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTÍCULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL: EL CONTRATISTA será el único responsable por los daños y perjuicios causados a las personas que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, así como también, asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos deberá presentar para la suscripción del presente Contrato la póliza de responsabilidad civil general, correspondiente **EL CONTRATISTA** mantendrá al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamación, compensación, pérdidas o Gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por **EL CONTRATISTA**. Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos, ¡que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destrucción de la propiedad física. **EL CONTRATISTA** obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo que el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** esté indemnizada.

ARTÍCULO 22.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: Al finalizar los trabajos, **EL CONTRATISTA** deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas por él a satisfacción del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, (Garantía de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al **Veinte Por Ciento (20%)**, del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantía deberá ser por un (1) año, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**. Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano. **EL CONTRATISTA** también será responsable por los daños que ocasione a las Obras existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no haya sido advertido por el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** hasta el momento de recibir la Obra terminada.

ARTÍCULO 23.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: **EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando **EL CONTRATISTA** presente los siguientes documentos: a)Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras., b)Certificado de Descargo de la Secretaría de Estado de Trabajo., c)Pago de Liquidación de todos los compromisos de la Seguridad Social, d)Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta., e)Comprobante de pagos de las tasas del CODIA.

ARTÍCULO 24.- IMPUESTOS: **EL CONTRATISTA** no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del presente Contrato y por tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTÍCULO 25.- EQUILIBRIO ECONÓMICO: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por **EL CONTRATISTA** para la ejecución de la obra, los pagos y los gastos reembolsables pagables a **EL CONTRATISTA**, en virtud de este Contrato, aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional.

ARTÍCULO 26.- SUB-CONTRATACIONES: **EL CONTRATISTA** no podrá ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún beneficio o participación o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**. El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, no eximirá a **EL CONTRATISTA** de ninguna responsabilidad y obligación estipulada en El Contrato. De igual manera, queda entendido que **EL CONTRATISTA** será también responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTÍCULO 27.- RESCISIÓN: **EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS]** se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de que **EL CONTRATISTA** diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones. **EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL** podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, así como ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si **EL CONTRATISTA** fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administración judicial, o si se presentase una petición de declaración en quiebra, o si hiciese algún convenio con sus acreedores o una cesión a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la Supervisión certificase por escrito al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** que en su opinión **EL CONTRATISTA: a)**Ha abandonado las Obras., b)Ha dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) días, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito., c)No está ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o está constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las órdenes emitidas por la Supervisión., d)Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,. e)** Si **EL CONTRATISTA** cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores; f) Si se le asigna un administrador judicial a **EL CONTRATISTA** a causa de su insolvencia. g) Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato. De igual modo, podrá procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este Contrato, que a juicio del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** sean

violadas por **EL CONTRATISTA**. En tal caso, el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podrá rescindir este Contrato y procederá a evaluar los daños y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a **EL CONTRATISTA** ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTÍCULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO: Constituirá una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** las enunciadas a continuación: a) La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria.

ARTÍCULO 29.-RECEPCIÓN PROVISIONAL: EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS tomará posesión de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas de terminación y se haya expedido un certificado de recepción provisional. Tras la recepción provisional de las Obras, **EL CONTRATISTA** desmantelará y retirará las estructuras provisionales así como los materiales que ya no se utilicen para la ejecución del Contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos, y restablecerá toda modificación en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

ARTÍCULO 30.- CUBICACIÓN DE CIERRE: EL CONTRATISTA producirá una cubicación final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El Contrato. La Supervisión deberá validar la cubicación final dentro de **Sesenta Días** (60) días de recibida, si está fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitará a **EL CONTRATISTA** que realice toda corrección o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicación final, no fuese satisfactoria, **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** deberá determinar el monto a pagar a **EL CONTRATISTA**.

ARTÍCULO 31.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Al expirar el período de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el Supervisor extenderá a **EL CONTRATISTA** un certificado de recepción definitiva y remitirá una copia del mismo al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** con indicación de la fecha en que **EL CONTRATISTA** haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfacción del Supervisor. El Supervisor entregará el certificado de recepción definitiva a más tardar **indicar en letras y números el plazo** días, después de que expire el período arriba mencionado, o, después de dicho período, tan pronto como se haya terminado a satisfacción del Supervisor toda obra ordenada. Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, con una copia para **EL CONTRATISTA**.

ARTÍCULO 32.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO: Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre **LAS PARTES**, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**.

ARTICULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS: LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al desarrollo del presente Contrato y su interpretación.

ARTÍCULO 34.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) y de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

ARTÍCULO 35.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 36.- IDIOMA OFICIAL: El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente documento.

ARTÍCULO 37.- TITULOS: Los títulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado de este Contrato.

ARTÍCULO 38.- LEGISLACIÓN APLICABLE: EL CONTRATISTA realizará sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la República Dominicana.

ARTÍCULO 39.- ELECCIÓN DE DOMICILIO: Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, **LAS PARTES** eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente Contrato, su ejecución y terminación.

ARTÍCULO 40.- ACUERDO INTEGRO: El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre **LAS PARTES**; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara invalida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una **de LAS PARTES**, y el otro para los fines correspondientes, En el Municipio de Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los Once (11) días del mes de Abril del año Dos Mil Veintidós (11/04/2022).-

Por el Ayuntamiento:

CRISTIAN ENCARNACION
Contratante

Por el Contratista;

ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
Contratista

YO, DR. BARTOLO A. LALANE DE LA CRUZ, Notario público de los del número para del Municipio Los Alcarrizos, registrado en el Colegio Dominicano de Notarios con el número 7780, con estudio profesional abierto en esta ciudad., Certifico y doy fe que las firmas que aparecen en el presente documento fueron puestas, en mi presencia libre y voluntariamente por los señores: **CRISTIAN ENCARNACION y/o ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO,** quienes me declararon bajo la fe del juramento que esas son las firmas que ellos acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas, tanto públicas como privadas. En el Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, a los Once (11) días del mes de Abril del año Dos Mil Veintidós (11/04/2022).-

DR. BARTOLO A. LALANE DE LA CRUZ
Notario Publico

ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO

Autopista La Victoria, 11, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.
Telf. 849-875-0727, Ced. 001-0737283-1, e-mail:.ajrodriguez1227@gmail.com

Obra: Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sanchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte, C/Boy scout, C/Hermanas Mirabal, C/Rosa Duarte, C/Orlando Martinez), en el sector Villa progreso, Chavón (06).

Sector: Villa progreso, Chavón (06).
Ubicación: Los Alcarrizos

PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
I	**PRELIMINARES**					
1.01	Valla informativa de la obra.	1.00	Ud.	15,000.00	15,000.00	**15,000.00**
II.	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
2.01	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Sneta Fe desde la C/Orlando Martinez hasta la C/Sanchez (122.87*1.00*0.10)*2	24.57	m3	365.00	8,968.05	
2.02	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martinez hasta la C/Sanchez (122.87*0.50*0.10)*2	12.29	m3	365.00	4,485.85	
2.03	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Sanchez desde la C/Santa fe hasta la C/Napoleon (253.66*1.00*0.10)*2	50.73	m3	365.00	18,516.45	
2.04	Excavacion de material no clasificado a mano para contenes en la C/Sanchez desde la C/Santa Fe hasta la C/Napoleon (253.66*0.50*0.10)*2	25.37	m3	365.00	9,260.05	
2.05	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Princesa desde la C/Sanchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*1.00*0.10)*2	50.73	m3	365.00	18,516.45	
2.06	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Princesa desde la C/Sanchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*0.50*0.10)*2	25.37	m3	365.00	9,260.05	
2.07	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Hermanos deline desde la C/Jose Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (364.98*1.00*0.10)*2	32.99	m3	365.00	12,041.35	
2.08	Excavacion de material no clasificado a mano para contenes en la C/Hermanos deline desde la C/Jose Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (364.98*0.50*0.10)*2	16.49	m3	365.00	6,018.85	
2.09	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Prin. Juan Pablo Duarte (289.63 *1.00*0.10) *2	57.93	m3	365.00	21,144.45	

ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
Autopista La Victoria, 11, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.
Telf. 849-875-0727, Ced. 001-0737283-1, e-mail: ajrodriguez1227@gmail.com

Obra: Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sanchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte, C/Boy scout, C/Hermanas Mirabal, C/Rosa Duarte, C/Orlando Martinez), en el sector Villa progreso, Chavón (06).

Sector: Villa progreso, Chavón (06).
Ubicación: Los Alcarrizos

PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
2.1	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63*0.50*0.10)*2	28.96	m3	365.00	10,570.40	
2.11	Excavacion de material no clasificado a mano para aceras en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2	6.86	m3	365.00	2,503.90	
2.12	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.50*0.10)*2	4.57	m3	365.00	1,668.05	
2.13	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2	6.86	m3	365.00	2,503.90	
2.14	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Boy scout 2da desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.50*0.10)*2	4.57	m3	365.00	1,668.05	
2.15	Excavacion de material no clasificado a mano para aceras en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2	6.86	m3	365.00	2,503.90	
2.16	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.50*0.10)*2	4.57	m3	365.00	1,668.05	**131,297.80**
III-	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION**					
3.01	Relleno en caliche para aceras en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martinez hasta la C/Sanchez (122.87*1.00*0.10)*2	24.57	m3	650.00	15,970.50	
3.02	Telford para contenes en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martinez hasta la C/Sanchez (122.87*0.45*0.10)*2	12.29	m3	2,344.26	28,810.96	

ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
Autopista La Victoria, 11, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.
Telf. 849-875-0727, Ced. 001-0737283-1, e-mail:.ajrodriguez1227@gmail.com

Obra: Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sanchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte, C/Boy scout, C/Hermanas Mirabal, C/Rosa Duarte, C/Orlando Martinez), en el sector Villa progreso, Chavón (06).

Sector: Villa progreso, Chavón (06).
Ubicación: Los Alcarrizos

PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
3.03	Relleno en caliche para aceras en la C/Sanchez desde la C/Santa fe hasta la C/Napoleón (253.66*1.00*0.10)*2	50.73	m3	650.00	32,974.50	
3.04	Telford para contenes en la C/ Sanchez desde la C/Santa Fe hasta la C/Napoleón	22.83	m3	2,344.26	53,519.46	
3.05	Relleno en caliche para aceras en la C/Princesa desde la C/Sanchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*1.00*0.10)*2	50.73	m3	650.00	32,974.50	
3.06	Telford para contenes en la C/Princesa desde la C/Sanchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*0.45*0.10)*2	22.83	m3	2,344.26	53,519.46	
3.07	Relleno en caliche para aceras en la C/Hermanos deline desde la C/Jose Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*1.00*0.10)*2	32.99	m3	650.00	21,443.50	
3.08	Telford para contenes en la C/Hermanos deline desde la C/Jose Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*0.45*0.10)*2	14.84	m3	2,344.26	34,788.82	
3.09	Relleno en caliche para aceras en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63*1.00*0.10)*2	57.93	m3	650.00	37,654.50	
3.1	Telford para contenes en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63*0.45*0.10)*2	26.07	m3	2,344.26	61,114.86	
3.11	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 1era desde la C/ Peña Gomez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2	6.86	m3	650.00	4,459.00	
3.12	Telford para contenes en la C/Boy scout 1era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.45*0.10)*2	4.12	m3	2,344.26	9,658.35	

ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
Autopista La Victoria, 11, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.
Telf. 849-875-0727, Ced. 001-0737283-1, e-mail:.ajrodriguez1227@gmail.com

Obra: Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sanchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte, C/Boy scout, C/Hermanas Mirabal, C/Rosa Duarte, C/Orlando Martinez), en el sector Villa progreso, Chavón (06).

Sector: Villa progreso, Chavón (06).
Ubicación: Los Alcarrizos

PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
3.13	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 2da desde la C/ Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2	6.86	m3	650.00	4,459.00	
3.14	Telford para contenes en la C/Boy scout 2da desde la C/ Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.45*0.10)*2	4.12	m3	2,344.26	9,658.35	
3.15	Relleno en caliche para aceras en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.75*0.10)*2	6.86	m3	650.00	4,459.00	
3.16	Telford para contenes en la C/Boy scout 3era desde la C/Peña Gómez hasta el Final (45.73*0.45*0.10)*2	4.12	m3	2,344.26	9,658.35	**415,123.10**
IV-	**HORMIGON SIMPLE**					
4.01	Construcción de aceras en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martinez hasta la C/Sanchez (122.87*1.00)*2	245.74	m2	921.53	226,456.78	
4.02	Construcción de contenes en la C/Santa Fe desde la C/Orlando Martinez hasta la C/Sanchez (122.87)*2	245.74	ml	946.78	232,661.72	
4.03	Construcción de aceras en la C/Sanchez desde la C/Santa fe hasta la C/Napoleón (253.66*1.00)*2	507.32	m2	921.53	467,510.60	
4.04	Construcción de contenes en la C/ Sanchez desde la C/Santa Fe hasta la C/Napoleón (253.66ml)*2	507.32	ml	946.78	480,320.43	
4.05	Construcción de aceras en la C/Princesa desde la C/Sanchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66*1.00)*2	507.32	m2	921.53	467,510.60	
4.06	Construcción de contenes en la C/Princesa desde la C/Sanchez hasta la C/Emilio Prud'Homme (253.66)*2	507.32	ml	946.78	480,320.43	

ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
Autopista La Victoria, 11, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.
Telf. 849-875-0727, Ced. 001-6737283-1, e-mail: arodriguez1227@gmail.com

Obra: Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sanchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte, C/Boy scout, C/Hermanas Mirabal, C/Rosa Duarte, C/Orlando Martinez), en el sector Villa progreso, Chavón (06).

Sector: Villa progreso, Chavón (06).
Ubicación: Los Alcarrizos

PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
4.07	Construccion de aceras en la C/Hermanos deline desde la C/Jose Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94*1.00)*2	329.88	m2	921.53	303,994.32	
4.08	Construccion de contenes en la C/Hermanos deline desde la C/Jose Francisco hasta la C/Juan Pablo Duarte (164.94)*2	329.88	ml	946.78	312,323.79	
4.09	Construccion de aceras en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63*1.00)*2	579.26	m2	921.53	533,805.47	
4.1	Construccion de contenes en la C/Juan Pablo Duarte desde la C/Napoleón hasta la C/Pron. Juan Pablo Duarte (289.63)*2	289.63	ml	946.78	274,215.89	
4.11	Construccion de aceras en la C/Boy scout 1era desde la C/ Perla Gomez hasta el Final (45.73*0.75)*2	91.46	m2	921.53	84,283.13	
4.12	Construccion de contenes en la C/Boy scout 1era desde la C/Perla Gomez hasta el Final (45.73)*2	91.46	ml	946.78	86,592.50	
4.13	Construccion de aceras en la C/Boy scout 2da desde la C/ Perla Gomez hasta el Final (45.73*0.75)*2	91.46	m2	921.53	84,283.13	
4.14	Construccion de contenes en la C/Boy scout 2da desde la C/ Perla Gomez hasta el Final (45.73)*2	91.46	ml	946.78	86,592.50	
4.15	Construccion de aceras en la C/Boy scout 3era desde la C/Perla Gomez hasta el Final (45.73*0.75)*2	91.46	m2	921.53	84,283.13	
4.16	Construccion de contenes en la C/Boy scout 3era desde la C/Perla Gómez hasta el Final (45.73)*2	91.46	ml	946.78	86,592.50	**4,291,746.92**

ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
Autopista La Victoria, 11, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.
Telf. 849-875-0727, Ced. 001-0737283-1, e-mail:.ajrodriguez1227@gmail.com

Obra: Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sanchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte, C/Boy scout, C/Hermanas Mirabal, C/Rosa Duarte, C/Orlando Martinez), en el sector Villa progreso, Chavón (06).

Sector: Villa progreso, Chavón (06).
Ubicación: Los Alcarrizos

PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
V-	**HORMIGON ARMADO**					
5.01	Construcción de Baden transversal en la C/Juan Bosch (7.10*2.00)	14.20	m2	3,198.54	45,419.24	
5.02	Construcción de Baden Transversal en la C/Rosa Duarte (6.60*2.00)	13.20	m2	3,198.54	42,220.70	
5.03	Construcción de Baden en la C/Sanchez esq. C/Orquidea (6.50*2.00)	13.00	m2	3,198.54	41,580.99	
5.04	Construcción de Baden en la C/Sanchez esq. C/Horacio Vazquez (6.50*2.00)	13.00	m2	3,198.54	41,580.99	
5.05	Construcción de Baden en la C/Santa Fe esq. C/Sanchez (6.50*2.00)	13.00	m2	3,198.54	41,580.99	
5.06	Construcción de Baden en la C/Orlando Martinez esq. C/Oquidea (6.50*2.00)	13.00	m2	3,198.54	41,580.99	
5.07	Construcción de Baden en la C/Orlando Martinez esq. C/Horacio Vazquez (6.50*2.00)	13.00	m2	3,198.54	41,580.99	
5.08	Construcción de Baden en la C/la Enfermera esq. C/Orlando Martinez (6.50*2.00)	13.00	m2	3,198.54	41,580.99	
5.09	Construcción de Baden en la C/Santa Fe esq. C/Orlando Martinez (6.50*2.00)	13.00	m2	3,198.54	41,580.99	**378,706.87**
VI-	**LIMPIEZA FINAL**					
6.01	Limpieza general y final	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	**15,000.00**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					**5,246,874.68**

ING. ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO

Autopista La Victoria, 11, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.
Telf. 849-875-0727, Ced. 001-0737283-1, e-mail:.ajrodriguez1227@gmail.com

Obra: Construcción de aceras, contenes, badenes, registros y canaleta en las calles (C/Juan Bosch, C/Santa Fe, C/Sanchez, C/Princesa, C/Hermanos Deline, C/Juan Pablo Duarte, C/Boy scout, C/Hermanas Mirabal, C/Rosa Duarte, C/Orlando Martinez), en el sector Villa progreso, Chavón (06).

Sector: Villa progreso, Chavón (06).
Ubicación: Los Alcarrizos

PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					5,246,874.68

GASTOS INDIRECTOS

Dirección Técnica y Resp. Civil.	10.00%	524,687.47	
Gastos Administrativos.	3.00%	157,406.24	
Seguros y finanzas.	2.50%	131,171.87	
Liquidacion y Prest. Laborales. Ley 686.	1.00%	52,468.75	
Codia 1x1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus dependencias.	0.10%	5,246.87	
ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo I).	18.00%	94,443.74	965,424.94

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO	6,212,299.63

Preparado Por:

Ing. Antonio Rodríguez Hilario
Codia 21826

25 de marzo del 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
01 de Septiembre del 2022

Oficio No. 001-2022
Contrato No: 020-2022

Al	:	**Sr. Cristian Encamación** Alcalde del AMA
Vía	:	**Lic. Luisanna Guzmán** Directora de Administrativo
Del	:	**Ing. Freddy M. Dini Lebrón** Director de Obras Publicas Municipal
Anexo	:	Cubicación Autorizada. Fotos.

Asunto	:	Solicitud Pago de Cub. 4 Y FINAL

Muy cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el pago de la cub. 4 y final, Correspondiente a Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, C/ Larimar, C/ Ónice, C/ 1ra y C/ Los Pedros en el **Sector La Esmeralda**. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. Por un monto de **RD$ 1, 692,490.12 (Un Millón, Seiscientos Noventa y Dos Mil, Cuatrocientos Noventa pesos con 12/100).** Con Fondos de la Liga.

El mismo a nombre de **Ing. Ruddy Mateo Jiménez** Portador de la cedula de identidad **No- 001-1082606-2**.

Sin otro particular se despide:

Atentamente:

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
01 de noviembre de 2022

Al	:	**Sr. Cristian Encamación** Alcalde del AMA
Vía	:	**Lic. Luisana Guzmán** Directora Administrativa
Del	:	**Ing. Freddy M. Dini Lebrón** Director de Obras Publicas Municipal
Asunto	:	Informe de inspección a nombre del **Ing. Ruddy Mateo Jiménez,** Portador de la cédula de Identidad y electoral **No- 001-1082606-2**.
Anexo	:	Fotos y Soporte Técnico.

Muy cortésmente, me dirijo a usted, para remitirle el informe de Inspección del cierre de la **cubicación No.4 y final**, perteneciente al **contrato 020-2022**, Correspondiente a Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, C/ Larimar, C/ Ónice, C/ 1ra y C/ Los Pedros en el **Sector La Esmeralda**. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. Esta obra se encuentran ejecutada en un **91.72%.**

Este informe fue suministrado, evaluado y autorizado por la parte interesadas:

Ing. José Modesto Navarro
Supervisor

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA) DEPARTAMENTO DE AUDITORIA REVISADO Prov. Sto. Dgo. R.D.

Ing. Ruddy Mateo Jiménez
Contratista

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipales

"AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS"
(AMA)
Dirección de Obras Públicas Municipales

Contratista:	ING. RUDDY MATEO JIMENEZ
Obr	Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, C/ Larimar, C/ Ónice, C/ 1ra y C/ Los Pedros en el Sector La Esmeralda. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.
Cod.	AMA07-OP00721-P000-M
Sector:	Sector La Esmeralda
Cub. No.	4 y final
Fecha:	1 de noviembre de 2022

No. Contrato 020-2022

Periodo: Agosto / Noviembre - 2022

Monto Contratado:	5,521,669.30
Monto a Ejecutar:	4,371,509.10
Monto a ejecutar mas Impuestos:	5,521,669.30
Avance Inicial:	1,104,333.86
Avance de Obra:	91.72%
Monto adiconal 25% monto contratado	1,380,417.33
Avance Adiconal	42.31%

		PRESUPUESTADO							CUBICACION No.2 (Anterior)			CUBICACION No.3 (Anterior)			CUBICACION No.4 (Actual)			CUBICACION ACUMULADA		
No.	PARTIDAS	Cantidad	Unidad	Costo Uni.	Valor	Cantidad	Valor	%	Cantidad	Valor	%	Cantidad	Valor	%	Cantidad	Valor	%	Cantidad	Valor	%
1.01	Vallas informativa de la obra.	1.00	Ud.	15,000.00	15,000.00	1.00	15000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	15000.00	100.00%
					15,000.00		**15,000.00**			**0.00**			**0.00**			**0.00**			**15,000.00**	
II	**MOVIMIENTO DE TIERRA**																			
2.01	Demolición de aceras en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10*1.00)*2	434.20	m^2	100.00	43,420.00	0.00	0.00	0.00%	204.80	20,480.00	47.17%	0.00	-	0.00%	139.59	13,959.10	32.15%	344.39	34,439.10	79.32%
2.02	Demolición de contenes en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10)*2	434.20	Ml	100.00	43,420.00	0.00	0.00	0.00%	336.80	33,680.00	77.57%	0.00	-	0.00%	72.60	7,260.00	16.72%	409.40	40,940.00	94.29%
2.03	Demolición de aceras en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (84,70,10*1,00)*2	169.40	m^2	100.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00%	35.70	3,570.00	21.07%	105.01	10,501.11	61.99%	-23.89	-2,389.00	-14.10%	116.82	11,682.11	68.96%
	Demolición de contenes en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (80,70)*2	169.40	Ml	100.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00%	150.00	15,000.00	88.55%	0.00	-	0.00%	27.30	2,730.00	16.12%	177.30	17,730.00	104.66%
2.05	Demolición de aceras en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56,90*1.00)*2	113.80	m^2	100.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00%	86.70	8,670.00	76.19%	27.10	2,709.58	23.81%	-9.33	-932.50	-8.19%	104.47	10,447.08	91.80%
2.06	Demolición de contenes en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56,90)*2	113.80	Ml	100.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00%	100.00	10,000.00	87.87%	0.00	-	0.00%	6.00	600.00	5.27%	106.00	10,600.00	93.15%
2.07	Demolición de aceras en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56,90*1.00)*2	113.80	m^2	100.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00%	64.10	6,410.00	56.33%	0.00	-	0.00%	13.16	1,316.00	11.56%	77.26	7,726.00	67.89%
2.08	Demolición de contenes en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56,90)*2	113.80	Ml	100.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00%	91.50	9,150.00	80.40%	0.00	-	0.00%	13.70	1,370.00	12.04%	105.20	10,520.00	92.44%
2.09	Demolición de aceras en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (182,70*1.00)*2	365.40	m^2	100.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00%	193.90	19,390.00	53.07%	74.40	7,439.54	20.36%	97.10	9,710.00	26.57%	365.40	36,539.54	100.00%
2.1	Demolición de contenes en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (217,10)*2	365.40	Ml	100.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00%	210.40	21,040.00	57.58%	0.00	-	0.00%	155.00	15,500.00	42.42%	365.40	36,540.00	100.00%
2.11	Demolición de aceras en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80*1.00)*2	451.60	m^2	100.00	45,160.00	0.00	0.00	0.00%	217.54	21,754.00	48.17%	42.99	4,299.23	9.52%	125.72	12,572.00	27.84%	386.25	38,625.23	85.53%
2.12	Demolición de contenes en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80)*2	451.60	Ml	100.00	45,160.00	0.00	0.00	0.00%	247.90	24,790.00	54.89%	40.28	4,028.27	8.92%	131.02	13,102.00	29.01%	419.20	41,920.27	92.83%

2.13	Demolición de aceras en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (71,40*1.00)*2	142.80	m^2	100.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00%	38.18	3,818.00	26.74%	21.28	2,127.72	14.90%	0.00	0.00	0.00%	59.46	5,945.72	41.64%
2.14	Demolición de contenes en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (69,80)*2	142.80	Ml	100.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00%	137.09	13,709.00	96.00%	5.71	571.20	4.00%	0.00	0.00	0.00%	142.80	14,280.20	100.00%
2.15	Demolición de Baden en la C/ Jade esquina C/ cristal (7*2)	5.60	m^3	1,250.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	5.31	6,633.00	94.76%	0.00	0.00	0.00%	5.31	6,633.00	94.76%
2.16	Demolición de Baden en la C/ Gema (4,2*2)	3.36	m^3	1,250.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	3.36	4,200.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3.36	4,200.00	100.00%
2.16	Demolición de Baden en la C/ Respaldo Jade esquina C/ Rubí (7,40*2)	5.92	m^3	1,250.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-	-	0.00%
2.17	Demolición de Baden C/ cristal hasta esquina C/ Rubí (6,10*2)	4.88	m^3	1,250.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-	-	0.00%
2.18	Demolición de Baden en la C/ Cardalina (5,80*2)	4.64	m^3	1,250.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	4.64	5,800.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.64	5,800.00	100.00%
2	Demolición de Baden en la C/ Larimar (4,50*2)	3.60	m^3	1,250.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	3.60	4,500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3.60	4,500.00	100.00%
2.2	Demolición de Baden en la C/ 1ra (4,60*2)	3.68	m^3	1,250.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-	-	0.00%
2.21	Demolición de Baden en la C/ Estancia próximo C/ San Marcos (7,5*2)	6.00	m^3	1,250.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-	-	0.00%
					405,300.00	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**211,461.00**			**52,809.65**			**74,797.60**			**339,068.25**	
III	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION**																			
3.01	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10*1.00*0.10)*2	43.42	m^3	550.00	23,881.00	7.69	4228.85	17.71%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	35.73	19,651.50	82.29%	43.42	23,880.35	100.00%
3.02	Telford para contenes en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10*0.45*0.10)*2	19.54	m^3	2,155.83	42,122.76	10.54	22720.18	53.94%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	9.00	19,402.47	46.06%	19.54	42,122.65	100.00%
3.03	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (84,70,10*1.00*0.10)*2	16.94	m^3	550.00	9,317.00	2.21	1215.50	13.05%	0.00	-	0.00%	10.50	5,775.61	61.99%	0.00	0.00	0.00%	12.71	6,991.10	75.04%
3.04	Telford para contenesen la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (80,70*0.45*0.10)*2	7.62	m^3	2,155.83	16,433.89	2.56	5510.28	33.53%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.56	5,510.28	33.53%
3.05	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56,90*1.00*0.10)*2	11.38	m^3	550.00	6,259.00	6.11	3360.46	53.69%	0.00	-	0.00%	3.31	1,820.50	29.09%	1.96	1,078.00	17.22%	11.38	6,258.96	100.00%
3	Telford para contenes en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56,90*0.45*0.10)*2	5.12	m^3	2,155.83	11,040.01	3.30	7120.69	64.50%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	1.82	3,919.30	35.50%	5.12	11,039.99	100.00%
3.07	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56,90*1.00*0.10)*2	11.38	m^3	550.00	6,259.00	3.78	2078.99	33.22%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	7.60	4,180.00	66.78%	11.38	6,258.99	100.00%
3.08	Telford para contenes en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56,90*0.45*0.10)*2	5.12	m^3	2,155.83	11,040.01	2.40	5173.99	46.87%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	2.72	5,866.01	53.13%	5.12	11,040.01	100.00%
3.09	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (182,70*1.00*0.10)*2	36.54	m^3	550.00	20,097.00	19.39	10664.47	53.07%	0.00	-	0.00%	7.44	4,091.75	20.36%	9.71	5,340.50	26.57%	36.54	20,096.72	100.00%
3.1	Telford para contenes en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (217,10*0.45*0.10)*2	16.44	m^3	2,155.83	35,448.31	9.47	20411.14	57.58%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	6.98	15,036.91	42.42%	16.44	35,448.05	100.00%
3.11	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80*1.00*0.10)*2	45.16	m^3	550.00	24,838.00	21.75	11964.46	48.17%	0.00	-	0.00%	4.30	2,364.58	9.52%	19.11	10,507.75	42.31%	45.16	24,836.79	100.00%
3.12	Telford para contenes en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80*0.45*0.10)*2	20.32	m^3	2,155.83	43,810.78	11.16	24049.05	54.89%	0.00	-	0.00%	1.81	3,907.92	8.92%	7.35	15,851.82	36.18%	20.32	43,808.79	100.00%

3.13	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (71,40*1.00*0.10)*2	14.28	m^3	550.00	7,854.00	3.82	2099.85	26.74%	0.00	-	0.00%	2.13	1,170.25	14.90%	8.34	4,584.25	58.37%	14.28	7,854.34	100.00%
3.14	Telford para contenesen la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (69,80*0.45*0.10)*2	6.43	m^3	2,155.83	13,853.36	6.17	13299.23	96.00%	0.00	-	0.00%	0.26	554.13	4.00%	0.00	0.00	0.00%	6.43	13,853.36	100.00%
					272,254.12		**133,897.14**			**0.00**			**19,684.74**			**105,418.51**			**259,000.39**	
IV	**HORMIGON SIMPLE**																			
4.01	Construcción de aceras en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10*1.00*0.10)*2	434.20	m^2	1,098.25	476,860.15	76.89	84442.40	17.71%	54.11	59426.31	12.46%	0.00	0.00	0.00%	213.39	234,356.67	49.15%	344.39	378,225.37	79.32%
4.02	Construcción dea contenes en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10*0.45*0.10)*2	434.20	Ml	911.18	395,634.36	234.20	213397.26	53.94%	102.60	93487.07	23.63%	0.00	0.00	0.00%	72.60	66,151.67	16.72%	409.40	373,035.99	94.29%
4	Construcción de aceras en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (84,70,10*1.00*0.10)*2	169.40	m^2	1,098.25	186,043.55	22.10	24271.24	13.05%		0.00	0.00%	105.01	115327.23	61.99%	-10.29	-11,300.99	-6.07%	116.82	128,297.48	68.96%
4.04	Construcción de contenes en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (80,70*0.45*0.10)*2	169.40	Ml	911.18	154,353.89	56.80	51754.86	33.53%	112.60	102598.87	66.47%	0.00	0.00	0.00%	7.90	7,198.32	4.66%	177.30	161,552.05	104.66%
4.05	Construcción de aceras en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56,90*1.00*0.10)*2	113.80	m^2	1,098.25	124,980.85	61.10	67102.22	53.69%	0.00	0.00	0.00%	33.07	36319.13	29.06%	10.31	11,317.47	9.06%	104.47	114,738.81	91.81%
4.06	Construcción de contenes en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56,90*0.45*0.10)*2	113.80	Ml	911.18	103,692.28	73.40	66880.49	64.50%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	32.60	29,704.47	28.65%	106.00	96,584.95	93.15%
4.07	Construcción de para aceras en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56,90*1.00*0.10)*2	113.80	m^2	1,098.25	124,980.85	37.80	41513.64	33.22%	26.30	28883.98	23.11%	0.00	0.00	0.00%	13.16	14,452.97	11.56%	77.26	70,410.77	67.89%
4.08	Construcción de contenes en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56,90*0.45*0.10)*2	113.80	Ml	911.18	103,692.28	53.40	48656.57	46.92%	38.10	34715.96	33.48%	0.00	0.00	0.00%	13.70	12,483.17	12.04%	105.20	95,855.69	92.44%
4.09	Construcción de aceras en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (182,70*1.00*0.10)*2	365.40	m^2	1,098.25	401,300.55	193.90	212950.14	53.07%	30.40	33386.80	8.32%	74.40	81709.80	20.36%	66.70	73,253.28	18.25%	365.40	401,300.01	100.00%
4.1	Construcción de contenes en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (217,10*0.45*0.10)*2	365.40	Ml	911.18	332,945.17	210.40	191709.83	57.58%	40.40	36811.67	11.06%	0.00	0.00	0.00%	114.60	104,421.23	31.36%	365.40	332,942.73	100.00%
4.11	Construcción de aceras en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80*1.00*0.10)*2	451.60	m^2	1,098.25	495,969.70	217.54	238908.60	48.17%	0.00	0.00	0.00%	43.00	47224.75	9.52%	125.71	138,061.01	27.84%	386.25	424,194.36	85.53%
4	Construcción de contenes en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80*0.45*0.10)*2	451.60	Ml	911.18	411,488.89	247.90	225878.60	54.89%	0.00	0.00	0.00%	40.30	36720.55	8.92%	131.00	119,364.58	29.01%	419.20	381,963.73	92.82%
4.13	Construcción de aceras en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (71,40*1.00*0.10)*2	142.80	m^2	1,098.25	156,830.10	38.18	41930.10	26.74%	0.00	0.00	0.00%	21.28	23370.76	14.90%	72.56	79,689.02	50.81%	132.02	144,989.88	92.45%
4.14	Construcción de contenes en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (69,80*0.45*0.10)*2	142.80	Ml	911.18	130,116.50	137.09	124911.84	96.00%	0.00	0.00	0.00%	5.71	5202.84	4.00%	0.00	0.00	0.00%	142.80	124,911.84	100.00%
					3,598,889.13		**1,634,307.77**			**389,310.65**			**345,875.06**			**879,152.84**			**3,229,003.68**	
V	**HORMIGON ARMADO**																			
5.01	Construcción de Baden en la C/ Jade esquina C/ cristal (7*2)	14.00	m^2	3,559.66	49,835.24	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	13.27	47222.45	94.76%	0.00	0.00	0.00%	13.27	47,222.45	94.76%
5.02	Construcción de Baden en la C/ Gema (4,2*2)	8.40	m^2	3,559.66	29,901.14	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.40	29901.14	100.00%	0.00	0.00	0.00%	8.40	29,901.14	100.00%
5.03	Construcciónde Baden en la C/ Respaldo Jade esquina C/ Rubí (7,40*2)	14.80	m^2	3,559.66	52,682.97	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%

5.04	Construcción de Baden C/ cristal hasta esquina C/ Rubí (6,10*2)	12.20	m^2	3,559.66	43,427.85	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
5.05	Construcción de Baden transversal en la C/ Cardalina (5.80*2.0)	11.60	m^2	3,559.66	41,292.06	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11.60	41292.06	100.00%	0.00	0.00	0.00%	11.60	41,292.06	100.00%
5.06	Construcción de Baden en la C/ Larimar con c/ ambar (4,50*2)	9.00	m^2	3,559.66	32,036.94	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.00	32036.94	100.00%	0.00	0.00	0.00%	9.00	32,036.94	100.00%
5.07	Construcción de Baden en la C/ 1ra (4,60*2)	9.20	m^2	3,559.66	32,748.87	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
5.08	Construcción de Baden en la C/ Estancia próximo C/ San Marcos (7,5*2)	15.00	m^2	3,559.66	53,394.90	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
					335,319.97		**0.00**			**0.00**			**150,452.59**			**0.00**			**150,452.59**	
VII	**LIMPIEZA FINAL**																			
7.01	Limpieza general y final.	1.00	P.A.	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	1.00	17000.00	100.00%	1.00	17,000.00	100.00%
					17,000.00		**0.00**			**0.00**			**0.00**			**17,000.00**			**17,000.00**	
	PARTIDAS ADICIONALES																			
II	**MOVIMIENTO DE TIERRA**																			
2.09	Demolición de aceras en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia 199.80 m2	199.80	m2	100.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	199.80	19,980.00	100.00%	199.80	19,980.00	100.00%
2.1	Demolición de contenes en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia 32.27 ml	32.27	Ml	100.00	3,227.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	32.27	3,227.00	100.00%	32.27	3,227.00	100.00%
																			23,207.00	
III	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION**																			
3.01	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (25.46)m3	25.46	m^3	550.00	14,003.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	25.46	14,003.00	100.00%	25.46	14,003.00	100.00%
3.	Telford para contenes en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (17.31) m3	17.31	m^3	2,155.83	37,317.42	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	17.31	37,317.42	100.00%	17.31	37,317.42	100.00%
3.03	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (9.52) m3	9.52	m^3	550.00	5,236.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	9.52	5,236.00	100.00%	9.52	5,236.00	100.00%
3.04	Telford para contenes en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (5.37) m3	5.37	m^3	2,155.83	11,576.81	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	5.37	11,576.81	100.00%	5.37	11,576.81	100.00%
3.05	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (4.07) m3	4.07	m^3	550.00	2,238.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	4.07	2,238.50	100.00%	4.07	2,238.50	100.00%
3.06	Telford para contenes en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (4.35) m3	4.35	m^3	2,155.83	9,377.86	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	4.35	9,377.86	100.00%	4.35	9,377.86	100.00%
3.07	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (76.50) m3	76.50	m^3	550.00	42,075.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	76.50	42,075.00	100.00%	76.50	42,075.00	100.00%
3.08	Telford para contenes en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (19.35)m3	19.35	m^3	2,155.83	41,715.31	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	19.35	41,715.31	100.00%	19.35	41,715.31	100.00%
3.09	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (32.09) m3	32.09	m^3	550.00	17,649.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	32.09	17,649.50	100.00%	32.09	17,649.50	100.00%

3.1	Telford para contenes en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (17.41) m3	17.41	m^3	2,155.83	37,533.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	17.41	37,533.00	100.00%	17.41	37,533.00	100.00%
3.11	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (12.12) m3	12.12	m^3	550.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	12.12	6,666.00	100.00%	12.12	6,666.00	100.00%
3.12	Telford para contenesen la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (19.97) m3	19.97	m^3	2,155.83	43,051.93	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%	19.97	43,051.93	100.00%	19.97	43,051.93	100.00%
																			268,440.32	
IV	**HORMIGON SIMPLE**																			
4.09	Construcción de aceras en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (199.80) m2	199.80	m^2	1,098.25	219,430.35	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	199.80	219,430.35	100.00%	199.80	219,430.35	100.00%
4	Construcción de contenes en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (32.27) ml	32.27	Ml	911.18	29,403.78	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	32.27	29,403.78	100.00%	32.27	29,403.78	100.00%
4.14	Construcción de contenes en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (23.60) ml	23.60	Ml	911.18	21,503.85	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	23.60	21,503.85	100.00%	23.60	21,503.85	100.00%
																			270,337.98	
V	**HORMIGON ARMADO**																			
0.01	Construcción de Baden en la C/ Larimar con c/ ambar 6.21 m2	6.21	m^2	3,559.66	22,105.49	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.21	22,105.49	100.00%	6.21	22,105.49	100.00%
																			22,105.49	
	Sub-Total General ADICONAL																		**584,090.786**	
	Sub-Total General				**4,371,509.10**														**4,009,524.908**	
B	***GASTOS INDIRECTOS:***								***GASTOS INDIRECTOS ADICIONAL:***											
1.000	*DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. CIVIL.*			*10.000%*					58,409.08										400,952.49	
1.001	*GASTOS ADMINISTRATIVOS.*			*3.000%*					17,522.72										120,285.75	
1	*SEGUROS Y FIANZAS.*			*2.500%*					14,602.27										100,238.12	
1.003	*LIQUIDACIÓN Y PRESTS . LABORALES. Ley 686*			*1.000%*					5,840.91										40,095.25	
1.004	*CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus dependencias*			*0.100%*					584.09										4,009.52	
1.005	*ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4- Parrafo I)*			*18.000%*					10,513.63										72,171.45	
									107,472.70											
	Total Gastos Indirectos																		**737,752.58**	
	Total Cubicado hasta la Fecha																		**4,747,277.49**	
	TOTAL PAGADA CUB. 1																		**2,111,322.21**	
	TOTAL PAGADA CUB. 2																		**711,313.63**	
	TOTAL PAGADA CUB. 3																		**673,483.36**	

	TOTAL CUBICADO CUB. 4 y final															
	Amortizacion 20% valor cub.4 y final															
	TOTAL CUBICADO ADICONAL CUB 4 y final															
	TOTAL A PAGAR DE CUB. 4 y final + adicional															

Nota: **Los datos procesados en esta cubicacion fueron suministrado DO por el supervisor de dicha obra.** La presente Cubicacion se expide a total responsabilidad del Depto de Supervicion, mediante los supervisores actuantes en la misma.-

Preparado Por:

Joicy Castillo Mañon
Enc. de Cubicación de OP

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DEPTO. DE CUBICACIONES
DGOP
Prov. Sto. Dgo. R.D.

Supervisado por:

Sr. Cesar Puala Frias
Enc. de Supervicion

Aprobado Por:

ING. RUDDY MATEO JIMENEZ
Contratista

Datos susminitrados por:

Ing. Jose Modesto Navarro
Supervisor del AMA

Revisador por:

Ing. Juan Carlos Rosario
Enc. de Presupuesto

Aprobado Por:

Ing. Freddy M. Dini Lebron
Director de la Dirección de Obras Publicas Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SANTO DOMINGO, REP. DOM.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION
REVISADO

							1,251,158.29	
							250,231.66	
							691,563.49	
							1,692,490.12	

actuantes en la misma.-

Aprobado Por:

ING. RUDDY MATEO JIMENEZ
Contratista

Aprobado Por:

Ing. Freddy M. Dini Lebron
Director de la Dirección de Obras Publicas Municipal

Levantamiento aceras y contenes, la Esmeralda
Cub. Final (TOTAL)

- c/Jade desde c/san Marcos hasta c/Piedra

Contenes: 6.9 + 2.8 + 4.6 + 28.5 + 8 + 5.6 + 10.8 + 5 + 13.9 + 10 + 7 + 8.2 + 8.9 + 12.4 + 29.8 + 10.10 + 10.4 + 36.9 + 43.6 + 7.3 + 15.4 + 12.6 + 12 + 47.30 + 5.8 + 14.80 + 15.4 + 1.5 + 8.5 = 409.4 mL

- Demolición 409.4 mL, Telford 36.85 m³

Aceras: (6.9 x 1.27) + (2.8 x 1) + (4.6 x 1) + (28.5 x 1) + (5.6 x 0.90) + (10.8 x 0.8) + (5 x 0.8) + (13.9 x 0.45) + (7 x 0.9) + (8.2 x 0.49) + (8.9 x 0.9) + (12.4 x 0.70) + (29.8 x 1) + (10.10 x 0.30) + (10.4 x 1) + (36.9 x 1) + (43.6 x 1) + (7.3 x 0.6) + (15.4 x 1) + (12.6 x 0.8) + (12 x 0.9) + (47 x 1.05) + (0.3 x 1.05) + (5.8 x 1.5) + (14.80 x 0.8) + (15.4 x 1) + (8.5 x 0.8) = 344.391 m²

- Demolición 344.391 m², caliche 68.88 m³

- C/Rep. Jade

Contenes: 14.3 + 37.8 + 27.1 + 6.4 + 2 + 6 + 11.6 = 105.2 mL

- Demolición 105.2 mL, Telford 9.47 m³

Aceras: (14.3 x 1.7) + (37.8 x 0.7) + (27.1 x 0.5) + (6.4 x 0.3) + (2 x 0.55) + (6 x 0.3) + (11.6 x 0.7) = 77.26 m²

- Demolición 77.26 m², caliche 15.45 m³

- C/Jema

Contenes: 12.3 + 14.8 + 25.3 + 20.1 + 7.5 + 26 = 106 mL

Aceras: (12.3 x 0.85 + (14.8 x 1.4) + (25.3 x 1) + (20.1 x 1) + (7.5 x 0.6) + (26 x 0.9) = 104.475 m²

- Demolición de contenes 106 mL, Telford 10.49 m³
- Demolición de aceras 104.475 m², caliche 20.90 m³

- C/ambar

Contenes: 52.80 + 30.40 + 18.10 + 23.10 + 11 + 6 + 24 + 20 + 30 + 10.3 + 10.8
+ 16.3 + 11.8 + 28.6 + 28.20 + 10.40 + 44 + 38.4 = 419.20 mL

• Demolicion 419.20 mL, TenFold 37.73 m3

Areas: (52.80 x 0.95) + (30.40 x 1.10) + (18.10 x 0.90) + (23.10 x 0.90)
+ (11 x 0.8) + (6 x 1.3) + (24 x 1) + (10.3 x 1) + (10.8 x 0.6) + (16.3 x 1)
+ (11.8 x 1.2) + (28.6 x 1) + (28.20 x 1) + (10.4 x 0.4) + (44 x 1) + (9.7 x 1)
+ (4 x 0.5) + (16.5 x 1.2) + (1 x 0.65) + (15.50 x 1.05) + (17.4 x 0.9)
+ (3.3 x 0.45) + (2.2 x 1) = 386.25 m2

• Demolicion 386.25 m2, Caliche 77.25 m2

- C/ZAFIRO (no esta)

Contenes: 109 mL

• Demolicion 109 mL, TenFold 9.81 m3

- C/Oniel (no esta)

Contenes: 10.40 + 164 = 174.40 mL

• Demolicion 174.40 mL, TenFold 15.70 m3

- C/Zarimar (no esta)

Contenes: 18.1 + 37.4 = 55.50 mL

• Demolicion 55.50 mL, TenFold 4.995 m3

-C/Cristal

Contenes: 5.6+15.60+9.5+23+10.6+2.3+8.3+10+13.1+9.9+3.6+2.5
+16.6+11.5+19.8+15.40+3.2+18.8+0.25+0.52+5.3+7+3.4
+1.8+18.6+62.9+98.6 = 397.67 mL

• Demolición 397.67 mL, Terfold 35.79 m³

aceras: (5.6×1.30)+(15.60×0.50)+(9.5×0.5)+(23×0.9)+(10.6×0.6)+(2.3×0.8)
+(8.3×1.10)+(10×1.1)+(9.9×0.5)+(3.6×0.9)+(16.6×1)+(11.50×1.10)+(19.8×0.5)
+(15.40×1.4)+(3.2×2.7)+(18.8×1)+(0.24×0.70)+(8.2×0.75)+(17.7×0.6)
+(0.25×0.80)+(0.52×1.30)+(5.3×1.15)+(7×0.75)+(3.4×0.44)+(18.6×0.5)
+(62.9×1.10)+(98.6×1) = 565.20 m²

Encache: 7.1×0.60×0.20 m³ / Escalons 4ud Longitud 0.90 m

• Demolición 565.20 m², caliche 113.04 m³

-C/Cordalina

CONTenes: 28.4+15.5+19.30+4.9+35.30+8.10+24.5+30.40
= 166.4 mL

aceras: (28.40×0.5)+(15.50×0.90)+(19.30×1.15)+(35.30×1)
+(24.50×0.65)+(30.40×1) = 132.02 m²

Extras Demolición

• Excavación para conteñes 18.72 m³, Terfold 18.72 m³

• Excavación para aceras 26.40 m³, caliche 26.40 m³

11/46

C/Topacio

Contenes: (26.3+29.5+4.2+9.5+25.1+44.2+3.7+10.3+10.8 +9.10+4.6) = 177.3 mL ✓ • Demolición 177.3 mL, Terfald 15.96 m³

Aceras: (26.3x0.5)+(29.5x0.8)+(4.2x1.2)+(9.5x0.8)+(44.2x0.5) +(10.3x0.9)+(9.10x1.3)+(8.10x0.90)+(1.3x0.3)+(2.6x1) +(2.6x0.15)+(2.5x0.55)+(6.6x0.75)+(2.8x1)+(0.8x0.4)+(3.3x0.5) +(4.6x0.5) = 116.82 m² ✓

• Demolición 116.82 m² ✓ caliche 23.36 m³

• Badenes

C/Lavimar con C/Ambar: 7.7x1.98 = 15.21 m² ✓

C/Eunice con C/ambar: 7.85x2 = 15.70 m² (Part. nueva)

Transversal en C/Catalina: 6x2.08 = 12.48 m² ✓

C/ambar con C/Cristal: 8.15x2 = 16.30 m² (Part. nueva)

C/Cristal con C/Jade: 6.7x1.98 = 13.23 m² ✓

Transversal en C/Cristal casi Esq. C/ambar: 4.20x2.10 = 8.82 m² (Part. nueva)

C/Jade con C/Topacio: 8.15x2.15 = 17.52 m² (Part. nueva)

Transversal en C/Jema: 4.20x2.07 = 8.69 m² ✓

Img. Modesto

31/10/22














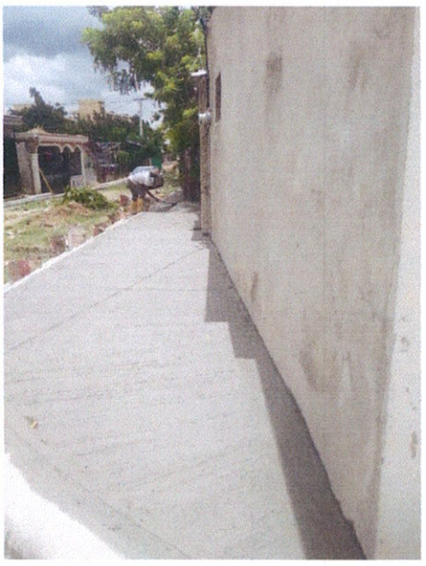










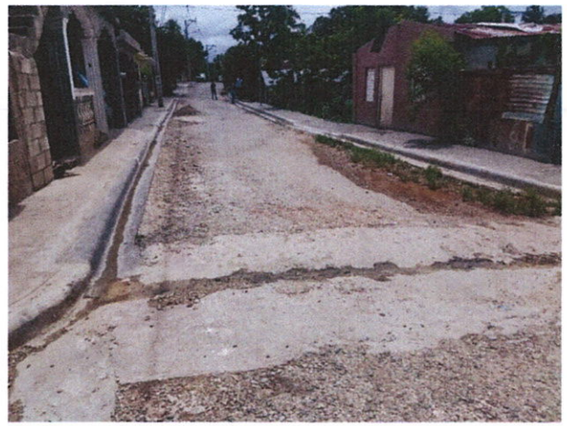












K&J
IND.







Fecha	Concepto	Valor
3/11/2022	P/R PAGO A FAVOR DEL SR. RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO D E PAGO DE CUBICACION #4 Y FINAL, PARA LA CONTRUCCION DE DE A ERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA	1,614,535.55

7281

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
PROGRAMA DE INVERSION

No. 018769

DIA	MES	AÑO
03	11	2022

RNC: 430-04253-6
DO28BRRD00000000002440009274

0017032

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RUDDY MATEO JIMENEZ **RD$** *1,614,535.55

*** UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 55/100 *** **PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

I Rodriguez

FIRMA(S)

"018769" 211127271300244000927 4" 28

Cap. No. _____ *Sub-Objeto* _____ *Fondo* _____ *Comprobante No.* _____ *Fecha* _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
No. Comprobante . . : 2204879 P/R PAGO A FAVOR DEL SR. RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION #4 Y FINAL, PARA LA CONTRUCCION DE DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA EN LOS AL		Estructura Clasific. 0011010094 272401 0011010095 272401	98,820.12 1,515,715.43

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

TOTAL

Form. 815

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)

Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

COMPROBANTE No. 2204879
FECHA 3/11/2022
SECUENCIAL: 4941

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2204878 **Etapa:** Pagado

CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 18120 **RNC/CED/PAS:** 00110826062

BENEFICIARIO: RUDDY MATEO JIMENEZ

DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R PAGO A FAVOR DEL SR. RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION #4 Y FINAL, PARA LA CONTRUCCION DE DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA EN LOS ALCARRIZOS, CONTRATO NO. 020/2022, COMUNICACION D/F 03/11/2022. ANEXO***UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 55/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación		Valor RD$
00 11 01 0094	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas		98,820.12
00 11 01 0095	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas		1,593,670.00
					Menos las siguientes Retenciones		
00 11 01 0095	272401	40	9992	103	CODIA 0.10	De: 1,692,490.12	(4,009.52)
00 11 01 0095	272401	40	9992	103	FOPETCONS	De: 1,692,490.12	(40,095.25)
00 11 01 0095	272401	40	9992	103	MENOS 2%	De: 1,692,490.12	(33,849.80)
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****		

Total RD$ 1,614,535.55

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No.	2204878
FECHA	3/11/2022
SECUENCIAL:	4940

TIPO COMPROBANTE: 2204879 **Etapa:** Devengado

CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 18120 **RNC/CED/PAS:** 00110826062

BENEFICIARIO: RUDDY MATEO JIMENEZ

DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R PAGO A FAVOR DEL SR. RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION #4 Y FINAL, PARA LA CONTRUCCION DE DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA EN LOS ALCARRIZOS, CONTRATO NO. 020/2022, COMUNICACION D/F 03/11/2022. ANEXO***UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 12/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0094	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	98,820.12
00 11 01 0095	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,593,670.00
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	
					Total RD$	1,692,490.12

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

DIRECCION ADMINISTRATIVA

03 de noviembre de 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde Municipal

Vía : Dirección Financiera

De la : Dirección Administrativa

Asunto : Pago cubicación **#4 y final**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCIÓN FINANCIERA
AUTORIZADO
Firma
Fecha 3/11/2022

Distinguidos Señores:

Cortésmente le estamos solicitando el pago a favor de**: Ruddy Mateo Jimenez.**

Codia: 20925 Contrato No. **020/2022**. RNC: **001-1082606-2**

Monto a pagar**: RD$1,692,490.12 (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTO NOVENTA PESOS CON 12/100).**

Por concepto de Pago de: Cubicación **#4 y final**, para la construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes calles del sector La Esmeralda, en los Alcarrizos.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO

Atentamente,

Luisana Guzmán

Lcda. Luisana Guzmán
Administrativa

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Santo Domingo R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS

Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Públicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
24 de agosto del 2022

Oficio No. 020-2022
Contrato No: 020-2022

Al	:	**Sr. Cristian Encamación** Alcalde del AMA
Vía	:	**Lic. Luisanna Guzmán** Directora de Administrativo
Del	:	**Ing. Freddy M. Dini Lebrón** Director de Obras Publicas Municipal
Anexo	:	Cubicación Autorizada. Fotos.

Asunto : Solicitud Pago de Cub.3

Muy cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el pago de la cub. 2 Correspondiente a Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, C/ Larimar, C/ Ónice, C/ 1ra y C/ Los Pedros en el **Sector La Esmeralda**. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. Por un monto de **RD$ 538,786.69 (Quinientos Treinta y ocho Mil, Setecientos Ochenta y Seis pesos con 69/100).** Con Fondos de la Liga.

El mismo a nombre de **Ing. Ruddy Mateo Jiménez** Portador de la cedula de identidad **No- 001-1082606-2**.

Sin otro particular se despide:

Atentamente.

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS

Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Públicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
24 de agosto del 2022

Al	:	**Sr. Cristian Encarnación** Alcalde del AMA
Vía	:	**Lic. Luisana Guzmán** Directora del Departamento Administrativo
Del	:	**Ing. Freddy M. Dini Lebrón** Director de Obras Publicas Municipal
Asunto	:	Informe de inspección a nombre **Ing. Ruddy Mateo Jimenez portador** de la cedula de identidad y electoral **No.001-1082606-2**.
Anexo	:	Presupuesto Autorizado, Fotos y Soporte T.

Muy cortésmente, me dirijo a usted para remitirle el informe de la Inspección de la cubicación No.3 perteneciente al contrato (020-2022) correspondiente a la correspondiente Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, C/ Larimar, C/ Ónice, C/ 1ra y C/ Los Pedros en el **Sector La Esmeralda**. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. El Proyecto se encuentra en ejecución de 67.55%, del valor contratado.

Este informe fue suministrado, evaluado y autorizado por la parte interesadas:

Jose Modesto Navarro

Ing. José Modesto Navarro
Supervisor de Obras

Ing. Ruddy Mateo Jiménez
Contrastista

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipal

"AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS"
(AMA)
Dirección de Obras Públicas Municipales

Contratista:	ING. RUDDY MATEO JIMENEZ
Obra:	Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, C/ Larimar, C/ Ónice, C/ 1ra y C/ Los Pedros en el Sector La Esmeralda. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.
Código:	AMA07-OP00721-P000-M
Sector:	Sector La Esmeralda
No. Contrato	020-2022
Cub. No.	3
Fecha:	15 de Agosto 2022

Periodo: Iulio- Agosto 202

Monto Contratado:	5,521,669.30
Monto a Ejecutar:	4,371,509.10
Monto a ejecutar mas Impuestos:	5,521,669.30
Avance Inicial:	1,104,333.86
Avance de Obra:	67.55%

		PRESUPUESTADO				CUBICACION No.1 (Anterior)			CUBICACION No.2 (Anterior)			CUBICACION No.3 (Actual)			CUBICACION ACUMULADA		
No.	PARTIDAS	Cantidad	Unidad	Costo Uni.	Valor	Cantidad	Valor	%	Cantidad	Valor	%	Cantidad	Valor	%	Cantidad	Valor	%
												0.00	0.00	0.00%	1.00	15000.00	100.00%
1.01	Vallas informativa de la obra.	1.00	Ud.	15,000.00	15,000.00	1.00	15000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%		0.00			15,000.00	
					15,000.00		15,000.00			0.00							
II	MOVIMIENTO DE TIERRA																
2.01	Demolición de aceras en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10*1.00)*2	434.20	m^2	100.00	43,420.00	0.00	0.00	0.00%	204.80	20,480.00	47.17%	0.00	-	0.00%	204.80	20,480.00	47.17%
2.02	Demolición de contenes en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10)*2	434.20	Ml	100.00	43,420.00	0.00	0.00	0.00%	336.80	33,680.00	77.57%	0.00	-	0.00%	336.80	33,680.00	77.57%
2.03	Demolición de aceras en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (84,70,10*1,00)*2	169.40	m^2	100.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00%	35.70	3,570.00	21.07%	105.01	10,501.11	61.99%	140.71	14,071.11	83.06%
2.04	Demolición de contenes en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (80,70)*2	169.40	Ml	100.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00%	150.00	15,000.00	88.55%	0.00	-	0.00%	150.00	15,000.00	88.55%
	Demolición de aceras en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56,90*1.00)*2	113.80	m^2	100.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00%	86.70	8,670.00	76.19%	27.10	2,709.58	23.81%	113.80	11,379.58	100.00%
2.06	Demolición de contenes en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56,90)*2	113.80	Ml	100.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00%	100.00	10,000.00	87.87%	0.00	-	0.00%	100.00	10,000.00	87.87%
2.07	Demolición de aceras en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56,90*1.00)*2	113.80	m^2	100.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00%	64.10	6,410.00	56.33%	0.00	-	0.00%	64.10	6,410.00	56.33%
2.08	Demolición de contenes en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56,90)*2	113.80	Ml	100.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00%	91.50	9,150.00	80.40%	0.00	-	0.00%	91.50	9,150.00	80.40%
2.09	Demolición de aceras en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (182,70*1.00)*2	365.40	m^2	100.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00%	193.90	19,390.00	53.07%	74.40	7,439.54	20.36%	268.30	26,829.54	73.43%
2.1	Demolición de contenes en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (217,10)*2	365.40	Ml	100.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00%	210.40	21,040.00	57.58%	0.00	-	0.00%	210.40	21,040.00	57.58%
2.11	Demolición de aceras en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80*1.00)*2	451.60	m^2	100.00	45,160.00	0.00	0.00	0.00%	217.54	21,754.00	48.17%	42.99	4,299.23	9.52%	260.53	26,053.23	57.69%
2.12	Demolición de contenes en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80)*2	451.60	Ml	100.00	45,160.00	0.00	0.00	0.00%	247.90	24,790.00	54.89%	40.28	4,028.27	8.92%	288.18	28,818.27	63.81%
2.13	Demolición de aceras en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (71,40*1.00)*2	142.80	m^2	100.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00%	38.18	3,818.00	26.74%	21.28	2,127.72	14.90%	59.46	5,945.72	41.64%
2.14	Demolición de contenes en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (69,80)*2	142.80	Ml	100.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00%	137.09	13,709.00	96.00%	5.71	571.20	4.00%	142.80	14,280.20	100.00%

2.15	Demolición de Baden en la C/ Jade esquina C/ cristal (7*2)	5.60	m^3	1,250.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	5.31	6,633.00	94.76%	5.31	6,633.00	94.76%
2.16	Demolición de Baden en la C/ Gema (4,2*2)	3.36	m^3	1,250.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	3.36	4,200.00	100.00%	3.36	4,200.00	100.00%
2.16	Demolición de Baden en la C/ Respaldo Jade esquina C/ Rubí (7,40*2)	5.92	m^3	1,250.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%	-	-	0.00%
2.17	Demolición de Baden C/ cristal hasta esquina C/ Rubí (6,10*2)	4.88	m^3	1,250.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%	-	-	0.00%
2.18	Demolición de Baden en la C/ Cardalina (5,80*2)	4.64	m^3	1,250.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	4.64	5,800.00	100.00%	4.64	5,800.00	100.00%
2.19	Demolición de Baden en la C/ Larimar (4,50*2)	3.60	m^3	1,250.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	3.60	4,500.00	100.00%	3.60	4,500.00	100.00%
2.2	Demolición de Baden en la C/ 1ra (4,60*2)	3.68	m^3	1,250.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%	-	-	0.00%
	Demolición de Baden en la C/ Estancia próximo C/ San Marcos (7,5*2)	6.00	m^3	1,250.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00%		-	0.00%	0.00	-	0.00%	-	-	0.00%
					405,300.00	**0.00**	**0.00**			**211,461.00**			**52,809.65**			**264,270.65**	
III	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION**																
3.01	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10*1.00*0.10)*2	43.42	m^3	550.00	23,881.00	7.69	4228.85	17.71%		-	0.00%		-	0.00%	7.69	4,228.85	17.71%
3.02	Telford para contenes en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10*0.45*0.10)*2	19.54	m^3	2,155.83	42,122.76	10.54	22720.18	53.94%		-	0.00%		-	0.00%	10.54	22,720.18	53.94%
3.03	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (84,70,10*1.00*0.10)*2	16.94	m^3	550.00	9,317.00	2.21	1215.50	13.05%		-	0.00%	10.50	5,775.61	61.99%	12.71	6,991.10	75.04%
3.04	Telford para contenesen la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (80,70*0.45*0.10)*2	7.62	m^3	2,155.83	16,433.89	2.56	5510.28	33.53%		-	0.00%	0.00	-	0.00%	2.56	5,510.28	33.53%
3.05	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56,90*1.00*0.10)*2	11.38	m^3	550.00	6,259.00	6.11	3360.46	53.69%		-	0.00%	3.31	1,818.87	29.06%	9.42	5,179.32	82.75%
3.06	Telford para contenes en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56,90*0.45*0.10)*2	5.12	m^3	2,155.83	11,040.01	3.30	7120.69	64.50%		-	0.00%		-	0.00%	3.30	7,120.69	64.50%
3.07	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56,90*1.00*0.10)*2	11.38	m^3	550.00	6,259.00	3.78	2078.99	33.22%		-	0.00%		-	0.00%	3.78	2,078.99	33.22%
	Telford para contenes en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56,90*0.45*0.10)*2	5.12	m^3	2,155.83	11,040.01	2.40	5180.41	46.92%		-	0.00%		-	0.00%	2.40	5,180.41	46.92%
3.09	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (182,70*1.00*0.10)*2	36.54	m^3	550.00	20,097.00	19.39	10664.47	53.07%		-	0.00%	7.44	4,091.75	20.36%	26.83	14,756.22	73.43%
3.1	Telford para contenes en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (217,10*0.45*0.10)*2	16.44	m^3	2,155.83	35,448.31	9.47	20411.14	57.58%		-	0.00%	0.00	-	0.00%	9.47	20,411.14	57.58%
3.11	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80*1.00*0.10)*2	45.16	m^3	550.00	24,838.00	21.75	11964.46	48.17%		-	0.00%	4.30	2,364.58	9.52%	26.05	14,329.04	57.69%
3.12	Telford para contenes en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80*0.45*0.10)*2	20.32	m^3	2,155.83	43,810.78	11.16	24049.05	54.89%		-	0.00%	1.81	3,907.92	8.92%	12.97	27,956.97	63.81%
3.13	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (71,40*1.00*0.10)*2	14.28	m^3	550.00	7,854.00	3.82	2099.85	26.74%		-	0.00%	2.13	1,170.25	14.90%	5.95	3,270.09	41.64%
3.14	Telford para contenesen la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (69,80*0.45*0.10)*2	6.43	m^3	2,155.83	13,853.36	6.17	13299.23	96.00%		-	0.00%	0.26	554.13	4.00%	6.43	13,853.36	100.00%
					272,254.12		**133,903.56**			**0.00**			**19,683.10**			**153,586.66**	

HORMIGON SIMPLE																
Construcción de aceras en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10*1.00*0.10)*2	434.20	m^2	1,098.25	476,860.15	76.89	84442.40	17.71%	54.11	59426.31	12.46%		0.00	0.00%	131.00	143,868.70	30.17%
Construcción dea contenes en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10*0.45*0.10)*2	434.20	Ml	911.18	395,634.36	234.20	213397.26	53.94%	102.60	93487.07	23.63%		0.00	0.00%	336.80	306,884.33	77.57%
Construcción de aceras en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (84,70,10*1.00*0.10)*2	169.40	m^2	1,098.25	186,043.55	22.10	24271.24	13.05%		0.00	0.00%	105.01	115327.23	61.99%	127.11	139,598.47	75.04%
Construcción de la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (80,70*0.45*0.10)*2	169.40	Ml	911.18	154,353.89	56.80	51754.86	33.53%	112.60	102598.87	66.47%		0.00	0.00%	169.40	154,353.73	100.00%
Construcción de aceras en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubi (56,90*1.00*0.10)*2	113.80	m^2	1,098.25	124,980.85	61.10	67102.22	53.69%	0.00	0.00	0.00%	33.07	36319.13	29.06%	94.17	103,421.35	82.75%
Construcción dela C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubi (56,90*0.45*0.10)*2	113.80	Ml	911.18	103,692.28	73.40	66880.49	64.50%	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	73.40	66,880.49	64.50%
Construcción de para aceras en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubi (56,90*1.00*0.10)*2	113.80	m^2	1,098.25	124,980.85	37.80	41513.64	33.22%	26.30	28883.98	23.11%		0.00	0.00%	64.10	70,397.61	56.33%
Construcción de en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubi (56,90*0.45*0.10)*2	113.80	Ml	911.18	103,692.28	53.40	48656.57	46.92%	38.10	34715.96	33.48%		0.00	0.00%	91.50	83,372.53	80.40%
Construcción de aceras en la C/ Cristal, desde la C/ Rubi hasta esquina Estancia (182,70*1.00*0.10)*2	365.40	m^2	1,098.25	401,300.55	193.90	212950.14	53.07%	30.40	33386.80	8.32%	74.40	81709.80	20.36%	298.70	328,046.74	81.75%
Construcción de contenes en la C/ Cristal, desde la C/ Rubi hasta esquina Estancia (217,10*0.45*0.10)*2	365.40	Ml	911.18	332,945.17	210.40	191709.83	57.58%	40.40	36811.67	11.06%		0.00	0.00%	250.80	228,521.50	68.64%
Construcción de aceras en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80*1.00*0.10)*2	451.60	m^2	1,098.25	495,969.70	217.54	238908.60	48.17%	0.00	0.00	0.00%	43.00	47224.75	9.52%	260.54	286,133.35	57.69%
Construcción de contenes en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80*0.45*0.10)*2	451.60	Ml	911.18	411,488.89	247.90	225878.60	54.89%	0.00	0.00	0.00%	40.30	36720.55	8.92%	288.20	262,599.15	63.82%
Construcción de aceras en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (71,40*1.00*0.10)*2	142.80	m^2	1,098.25	156,830.10	38.18	41930.10	26.74%	0.00	0.00	0.00%	21.28	23370.78	14.90%	59.46	65,300.86	41.64%
Construcción de contenes en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (69,80*0.45*0.10)*2	142.80	Ml	911.18	130,116.50	137.09	124911.84	96.00%	0.00	0.00	0.00%	5.71	5202.84	4.00%	142.80	130,114.68	100.00%
				3,598,889.13		**1,634,307.77**			**389,310.65**			**345,875.06**			**2,369,493.48**	
HORMIGON ARMADO																
Construcción de Baden en la C/ Jade esquina C/ cristal (7*2)	14.00	m^2	3,559.66	49,835.24	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	13.27	47222.45	94.76%	13.27	47,222.45	94.76%
Construcción de Baden en la C/ Gema (4,2*2)	8.40	m^2	3,559.66	29,901.14	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.40	29901.14	100.00%	8.40	29,901.14	100.00%
Construcciónde Baden en la C/ Respaldo Jade esquina C/ Rubi (7,40*2)	14.80	m^2	3,559.66	52,682.97	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
Construcción de Baden C/ cristal hasta esquina C/ Rubi (6,10*2)	12.20	m^2	3,559.66	43,427.85	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
Construcción de Baden en la C/ Cardalina (5.80*2.0)	11.60	m^2	3,559.66	41,292.06	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11.60	41292.06	100.00%	11.60	41,292.06	100.00%
Construcción de Baden en la C/ Larimar (4,50*2)	9.00	m^2	3,559.66	32,036.94	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.00	32036.94	100.00%	9.00	32,036.94	100.00%
Construcción de Baden en la C/ 1ra (4,60*2)	9.20	m^2	3,559.66	32,748.87	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	-	0.00%

5.08	Construcción de Baden en la C/ Estancia próximo C/ San Marcos (7,5*2)	15.00	m^2	3,559.66	53,394.90	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
					335,319.97		0.00			0.00			150,452.59			150,452.59	
VII	LIMPIEZA FINAL																
7.01	Limpieza general y final.	1.00	P.A.	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	-	0.00%
					17,000.00		0.00			0.00			0.00			0.00	
	Sub-Total General				4,371,509.10		1,783,211.328			600,771.649			568,820.406			2,952,803.382	
B	*GASTOS INDIRECTOS:*																
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. CIVIL.			*10.000%*	437,150.910		178,321.133			60,077.165			56,882.041			295,280.34	
1.	*GASTOS ADMINISTRATIVOS.*			*3.000%*	131,145.273		53,496.340			18,023.149			17,064.612			88,584.10	
	SEGUROS Y FIANZAS.			*2.500%*	109,287.728		44,580.283			15,019.291			14,220.510			73,820.08	
1.003	*LIQUIDACIÓN Y PRESTS . LABORALES. Ley 686*			*1.000%*	43,715.091		17,832.113			6,007.716			5,688.204			29,528.03	
1.004	*CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus dependencias*			*0.100%*	4,371.509		1,783.211			600.772			568.820			2,952.80	
1.005	*ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Artículo 4- Parrafo I)*			*18.000%*	78,687.164		32,097.804			10,813.890			10,238.767			53,150.46	
	Total Gastos Indirectos				804,357.67		328,110.88			110,541.98			104,662.95			543,315.82	
	Total Cubicado hasta la Fecha				5,175,866.78		2,111,322.21			711,313.63			673,483.36			3,496,119.20	
	TOTAL PAGADA CUB. 1						1,689,057.77									2,111,322.21	
	TOTAL PAGADA CUB. 2									569,050.91						711,313.63	
	TOTAL CUBICADO CUB. 3												538,786.69			673,483.36	
	Amortizacion 20% valor cub.3				1,035,173.355		-422,264.44			-142,262.73			-134,696.67			134,696.67	
	TOTAL A PAGAR DE CUB. 3															538,786.69	

Nota: **Los datos procesados en esta cubicacion fueron suministrado por el supervisor de dicha obra.** La presente Cubicacion se expide a total responsabilidad del Depto de Supervicion, mediante los supervisores actuantes en la misma.-

Preparado Por:

Ing. Deicania Hernandez
Enc. de Ubicación de OP

Datos susminitrados por:

Ing. Jose Modesto Navarro
Supervisor del AMA

Revisador por:

Sr. Cesar Puala Frias
Enc. de Supervicion

Aprobado Por:

ING. RUDDY MATEO JIMENEZ
Contratista

Aprobado Por:

Ing. Freddy M. Dini Lebron
Director de la Dirección de Obras Publicas Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario.
Dirección de Obras Públicas Municipal

DATOS PARA CUBICACION

Nombre del Proyecto: Construcción de aceras y contenes en las Diferentes calles

Sector: La Esmeralda

Ubicación: Diferentes calles

Nombre de Contratista: Ing. Buddy Mateo Jimenez

Contrato No. 020-2022

Cubicación No. 3 **Fecha:** 10/8/2022

Supervisor: Ing. Modesto

OBSERVACIONES:

Pagar mismo % de Excavación y Relleno de aceras y contenes

Recibido 10 de agosto 2022

- C/Topacio desde c/Jade hasta c/Piedra
  aceras: 105.01 m²

- c/ Cristal desde c/Rubí hasta Estancia
  aceras: 74.40 m²

- c/Gema desde c/Jade hasta c/Rubí
  aceras = 33.07 m²

- c/coraline desde c/ambar hasta el Final
  contenes: 7mL aceras: 21.28 m²
- c/ambar desde c/San Marcos hasta c/Piedra: contenes: 40.30 m aceras 43.0 m²
  - Baclenes

- c/Zarimar con c/ambar = 7.7x1.98 = 15.21m²
- c/Eunice con c/ambar = 7.8x2 = 15.70 m² (adicional 10/8/20
- Trasnversal ~~con~~ en c/coraline = 6.x2.08 = 12.48m²
- c/ambar con c/cristal = 8.5x2=16.30m² (adicional 10/8/2022)

- Transversal en c/ cristal con c/ambar = 4.20x 2.10= 8.8 m²
  (adicional 10/8/2
- c/Cristal con c/Jade = 6.7x 1.98 = 13.23 m²

- Transversal en c/Gema = 4.20x 2.07=8.69m²

K&J
IND.

Fecha	Concepto	Valor
31/08/2022	P/R PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE CUBICACION #3, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA, EN LOS	528,010.96

7261

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
PROGRAMA DE INVERSION

No. 018674

DIA	MES	AÑO
31	08	2022

RNC: 430-04253-6
DO28BRRD00000000002440009274

0016937

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RUDDY MATEO JIMENEZ

RD$ *528,010.96

*** QUINIENTOS VEINTE Y OCHO MIL DIEZ CON 96/100 ***

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

IRodriguez

FIRMA(S)

"018674" 211127271300244000927 4" 28

Cap. No. _____ *Sub-Objeto* _____ *Fondo* _____ *Comprobante No.* _____ *Fecha* _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
No. Comprobante .. 2203680 P/R PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE CUBICACION #3, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA, EN LOS ALCARRIZOS. SEG+N C		Estructura Clasific. 0011010094 272401	528,010.96

STRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

TOTAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2203680
FECHA 31/08/2022
SECUENCIAL: 3744

TIPO COMPROBANTE: 2203679 **Etapa:** Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 18120 **RNC/CED/PAS:** 00110826062
BENEFICIARIO: RUDDY MATEO JIMENEZ
DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE CUBICACION #3, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA, EN LOS ALCARRIZOS. SEGÚN COMUNICACIÓN D/F29/08/2022. ANEXO*** QUINIENTOS VEINTE Y OCHO MIL DIEZ PESOS CON 96/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0094	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	538,786.69
					Menos las siguientes Retenciones	
00 11 01 0094	272401	40	9992	103	MENOS 2% De: 538,786.69	(10,775.73)
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 528,010.96

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIP. DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2203679
FECHA 31/08/2022
SECUENCIAL: 3743

TIPO COMPROBANTE: 2203680 **Etapa:** Devengado
CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 18120 **RNC/CED/PAS:** 00110826062
BENEFICIARIO: RUDDY MATEO JIMENEZ
DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE CUBICACION #3, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA, EN LOS ALCARRIZOS. SEGÚN COMUNICACIÓN D/F29/08/2022. ANEXO*** QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 69/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0094	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	538,786.69
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 538,786.69

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE LOS ALCARRIZOS
GESTIÓN 2020-2024

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

DIRECCION ADMINISTRATIVA

29 de agosto de 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde Municipal

Vía : Dirección Financiera

De la : Dirección Administrativa

Asunto : Pago cubicación **#3**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO
Prov. Sto. Dgo. R.D.

Distinguidos Señores:

Cortésmente le estamos solicitando el pago a favor de**: Ruddy Mateo Jimenez.**

Codia: 20925 Contrato No. **020/2022.** RNC: **001-1082606-2**

Monto a pagar**: RD$538,786.69 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 69/100).**

Por concepto de Pago de: Cubicación **#3**, para la construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes calles del sector La Esmeralda, en los Alcarrizos.

Atentamente,

Luisana Guzmán

Lcda. Luisana Guzmán
Administrativa

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCIÓN FINANCIERA
AUTORIZADO
Firma
Fecha 30/8/2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario
Dirección de Obras Públicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
4 de Julio del 2022

Oficio No. 006-2022
Contrato No: 020-2022

Al : **Sr. Cristian Encamación**
Alcalde del AMA

Vía : **Lic. Luisanna Guzmán**
Directora de Administrativo

Del : **Ing. Freddy M. Dini Lebrón**
Director de Obras Publicas Municipal

Anexo : Cubicación Autorizada. Fotos.

Asunto	: Solicitud Pago de Cub.2

Muy cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el pago de la cub. 2 Correspondiente a Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, C/ Larimar, C/ Ónice, C/ 1ra y C/ Los Pedros en el **Sector La Esmeralda**. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. Por un monto de **RD$ 569,050.91 (Quinientos Sesenta y Nuene Mil, Cincuenta pesos con 91/100).** Con Fondos de la Liga.

El mismo a nombre de **Ing. Ruddy Mateo Jiménez** Portador de la cedula de identidad **No- 001-1082606-2**.

Sin otro particular se despide:

Atentamente:

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario.

Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
4 de Julio del 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde del AMA

Via : **Lic. Luisana Guzmán**
Directora del Departamento Administrativo

Del : **Ing. Freddy M. Dini Lebrón**
Director de Obras Publicas Municipal

Asunto : Informe de inspección a nombre **Ing. Ruddy Mateo Jimenez portador** de la cedula de identidad y electoral **No.001-1082606-2.**

Anexo : Presupuesto Autorizado, Fotos y Soporte T.

Muy cortésmente, me dirijo a usted para remitirle el informe de la Inspección de la cub.2 perteneciente al contrato (020-2022) correspondiente a la correspondiente Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, C/ Larimar, C/ Ónice, C/ 1ra y C/ Los Pedros en el **Sector La Esmeralda**. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. Se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance 54.53%.

Este informe fue suministrado, evaluado y autorizado por la parte interesadas:

Jose Modesto Navarro
Ing. José Modesto Navarro
Supervisor de Obras

Ing. Ruddy Mateo Jimenez
Contrastista

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Publica Municipal

Calle [illegible] #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

4 de Julio del 2022

"DESPACHO DEL ALCALDE"

A : **Ing. Freddy Dini Lebrón.**
Director de Obras Públicas.

Asunto : **Autorización.**

Luego de extenderle un cordial saludo, por este medio me permito remitirle la autorización a realizar el pago de las partidas correspondientes a (Demoliciones & Badenes) en las cubicaciones, cumpliendo con el pliego de condiciones, correspondientes a las licitaciones realizadas por esta institución con el presupuesto de la Liga Municipal Dominicana.

NO. DE REFERENCIA	SECTOR
AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2022-0003	Sector La Esmeralda.
AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2022-0004	Sector Villa Progreso.
AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2022-0005	Residencial Las Mercedes, Bloque C.
AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2022-0007	Sector Juana Saltitopa.

Sin otro particular y espera de sus buenos oficios le saluda.

Cordialmente:

CRISTIAN ENCARNACIÓN
Alcalde Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS"
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNCIPALES

Al construir las calles de nuestro municipio Los Alcarrizos las pendientes transversales y longitudinales son de vital importancia para la conducción de las aguas pluviales a través de contenes, aceras, badenes e imbornales, además de garantizar la capacidad de conducción y escorrentía de las aguas que se acumulan en la calzada durante los tiempos de lluvias.

Las aceras son las superficies que se construyen con el objetivo de facilitar la movilidad de los peatones en las zonas urbanas, estas además de las obras de arte (contenes, badenes e imbornales) que también son fundamentales para garantizar mayor durabilidad y facilidad de las mismas.

Es por esto que luego de una licitación en la que se ha incluido badenes, relleno, Telford y demoliciones el **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos** no se encuentra en capacidad econonomica de pagar fuera de la misma esos elementos mencionados anteriormente, sería contradictorio para la cámara de cuenta al momento de una auditoria encontrar un proceso licitado dos veces y del mismo sector.

NTO MUNICIPAL DE

A pesar de que la Liga Municipal nos había mandado una ficha técnica para este proceso, nosotros, es decir, El Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos tenemos programado el presupuesto del año entendemos que para mayor factibilidad es necesario que esos items fueran incluidos en el proyecto nosotros como institucion y para mayor transparenciaa en los fondos asignados a traves de la liga municipal dominicana debemos pagar las cubicaciones con los mismos, tal cual se haya hecho en el proceso de licitacion en el cual se encuentran incluidas estas partidas .

Sin otro particular se despide:

D/D Nikauris Rodriguez

Ing. Freddy Manuel Dini Lebrón

Dir. De Obras Públicas Municipales
Del Municipio de los Alcarrizos

"AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS"

(AMA)

Dirección de Obras Públicas Municipales

Contratista:	**ING. RUDDY MATEO JIMENEZ**
Obr	Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, C/ Larimar, C/ Ónice, C/ 1ra y C/ Los Pedros en el Sector La Esmeralda. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.
Cc	AMA07-OP00721-P000-M
Sector	Sector La Esmeralda
C	2
Fecha	4 de Julio 2022

No. Contrato 020-2022

Periodo Junio Julio 2022

Monto Contratado	5,521,669.30
Monto a Ejecutar:	4,371,509.10
Monto a ejecútar mas Impuestos:	5,521,669.30
Avance Inicial:	1,104,333.86
Avance de Obra:	54.53%

		PRESUPUESTADO				CUBICACION No.1 (Anterior)			CUBICACION No.2 (Actual)			CUBICACION ACUMULADA		
No.	**PARTIDAS**	**Cantidad**	**Unidad**	**Costo Uni.**	**Valor**	**Cantidad (1)**	**Valor**	**%**	**Cantidad (2)**	**Valor**	**%**	**Cantidad**	**Valor**	**%**
1.01	Vallas informativa de la obra	1.00	Ud	15,000.00	15,000.00	1.00	15000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	15000.00	100.00%
					15,000.00		**15,000.00**			**0.00**			**15,000.00**	
II	**MOVIMIENTO DE TIERRA**													
2.01	Demolición de aceras en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10*1.00)*2	434.20	m^2	100.00	43,420.00	0.00	0.00	0.00%	204.80	20,480.00	47.17%	204.80	20,480.00	47.17%
2.02	Demolición de contenes en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10)*2	434.20	Ml	100.00	43,420.00	0.00	0.00	0.00%	336.80	33,680.00	77.57%	336.80	33,680.00	77.57%
2.03	Demolición de aceras en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (84.70,10*1.00)*2	169.40	m^2	100.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00%	35.70	3,570.00	21.07%	35.70	3,570.00	21.07%
2.04	Demolición de contenes en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (80,70)*2	169.40	Ml	100.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00%	150.00	15,000.00	88.55%	150.00	15,000.00	88.55%
2.05	Demolición de aceras en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56,90*1.00)*2	113.80	m^2	100.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00%	86.70	8,670.00	76.19%	86.70	8,670.00	76.19%
2.06	Demolición de contenes en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56,90)*2	113.80	Ml	100.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00%	100.00	10,000.00	87.87%	100.00	10,000.00	87.87%
2.07	Demolición de aceras en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56,90*1.00)*2	113.80	m^2	100.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00%	64.10	6,410.00	56.33%	64.10	6,410.00	56.33%
2.08	Demolición de contenes en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56,90)*2	113.80	Ml	100.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00%	91.50	9,150.00	80.40%	91.50	9,150.00	80.40%
2.09	Demolición de aceras en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (182,70*1.00)*2	365.40	m^2	100.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00%	193.90	19,390.00	53.07%	193.90	19,390.00	53.07%
2.1	Demolición de contenes en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (217,10)*2	365.40	Ml	100.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00%	210.40	21,040.00	57.58%	210.40	21,040.00	57.58%
2.11	Demolición de aceras en la C/ Ambar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80*1.00)*2	451.60	m^2	100.00	45,160.00	0.00	0.00	0.00%	217.54	21,754.00	48.17%	217.54	21,754.00	48.17%
2.12	Demolición de contenes en la C/ Ambar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80)*2	451.60	Ml	100.00	45,160.00	0.00	0.00	0.00%	247.90	24,790.00	54.89%	247.90	24,790.00	54.89%
2.13	Demolición de aceras en la C/ Cordalina, desde la C/ Ambar hasta el Final (71,40*1.00)*2	142.80	m^2	100.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00%	38.18	3,818.00	26.74%	38.18	3,818.00	26.74%
2.14	Demolición de contenes en la C/ Cordalina, desde la C/ Ambar hasta el Final (69,80)*2	142.80	Ml	100.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00%	137.09	13,709.00	96.00%	137.09	13,709.00	96.00%
2.15	Demolición de Baden en la C/ Jade esquina C/ cristal (7*2)	5.60	m	1,250.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%

2.16	Demolición de Baden en la C/ Gema (4.2*2)	3.36	m	1,250.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%
2.18	Demolición de Baden en la C/ Respaldo Jade esquina C/ Rubí (7,40*2)	5.92	m	1,250.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%
2.17	Demolición de Baden C/ cristal hasta esquina C/ Rubí (6,10*2)	4.88	m	1,250.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%
2.18	Demolición de Baden en la C/ Cardalina (5,80*2)	4.64	m	1,250.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%
2.19	Demolición de Baden en la C/ Larimar (4,50*2)	3.60	m	1,250.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%
2.2	Demolición de Baden en la C/ 1ra. (4,60*2)	3.68	m	1,250.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%
2.21	Demolición de Baden en la C/ Estancia próximo C/ San Marcos (7,5*2)	6.00	m	1,250.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%			0.00%
					405,300.00	**0.00**	**0.00**			**211,461.00**			**211,461.00**	
III	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION**													
1	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10*1.00*0.10)*2	43.42	m	550.00	23,881.00	7.69	4228.85	17.71%			0.00%	7.69	4,228.85	17.71%
3.02	Telford para contenes en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10*0.45*0.10)*2	19.54	m	2,155.83	42,122.76	10.54	22720.18	53.94%			0.00%	10.54	22,720.18	53.94%
J3	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (84,70,10*1.00*0.10)*2	16.94	m	550.00	9,317.00	2.21	1215.50	13.05%			0.00%	2.21	1,215.50	13.05%
3.04	Telford para contenesen la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (80,70*0.45*0.10)*2	7.62	m	2,155.83	16,433.89	2.56	5510.28	33.53%			0.00%	2.56	5,510.28	33.53%
3.05	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56,90*1.00*0.10)*2	11.38	m	550.00	6,259.00	6.11	3360.46	53.69%			0.00%	6.11	3,360.46	53.69%
3.06	Telford para contenes en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56,90*0.45*0.10)*2	5.12	m	2,155.83	11,040.01	3.30	7120.69	64.50%			0.00%	3.30	7,120.69	64.50%
3.07	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56,90*1.00*0.10)*2	11.38	m	550.00	6,259.00	3.78	2078.99	33.22%			0.00%	3.78	2,078.99	33.22%
3.08	Telford para contenes en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56,90*0.45*0.10)*2	5.12	m	2,155.83	11,040.01	2.40	5180.41	46.92%			0.00%	2.40	5,180.41	46.92%
3.09	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (182,70*1.00*0.10)*2	36.54	m	550.00	20,097.00	19.39	10664.47	53.07%			0.00%	19.39	10,664.47	53.07%
3.1	Telford para contenes en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (217,10*0.45*0.10)*2	16.44	m	2,155.83	35,448.31	9.47	20411.14	57.58%			0.00%	9.47	20,411.14	57.58%
1	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80*1.00*0.10)*2	45.16	m	550.00	24,838.00	21.75	11964.46	48.17%			0.00%	21.75	11,964.46	48.17%
2	Telford para contenes en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80*0.45*0.10)*2	20.32	m	2,155.83	43,810.78	11.16	24049.05	54.89%			0.00%	11.16	24,049.05	54.89%
3.13	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (71,40*1.00*0.10)*2	14.28	m	550.00	7,854.00	3.82	2099.85	26.74%			0.00%	3.82	2,099.85	26.74%
3.14	Telford para contenesen la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (69,80*0.45*0.10)*2	6.43	m	2,155.83	13,853.36	6.17	13299.23	96.00%			0.00%	6.17	13,299.23	96.00%
					272,254.12		**133,903.56**			**0.00**			**133,903.56**	
IV	**HORMIGON SIMPLE**													
4.01	Construcción dea ceras en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10*1.00*0.10)*2	434.20	m^2	1,098.25	476,860.15	76.89	84442.40	17.71%	54.11	59426.31	12.46%	131.00	143868.70	30.17%
4.02	Construcción dea contenes en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217,10*0.45*0.10)*2	434.20	Ml	911.18	395,634.36	234.20	213397.26	53.94%	102.60	93487.07	23.63%	336.80	306884.33	77.57%

4.03	Construcción de aceras en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (84,70.10*1.00*0.10)*2	169.40	m^2	1,098.25	186,043.55	22.10	24271.24	13.05%		0.00	0.00%	22.10	24271.24	13.05%
4.04	Construcción de la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (80,70*0.45*0.10)*2	169.40	Ml	911.18	154,353.89	56.80	51754.86	33.53%	112.60	102598.87	66.47%	169.40	154353.73	100.00%
4.05	Construcción de aceras en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56,90*1.00*0.10)*2	113.80	m^2	1,098.25	124,980.85	61.10	67102.22	53.69%	0.00	0.00	0.00%	61.10	67102.22	53.69%
4.06	Construcción dela C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56,90*0.45*0.10)*2	113.80	Ml	911.18	103,692.28	73.40	66880.49	64.50%	0.00	0.00	0.00%	73.40	66880.49	64.50%
4.07	Construcción de para aceras en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56,90*1.00*0.10)*2	113.80	m^2	1,098.25	124,980.85	37.80	41513.64	33.22%	26.30	28883.98	23.11%	64.10	70397.61	56.33%
4.08	Construcción de en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56,90*0.45*0.10)*2	113.80	Ml	911.18	103,692.28	53.40	48656.57	46.92%	38.10	34715.96	33.48%	91.50	83372.53	80.40%
4.09	Construcción de aceras en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (182,70*1.00*0.10)*2	365.40	m^2	1,098.25	401,300.55	193.90	212950.14	53.07%	30.40	33386.80	8.32%	224.30	246336.94	61.38%
4.10	Construcción de contenes en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (217,10*0.45*0.10)*2	365.40	Ml	911.18	332,945.17	210.40	191709.83	57.58%	40.40	36811.67	11.06%	250.80	228521.50	68.64%
4.11	Construcción de aceras en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80*1.00*0.10)*2	451.60	m^2	1,098.25	495,969.70	217.54	238908.60	48.17%	0.00	0.00	0.00%	217.54	238908.60	48.17%
4.12	Construcción de contenes en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80*0.45*0.10)*2	451.60	Ml	911.18	411,488.89	247.90	225878.60	54.89%	0.00	0.00	0.00%	247.90	225878.60	54.89%
4.13	Construcción de aceras en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (71,40*1.00*0.10)*2	142.80	m^2	1,098.25	156,830.10	38.18	41930.10	26.74%	0.00	0.00	0.00%	38.18	41930.10	26.74%
4.14	Construcción de contenes en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (69,80*0.45*0.10)*2	142.80	Ml	911.18	130,116.50	137.09	124911.84	96.00%	0.00	0.00	0.00%	137.09	124911.84	96.00%
					3,598,889.13		**1,634,307.77**			**389,310.65**			**2,023,618.42**	
V	**HORMIGON ARMADO**													
5.01	Construcción de Baden en la C/ Jade esquina C/ cristal (7*2)	14.00	m^2	3,559.66	49,835.24	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.02	Construcción de Baden en la C/ Gema (4,2*2)	8.40	m^2	3,559.66	29,901.14	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.03	Construcciónde Baden en la C/ Respaldo Jade esquina C/ Rubí (7,40*2)	14.80	m^2	3,559.66	52,682.97	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.04	Construcción de Baden C/ cristal hasta esquina C/ Rubí (6,10*2)	12.20	m^2	3,559.66	43,427.85	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.05	Construcción de Baden en la C/ Cardalina (5,80*2)	11.60	m^2	3,559.66	41,292.06	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.06	Construcción de Baden en la C/ Larimar (4,50*2)	9.00	m^2	3,559.66	32,036.94	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.07	Construcción de Baden en la C/ 1ra (4,60*2)	9.20	m^2	3,559.66	32,748.87	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.08	Construcción de Baden en la C/ Estancia próximo C/ San Marcos (7,5*2)	15.00	m^2	3,559.66	53,394.90	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
					335,319.97		**0.00**			**0.00**			**0.00**	
VII	**LIMPIEZA FINAL**													
7.01	Limpieza general y final	1.00	P.A	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
					17,000.00		**0.00**			**0.00**			**0.00**	

	Sub-Total General				**4,371,509.10**		**1,783,211.328**			**600,771.649**			**2,383,982.977**	
B	*GASTOS INDIRECTOS:*													
1.000	*DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. CIVIL.*			*10.000%*	437,150.910		178,321.133			60,077.165			238,398.30	
1.001	*GASTOS ADMINISTRATIVOS.*			*3.600%*	131,145.273		53.496.340			18,023.149			71,519.49	
1.002	*SEGUROS Y FIANZAS.*			*2.500%*	109,287.728		44.580.283			15,019.291			59,599.57	
1.003	*LIQUIDACION Y PRESTS . LABORALES. Ley 686*			*1.000%*	43,715.091		17.832.113			6,007.716			23,839.83	
1.004	*CODIA IX1000 Ley 6160 de 1965 para el estado y sus dependencias*			*0.100%*	4,371.509		1,783.211			600.772			2,383.98	
1.005	*ITBIS (Sobre el 10% Normas 07 2007, Articulo 4-Parrafo I)*			*18.000%*	78,687.164		32.097.804			10,813.890			42,911.69	
	Total Gastos Indirectos				**804,357.67**		**328,110.88**			**110,541.98**			**438,852.87**	
	Total Cubicado hasta la Fecha				**5,175,866.78**		**2,111,322.21**			**711,313.63**			**2,822,835.84**	
	Amortizacion 20% valor cubicado						422,264.443			142,262.726			**564,527.17**	
	TOTAL A PAGADA DE CUB. 1						**1,689,057.77**			**569,050.91**			**1,689,057.77**	
	TOTAL A PAGAR DE CUB. 2												**569,050.91**	

Nota: La presente Cubicacion se expide a total responsabilidad del Depto de Supervicion, mediante los supervisores actuantes en la misma -

Preparado Por:

Ing. Deldania Hernandez
Asistente de Presupuesto y Cubicación de OP

Revisador por:

Ing. Nikaudy Rodriguez
Enc. Del Depto. De Cubicación de OP

Aprobado Por:

ING. RUDDY MATEO JIMENEZ
Contratista

Datos susminitrados por:

Ing. Jose Modesto Navarro
Supervisor del AMA

Revisador por:

Sr. Cesar Puala Frias
Enc. de Supervicion

Aprobado Por:

Ing. Freddy M. Diñi Lebron
Director de la Dirección de Obras Publicas Municipal

La Esmeralda

Cot. Para cuficación #2

Procesada 4/7/2022 2PM

→ Demolición de Aceros en la c/Sode (Desde la c/San Marcos hasta entrega c/Piedra)
204.80 m²

→ Demolición de Gaviones en la c/Sode (Desde la c/San Marcos hasta entrega c/Piedra)
334.80 ml

→ Demolición de Aceros en la c/Topacio (Desde la c/Sode hasta entrega c/Piedra)
35.70 m²

→ Demolición de Gaviones en la c/Topacio (Desde la c/Sode hasta entrega c/Piedra)
175.00 ml

→ Demolición de Aceros en la c/Gema (Desde la c/Sode hasta la c/Rubi)
86.70 m²

→ Demolición de Gaviones en la c/Gema (Desde la c/Sode hasta la c/Rubi)
120.00 ml

Cont...

(2)

→ Demolición de aceras en la c/ Resp. Sodé (desde la c/ Sodé hasta la c/ Rubí)

64.10 m²

→ Demolición de bordillos en la c/ Resp. Sodé (desde la c/ Sodé hasta la c/ Rubí)

91.50 ml

→ Demolición de aceras en la c/ Cristal (desde la c/ Rubí hasta la Esquina de la Esponja)

193.90 m²

→ Demolición de bordillos en la c/ Cristal (desde la c/ Rubí hasta la Esquina de la Esponja)

210.40 ml

→ Demolición de aceras en la c/ Ámbar (desde la c/ San marcos hasta la c/ Piedra)

217.54 m²

→ Demolición de bordillos en la c/ Ámbar (desde la c/ San marcos hasta la c/ Piedra)

247.90 ml

Cont...

→ Demolición de Aceras en la c/ Cordalería (Desde la c/ Cantón hasta el final)

38.18 m²

→ Demolición de Cunetas en la c/ Cordalería (Desde la c/ Cantón hasta el final)

137.09 ml

→ Ejecut de Aceras en la c/ Sede (Desde la c/ San marcos hasta entrega c/ Piedra)

54.11 m²

→ Ejecut de Cunetas en la c/ Sede (Desde la c/ San marcos hasta entrega c/ Piedra)

102.40 ml

→ Ejecut de Cunetas en la c/ Norcia (Desde la c/ Sede hasta entrega c/ Piedra)

112.60 ml

→ Ejecut de Aceras en la c/ Resp. Sede (Desde la c/ Sede hasta la c/ Rubi)

26.30 m²

→ Ejecut de Cunetas en la c/ Resp. Sede (Desde la c/ Sede hasta la c/ Rubi)

38.10 ml

Cont...

→ Demolición de Aceras en la c/ Cordalería (Desde la c/ Ancha hasta el final)
38.18 m²

→ Demolición de Cunetas en la c/ Cordalería (Desde la c/ Ancha hasta el final)
137.09 ml

→ Ejecut de Aceras en la c/ Sede (Desde la c/ San Marcos hasta entrega c/ Piedra)
54.11 m²

→ Ejecut de Cunetas en la c/ Sede (Desde la c/ San Marcos hasta entrega c/ Piedra)
102.40 ml

→ Ejecut de Cunetas en la c/ Norcio (Desde la c/ Sede hasta entrega c/ Piedra)
112.60 ml

→ Ejecut de Aceras en la c/ Resp. Sede (Desde la c/ Sede hasta la c/ Ruti)
26.30 m²

→ Ejecut de Cunetas en la c/ Resp. Sede (Desde la c/ Sede hasta la c/ Ruti)
38.10 ml

Cont...

(4)

→ Ubont de Contenes en la c/Cristal (Desde la c/Rubi, hasta Esquina la Esmeralda)

30.40 mt

→ Ubont de Contenes en la c/Gema (Desde la c/Jade hasta la c/Rubi)


40.40 mt

1783211.33


1689,057.77

La Esmeralda. Para cub. #2



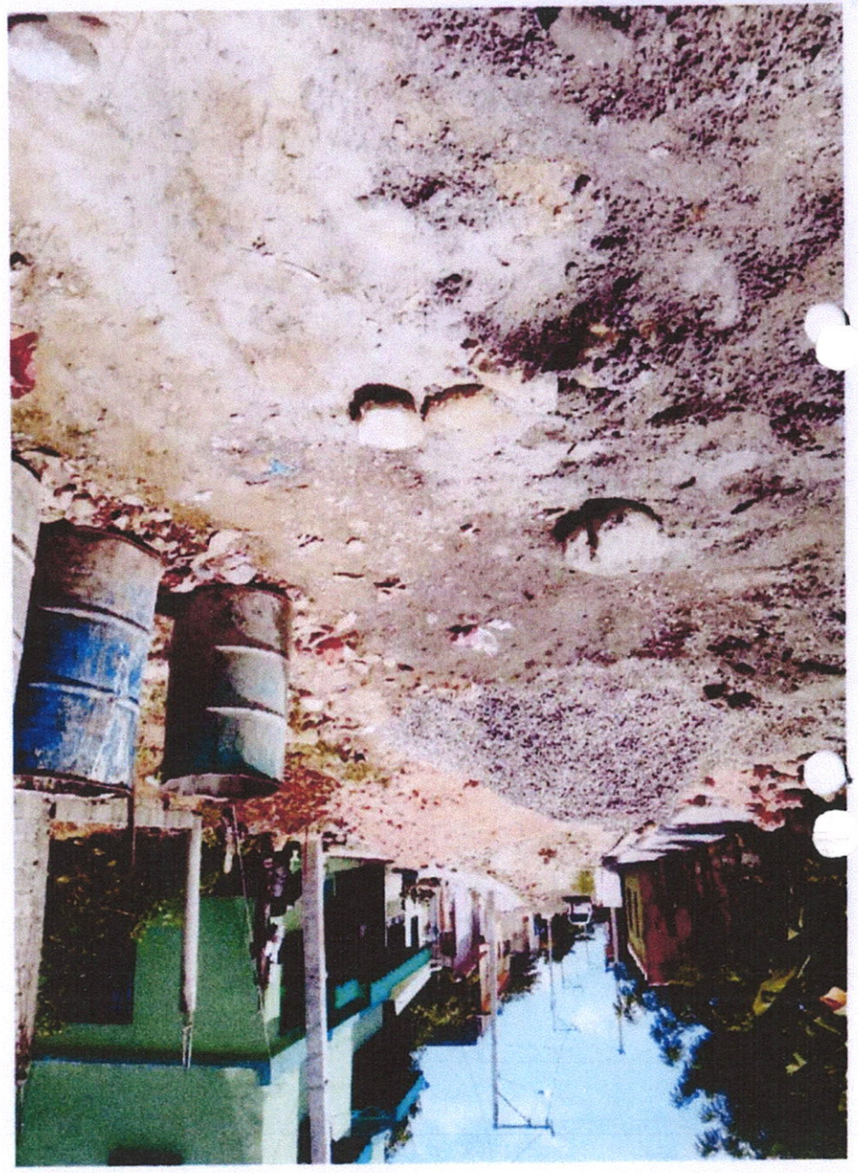




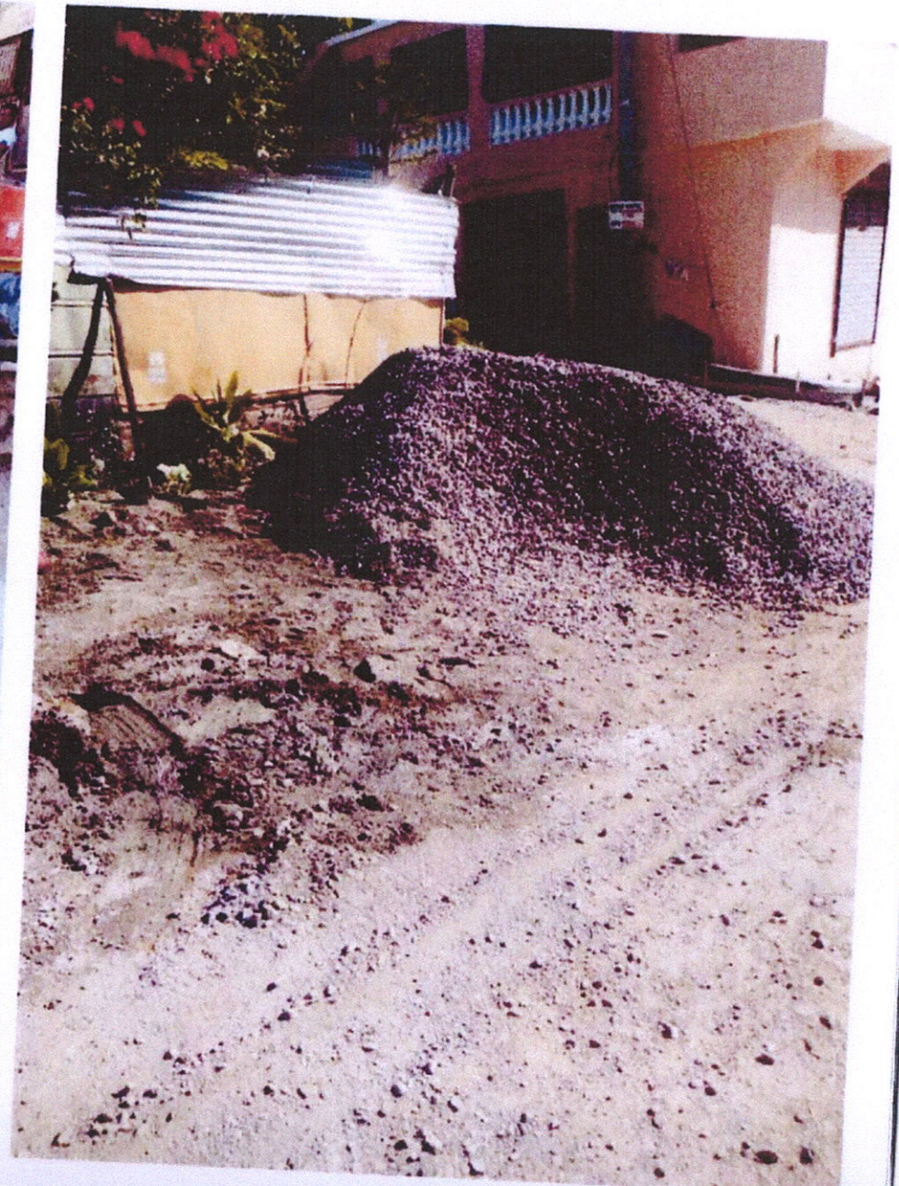





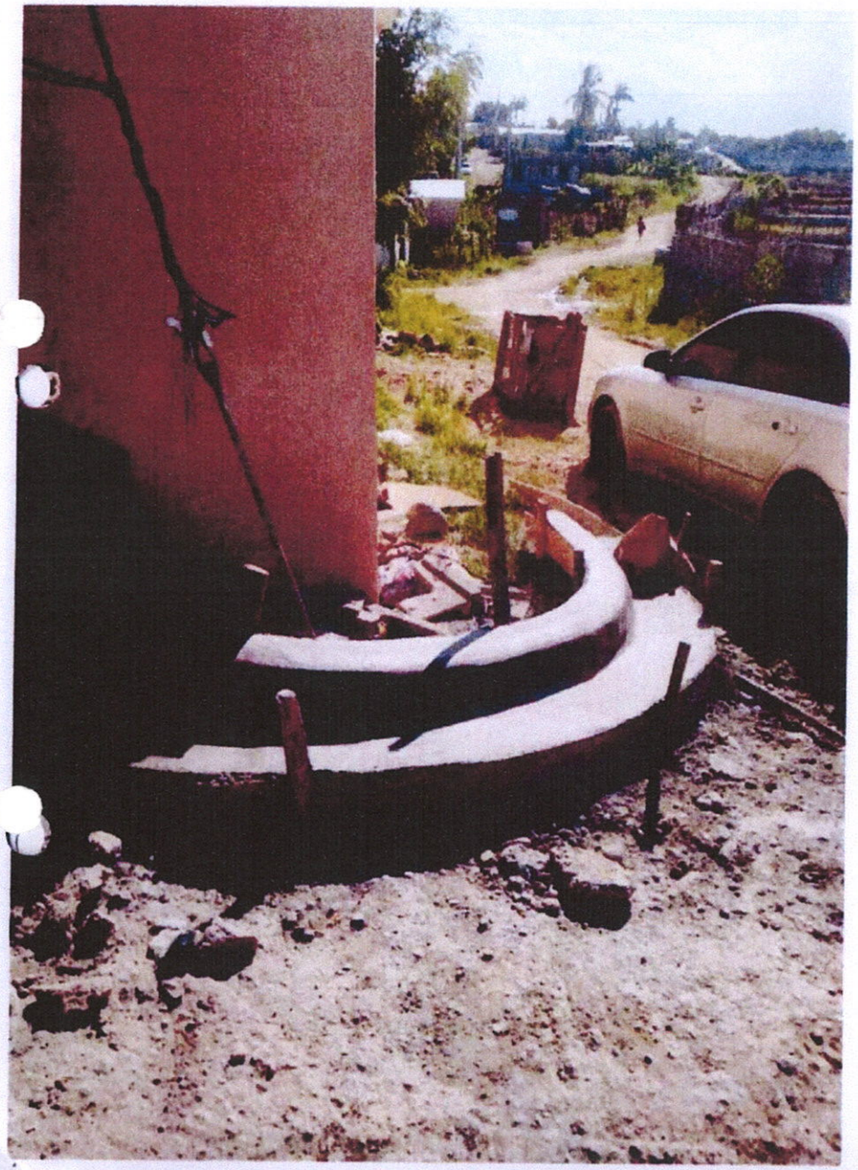

Fecha	Concepto	Valor
8/07/2022	P/R: PAGO A FAVOR DEL SR. RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE CUBICACION #2, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA, EN	557,669.89

7261

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
PROGRAMA DE INVERSION

No. 018601

DIA	MES	AÑO
08	07	2022

RNC: 430-04253-6
DO28BRRD00000000002440009274

0016873

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RUDDY MATEO JIMENEZ **RD$** *557,669.89

*** QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 89/100 ***

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

IRodriguez

FIRMA(S)

⑈018601⑈ 244122722130244000927 4⑈ 28

Cap. No. _____ *Sub-Objeto* _____ *Fondo* _____ *Comprobante No.* _____ *Fecha* _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
No. Comprobante ...: 2202780 P/R: PAGO A FAVOR DEL SR. RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE CUBICACION #2, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA, EN LOS ALCARRIZOS, CO		Estructura Clasific. 0011010094 272401	557,669.89

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

TOTAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2202780
FECHA 8/07/2022
SECUENCIAL: 2820

TIPO COMPROBANTE: 2202779 **Etapa:** Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 18120 **RNC/CED/PAS:** 00110826062
BENEFICIARIO: RUDDY MATEO JIMENEZ
DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R: PAGO A FAVOR DEL SR. RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE CUBICACION #2, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA, EN LOS ALCARRIZOS, CONTRATO NO. 020/2022. D/F 07/07/2022. ANEXO***QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTS Y NUEVE PESOS CON 89/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0094	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	569,050.91
					Menos las siguientes Retenciones	
00 11 01 0094	272401	40	9992	103	MENOS 2% De: 569,050.91	(11,381.02)
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 557,669.89

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No.	2202779
FECHA	8/07/2022
SECUENCIAL:	2819

TIPO COMPROBANTE: 2202780 **Etapa:** Devengado

CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 18120 **RNC/CED/PAS:** 00110826062

BENEFICIARIO: RUDDY MATEO JIMENEZ

DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R: PAGO A FAVOR DEL SR. RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE CUBICACION #2, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA, EN LOS ALCARRIZOS, CONTRATO NO. 020/2022. D/F 07/07/2022. ANEXO***QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS CON 91/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0094	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	569,050.91
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 569,050.91

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE LOS ALCARRIZOS
GESTIÓN 2020-2024

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Liga municipal

7de julio de 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde Municipal

Vía : Dirección Financiera

De la : Dirección Administrativa

Asunto : Pago cubicación #2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCION FINANCIERA
AUTORIZADO
Firma
Fecha 8/7/2022

Distinguidos Señores:

Cortésmente le estamos solicitando el pago a favor de**: Ruddy Mateo Jimenez.**

Codia: 20925 Contrato No. **020/2022**. RNC: **001-1082606-2**

Monto a pagar: **RD$569,050.91 (QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS CON 91/100).**

Por concepto de Pago de: Cubicación **#2**, para la construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes calles del sector La Esmeralda, en los Alcarrizos.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO
Prov. Sto. Dgo., R.D.

Atentamente,

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Santo Domingo R.D.

Lcda. Luisana Guzmán
Administrativa

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario
Dirección de Obras Públicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
19 de Mayo de 2022

Oficio No. 005-2022
Contrato No: 020-2022

Al : **Sr. Cristian Encamación**
Alcalde del AMA

Vía : **Lic. Luisanna Guzmán**
Directora de Administrativo

Del : **Ing. Freddy M. Dini Lebrón**
Director de Obras Publicas Municipal

Anexo : Cubicación Autorizada. Fotos.

Asunto	: Solicitud Pago de Cub.1

Muy cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el pago de la cub. 1 Correspondiente a Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, C/ Larimar, C/ Ónice, C/ 1ra y C/ Los Pedros en el Sector La Esmeralda. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. Por un monto de **RD$ 1, 689,057.77 (Un Millón Seiscientos Ochenta Nueve Mil, Cincuenta con 77/100).** Con Fondos de la Liga.

El mismo a nombre de **Ing. Ruddy Mateo Jiménez** Portador de la cedula de identidad **No- 001-1082606-2**.

Sin otro particular se despide:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO
Prov. Sto. Dgo., R.D.

Atentamente:

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Pública Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario.

Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
19 mayo 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde del AMA

Via : **Lic. Luisana Guzmán**
Directora del Departamento Administrativo

Del : **Ing. Freddy M. Dini Lebrón**
Director de Obras Publicas Municipal

Asunto : Informe de inspección a nombre **Ing. Ruddy Mateo Jimenez portador** de la cedula de identidad y electoral **No.001-1082606-2**.

Anexo : Presupuesto Autorizado, Fotos y Soporte T.

Muy cortésmente, me dirijo a usted para remitirle el informe de la Inspección de la cub l perteneciente al contrato (020-2022) correspondiente a la correspondiente Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, C/ Lanimar, C/ Ónice, C/ 1ra y C/ Los Pedros en el Sector La Esmeralda. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. Se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance 40.79%.

Este informe fue suministrado, evaluado y autorizado por la parte interesadas.

Ing. Jose Modesto Navarro
Supervisor de Obras

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO
Prov. Sto. Dgo., R.D.

Ing. Ruddy Mateo Jimenez
Contratista

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Publica Municipal

DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
Productivo, Participativo y Solidario.

Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio Los Alcarrizos,
Prov. Santo Domingo
19 mayo 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde del AMA

Via : **Lic. Luisana Guzmán**
Directora del Departamento Administrativo

Del : **Ing. Freddy M. Dini Lebrón**
Director de Obras Publicas Municipal

Asunto : Informe de inspección a nombre **Ing. Ruddy Mateo Jimenez portador** de la cedula de identidad y electoral **No.001-1082606-2**.

Anexo : Presupuesto Autorizado, Fotos y Soporte T.

Muy cortésmente, me dirijo a usted para remitirle el informe de la Inspeccion de la cub.l perteneciente al contrato (020-2022) correspondiente a la correspondiente Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, C/ Larimar, C/ Ónice, C/ 1ra y C/ Los Pedros en el Sector La Esmeralda. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto. Se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance 40.79%.

Este informe fue suministrado, evaluado y autorizado por la parte interesadas.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO
Prov. Sto. Dgo., R.D.

Ing. Jose Modesto Navarro
Supervisor de Obras

Ing. Ruddy Mateo Jimenez
Contrastista

Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director de Obras Publica Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

"AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS"
(AMA)
Dirección de Obras Públicas Municipales

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO

Contratista:	ING. RUDDY MATEO JIMENEZ		
Obras:	Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, C/ Larimar, C/ Onice, C/ 1ra y C/ Los Pedros en el Sector La Esmeralda. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.		
Cod:	AMA07-OP00721-P000-M		
Sector:	Sector La Esmeralda	No. Contrato	020-2022
Cub. No.	1		
Fecha:	18 de mayo 2022		

Periodo:	Abril-Mayo 2022
Monto Contratado:	5,521,669.30
Monto a Ejecutar:	4,371,509.10
Monto a ejecutar mas Impuestos:	5,521,669.30
Avance Inicial:	1,104,333.86
Avance de Obra:	40.79%

		PRESUPUESTADO				CUBICACION ACTUAL			CUBICACION ANTERIOR			CUBICACION ACUMULADA		
No.	PARTIDAS	Cantidad	Unidad	Costo Unt.	Valor	Cantidad	Valor	%	Cantidad	Valor	%	Cantidad	Valor	%
1.01	Vallas informativa de la obra.	1.00	Ud	15,000.00	15,000.00	1.00	15000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	15000.00	100.00%
					15,000.00									
II	MOVIMIENTO DE TIERRA													
2.01	Demolición de aceras en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Piedra (217.10*1.00)*2	434.20	m^2	100.00	43,420.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.02	Demolición de contenes en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Piedra (217.10)*2	434.20	Ml	100.00	43,420.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.03	Demolición de aceras en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (84.70.10*1.00)*2	169.40	m^2	100.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.04	Demolición de contenes en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (80.70)*2	169.40	Ml	100.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.05	Demolición de aceras en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubi (56.90*1.00)*2	113.80	m^2	100.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.06	Demolición de contenes en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubi (56.90)*2	113.80	Ml	100.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.07	Demolición de aceras en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubi (56.90*1.00)*2	113.80	m^2	100.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.08	Demolición de contenes en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubi (56.90)*2	113.80	Ml	100.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.09	Demolición de aceras en la C/ Cristal, desde la C/ Rubi hasta esquina Estancia (182.70*1.00)*2	365.40	m^2	100.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.1	Demolición de contenes en la C/ Cristal, desde la C/ Rubi hasta esquina Estancia (217.10)*2	365.40	Ml	100.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.11	Demolición de aceras en la C/ Ambar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Piedra (225.80*1.00)*2	451.60	m^2	100.00	45,160.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.12	Demolición de contenes en la C/ Ambar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Piedra (225.80)*2	451.60	Ml	100.00	45,160.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.13	Demolición de aceras en la C/ Cordalina, desde la C/ Ambar hasta el Final (71.40*1.00)*2	142.80	m^2	100.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.14	Demolición de contenes en la C/ Cordalina, desde la C/ Ambar hasta el Final (69.80)*2	142.80	Ml	100.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.15	Demolición de Baden en la C/ Jade esquina C/ cristal. (7*2)	5.60	m^3	1,250.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

2.16	Demolición de Baden en la C/ Gema (4.2*2)	3.36	m³	1,250.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.16	Demolición de Baden en la C/ Respaldo Jade esquina C/ Rubí (7.40*2)	5.92	m³	1,250.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.17	Demolición de Baden C/ cristal hasta esquina C/ Rubí (6.10*2)	4.88	m³	1,250.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.18	Demolición de Baden en la C/ Cardalina (5.80*2)	4.64	m³	1,250.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.19	Demolición de Baden en la C/ Larimar (4.50*2)	3.60	m³	1,250.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.2	Demolición de Baden en la C/ 1ra (4.60*2)	3.68	m³	1,250.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.21	Demolición de Baden en la C/ Estancia próximo C/ San Marcos (7.5*2)	6.00	m³	1,250.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
					405,300.00									
III	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION**													
3.01	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217.10*1.00*0.10)*2	43.42	m³	550.00	23,881.00	7.69	4228.85	17.71%	0.00	0.00	0.00%	7.69	4228.85	17.71%
3.02	Telford para contenes en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217.10*0.45*0.10)*2	19.54	m³	2,155.83	42,122.76	10.54	22720.18	53.94%	0.00	0.00	0.00%	10.54	22720.18	53.94%
3.03	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (84.70.10*1.00*0.10)*2	16.94	m³	550.00	9,317.00	2.21	1215.50	13.05%	0.00	0.00	0.00%	2.21	1215.50	13.05%
3.04	Telford para contenesen la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (80.70*0.45*0.10)*2	7.62	m³	2,155.83	16,433.89	2.56	5519.28	33.58%	0.00	0.00	0.00%	2.56	5519.28	33.58%
3.05	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56.90*1.00*0.10)*2	11.38	m³	550.00	6,259.00	6.11	3360.46	53.69%	0.00	0.00	0.00%	6.11	3360.46	53.69%
3.06	Telford para contenes en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56.90*0.45*0.10)*2	5.12	m³	2,155.83	11,040.01	3.30	7120.69	64.50%	0.00	0.00	0.00%	3.30	7120.69	64.50%
3.07	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56.90*1.00*0.10)*2	11.38	m³	550.00	6,259.00	3.78	2078.99	33.22%	0.00	0.00	0.00%	3.78	2078.99	33.22%
3.08	Telford para contenes en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56.90*0.45*0.10)*2	5.12	m³	2,155.83	11,040.01	2.40	5180.41	46.92%	0.00	0.00	0.00%	2.40	5180.41	46.92%
3.09	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (182.70*1.00*0.10)*2	36.54	m³	550.00	20,097.00	19.39	10664.47	53.07%	0.00	0.00	0.00%	19.39	10664.47	53.07%
3.1	Telford para contenes en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (217.10*0.45*0.10)*2	16.44	m³	2,155.83	35,448.31	9.47	20411.14	57.58%	0.00	0.00	0.00%	9.47	20411.14	57.58%
3.11	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225.80*1.00*0.10)*2	45.16	m³	550.00	24,838.00	21.75	11964.46	48.17%	0.00	0.00	0.00%	21.75	11964.46	48.17%
3.12	Telford para contenes en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225.80*0.45*0.10)*2	20.32	m³	2,155.83	43,810.78	11.16	24049.05	54.89%	0.00	0.00	0.00%	11.16	24049.05	54.89%
3.13	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (71.40*1.00*0.10)*2	14.28	m³	550.00	7,854.00	3.82	2099.85	26.74%	0.00	0.00	0.00%	3.82	2099.85	26.74%
3.14	Telford para contenesen la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (69.80*0.45*0.10)*2	6.43	m³	2,155.83	13,853.36	6.17	13299.23	96.00%	0.00	0.00	0.00%	6.17	13299.23	96.00%
					272,254.12									
IV	**HORMIGON SIMPLE**													
4.01	Construcción dea ceras en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217.10*1.00*0.10)*2	434.20	m²	1,098.25	476,860.15	76.89	84442.40	17.71%	0.00	0.00	0.00%	76.89	84442.40	17.71%
4.02	Construcción dea contenes en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217.10*0.45*0.10)*2	434.20	Ml	911.18	395,634.36	234.20	213397.26	53.94%	0.00	0.00	0.00%	234.20	213397.26	53.94%

4.03	Construcción de aceras en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (84.70.10*1.00*0.10)*2	169.40	m^2	1,098.25	186,043.55	22.10	24271.74	13.05%	0.00	0.00	0.00%	22.10	24271.74	13.05%
4.04	Construcción de la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (80.70*0.45*0.10)*2	169.40	Ml	911.18	154,353.89	56.80	51754.86	33.53%	0.00	0.00	0.00%	56.80	51754.86	33.53%
4.05	Construcción de aceras en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56.90*1.00*0.10)*2	113.80	m^2	1,098.25	124,980.85	61.10	67102.22	53.69%	0.00	0.00	0.00%	61.10	67102.22	53.69%
4.06	Construcción dela C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubí (56.90*0.45*0.10)*2	113.80	Ml	911.18	103,692.28	73.40	66880.49	64.50%	0.00	0.00	0.00%	73.40	66880.49	64.50%
4.07	Construcción de para aceras en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56.90*1.00*0.10)*2	113.80	m^2	1,098.25	124,980.85	37.80	41513.64	33.22%	0.00	0.00	0.00%	37.80	41513.64	33.22%
4.08	Construcción de en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubí (56.90*0.45*0.10)*2	113.80	Ml	911.18	103,692.28	53.40	48656.57	46.92%	0.00	0.00	0.00%	53.40	48656.57	46.92%
4.09	Construcción de aceras en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (182.70*1.00*0.10)*2	365.40	m^2	1,098.25	401,300.55	193.90	212950.14	53.07%	0.00	0.00	0.00%	193.90	212950.14	53.07%
4.1	Construcción de contenes en la C/ Cristal, desde la C/ Rubí hasta esquina Estancia (217.10*0.45*0.10)*2	365.40	Ml	911.18	332,945.17	210.40	191709.83	57.58%	0.00	0.00	0.00%	210.40	191709.83	57.58%
4.11	Construcción de aceras en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Piedra (225.80*1.00*0.10)*2	451.60	m^2	1,098.25	495,969.70	217.54	238908.60	48.17%	0.00	0.00	0.00%	217.54	238908.60	48.17%
4.12	Construcción de contenes en la C/ Ámbar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Piedra (225.80*0.45*0.10)*2	451.60	Ml	911.18	411,488.89	247.90	225878.60	54.89%	0.00	0.00	0.00%	247.90	225878.60	54.89%
4.13	Construcción de aceras en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (71.40*1.00*0.10)*2	142.80	m^2	1,098.25	156,830.10	38.18	41930.10	26.74%	0.00	0.00	0.00%	38.18	41930.10	26.74%
4.14	Construcción de contenes en la C/ Cordalina, desde la C/ Ámbar hasta el Final (69.80*0.45*0.10)*2	142.60	Ml	911.18	130,116.50	137.09	124911.84	96.00%	0.00	0.00	0.00%	137.09	124911.84	96.00%
					3,598,889.13									
V	HORMIGON ARMADO													
5.01	Construcción de Baden en la C/ Jade esquina C/ cristal (7*2)	14.00	m^2	3,559.66	49,835.24	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.02	Construcción de Baden en la C/ Gema (4.2*2)	8.40	m^2	3,559.66	29,901.14	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.03	Construcciónde Baden en la C/ Respaldo Jade esquina C/ Rubí (7.40*2)	14.80	m^2	3,559.66	52,682.97	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.04	Construcción de Baden C/ cristal hasta esquina C/ Rubí (6.10*2)	12.20	m^2	3,559.66	43,427.85	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.05	Construcción de Baden en la C/ Cardalina (5.80*2)	11.60	m^2	3,559.66	41,292.06	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.06	Construcción de Baden en la C/ Larimar (4.50*2)	9.00	m^2	3,559.66	32,036.94	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.07	Construcción de Baden en la C/ 1ra (4.60*2)	9.20	m^2	3,559.66	32,748.87	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5.08	Construcción de Baden en la C/ Estancia próximo C/ San Marcos (7.5*2)	15.00	m^2	3,559.66	53,394.90	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
					335,319.97									
VII	LIMPIEZA FINAL													
7.01	Limpieza general y final	1.00	P.A.	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
					17,000.00									

	Sub-Total General				4,373,606.10		1,779,211.50						1,783,211.50	
B	*GASTOS INDIRECTOS:*													
1.000	*DIRECCION TECNICA Y RESP. CIVIL*					10.000%							178,321.13	✓
1.001	*GASTOS ADMINISTRATIVOS.*					3.000%							53,496.34	✓
1.002	*SEGUROS Y FIANZAS.*					2.500%							44,580.28	✓
1.003	*LIQUIDACION Y PRESTS. LABORALES. Ley 686*					1.000%							17,832.11	✓
1.004	*CODIA 1X1000. Ley 6160 de 1963 para el estado y sus dependencias*					0.100%							1,783.21	✓
1.005	*ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4 Parrafo I)*					18.000%							32,097.80	✓
	Total Gastos Indirectos												328,110.86	
	Total Cubicado hasta la Fecha												2,111,322.36	
	Amortizacion 20% valor cubicado												422,264.47	
	TOTAL A PAGAR DE CUB. 1												1,689,057.89	

Nota: La presente Cubicacion se expide a total responsabilidad del Depto de Supervicion, mediante los supervisores actuantes en la misma.-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO

Preparado Por:

Nikaudy Rodriguez

Ing. Nikaudy Rodriguez

Depto. Fiscalización

Datos suministrados por:

Jose Modesto Navarro

Jose Modesto Navarro.

Revisado por:

Sr. Cesar Puala Frias

Supervisor

Aprobado Por:

ING. RUDDY MATEO JIMENEZ

Contraloría

Aprobado por:

Ing. Freddy M. Dominguez

Director de Obras Públicas

ALCALDIA MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS

DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

Fecha	Concepto	Valor
31/05/2022	PIR. PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE CU BICACION #1, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERA, CONTENES Y BADEN S EN LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA, EN LOS A	1,655,276.61

Clave Municipal No.

No. 018532

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
PROGRAMA DE INVERSION

DIA	MES	AÑO
31	05	2022

0011680104

RNC: 430-04253-6
DO28BRRD0000000000002440009274

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RUDDY MATEO JIMENEZ

RD$ *1,655,276.61

*** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 61/100 ***

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

I Rodriguez

FIRMA(S)

⑈018532⑈ 244122727130244000927 4⑈ 28

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
No. Comprobante .. : 2201937 PIR. PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE CUBICACION #1, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERA, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA, EN LOS ALCARRIZOS., SEGUN C		Estructura Clasific. 0011010004 272401	1,655,276.61

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloria y Cámara de Cuenta.

TOTAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No.	2201937
FECHA	31/05/2022
SECUENCIAL:	1959

TIPO COMPROBANTE: 2201936 **Etapa:** Pagado

CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 18120 **RNC/CED/PAS:** 00110826062

BENEFICIARIO: RUDDY MATEO JIMENEZ

DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R: PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE CUBICACION #1, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERA, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA, EN LOS ALCARRIZOS,, SEGUN COM. D/F: 31/05/2022. ANEXO***UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 61/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0094	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,689,057.77
					Menos las siguientes Retenciones	
00 11 01 0094	272401	40	9992	103	MENOS 2% De: 1,689,057.77	(33,781.16)
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 1,655,276.61

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2201936
FECHA 31/05/2022
SECUENCIAL: 1958

TIPO COMPROBANTE: 2201937 **Etapa:** Devengado

CLASE DOCUMENTO: Original **Comp. que modifica:**

CODIGO BENEFICIARIO: 18120 **RNC/CED/PAS:** 00110826062

BENEFICIARIO: RUDDY MATEO JIMENEZ

DIRECCION: **TELEFONO:**

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R: PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE CUBICACION #1, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERA, CONTENES Y BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA, EN LOS ALCARRIZOS,, SEGUN COM. D/F: 31/05/2022 ANEXO***UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE CON 77/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0094	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,689,057.77
					**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	

Total RD$ 1,689,057.77

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0222952170082**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **RUDDY MATEO JIMENEZ**, RNC No. **00110826062**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO OESTE** , Administración Local **ADM LOCAL HERRERA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• **ITBIS**	• **RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA**
• **ANTICIPO RENTA 3 CUOTAS**	• **IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.**

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los **treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil veintidos (2022).**

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (**30**) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

Código de firma: R1T1-PBK4-B2K1-6539-2696-3485
sha1: tLQYvt+AlVygk1zBl3VqOAHSAsE=
DGII - OFICINA VIRTUAL
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
R1T1-PBK4-B2K1-6539-2696-3485

Verifique la legitimidad de la presente certificación en **http://www.dgii.gov.do/verifica** o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO
Prov. Sto. Dgo., R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE LOS ALCARRIZOS
GESTIÓN 2020-2024

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

DIRECCION ADMINISTRATIVA

31 de mayo de 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde Municipal

Vía : Dirección Financiera

De la : Dirección Administrativa

Asunto : Pago cubicación **#1**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCION FINANCIERA
AUTORIZADO
Firma
Fecha 31/05/2022

Distinguidos Señores:

Cortésmente le estamos solicitando el pago a favor de**: Ruddy Mateo Jimenez.**

Codia: 20925 Contrato No. **020/2022**. RNC: **001-1082606-2**

Monto a pagar**: RD$1,689,057.77 (Un Millón Seiscientos Ochenta Nueve Mil, cincuenta con 77/100).**

Por concepto de Pago de: Cubicación **#1**, para la construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes calles del sector La Esmeralda, en los Alcarrizos.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
REVISADO
Prov. Sto Dgo. R.D.

Atentamente,

Lcda. Luisana Guzmán
Administrativa

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Santo Domingo R.D.

Fecha	Concepto	Valor
22/04/2022	POR PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ POR CONCEPTO DE AV ANCE INICIAL 20% PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA, EN LOS	1,082,198.75

Clave Municipal No.

No. 018506

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
PROGRAMA DE INVERSION

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RUDDY MATEO JIMENEZ

RD$ **1,082,198.75

UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 75/100 ***

PESOS

BanReservas

#018506# 244127291302440009279# 28

DETALLE DE CUENTA PRESUPUESTARIA	Subtotal	Unidad Organizativa	Valor
No. Comprobante: 2022-[illegible]		Estructura Clasific.	
POR PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL 20% PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA, EN LOS ALCARRIZOS.		301-10-00004 21-2-001	1,082,198.75
		TOTAL	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2201423
FECHA 22/04/2022
SECUENCIAL: 1439

TIPO COMPROBANTE: 2201422 — Etapa: Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original — Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 18120 — RNC/CED/PAS: 00110826062
BENEFICIARIO: RUDDY MATEO JIMENEZ
DIRECCION: — TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R. PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL 20%, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN COMUNICACION D/F: 20/04/2022. ANEXO***UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL CIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 75/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Específ.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0094	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,104,284.44
					Menos las siguientes Retenciones	
00 11 01 0094	272401	40	9992	103	MENOS 2% De: 1,104,284.44	(22,085.69)

***** Debajo de esta linea no hay nada escrito *****

CK No.	Monto	Fecha

Total RD$ 1,082,198.75

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

829-315 6532

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)
Calle Duarte #359, Sector Landia
Teléfono (809)363-2736 Fax (809)621-6368
RNC: 430-04253-6

Form. 815

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2201422
FECHA 22/04/2022
SECUENCIAL: 1438

TIPO COMPROBANTE: 2201423 — Etapa: Devengado
CLASE DOCUMENTO: Original — Comp. que modifica:
CODIGO BENEFICIARIO: 18120 — RNC/CED/PAS: 00110826062
BENEFICIARIO: RUDDY MATEO JIMENEZ
DIRECCION: — TELEFONO:
CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

P/R: PAGO A FAVOR DE RUDDY MATEO JIMENEZ, POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL 20%, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESMERALDA, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN COMUNICACION D/F: 20/04/2022. ANEXO***UN MILLON CIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 44/100***

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD$
00 11 01 0094	272401	40	9992	103	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,104,284.44

**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****

Total RD$ 1,104,284.44

CK No.	Monto	Fecha

Beneficiario

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Alcalde

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Calle Duarte #359, Los Alcarrizos
ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
809-363-2736

DIRECCION ADMINISTRATIVA

20 de abril de 2022

Al : **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde Municipal

Vía : Dirección Financiera

De la : Dirección Administrativa

Asunto : Pago Avance Inicial **del 20%**

Distinguidos Señores:

Cortésmente le estamos solicitando el pago a favor de**: Ruddy Mateo Jimenez.**

Codia: 20925 Contrato No. **020/2022**. RNC: **001-1082606-2**

Monto a pagar: **RD$1,104,284.44 (Un Millón Ciento Cuatro Mil Doscientos Ochenta Y Cuatro Pesos Con 44/100).**

Por concepto de Pago de: Avance inicial del **20%**, para la construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes calles del sector La Esmeralda, en los Alcarrizos.

Atentamente,

Lcda. Luisana Guzmán
Administrativa

AUTORIZADO
Firma
Fecha 22/9/2022

CONTRATO DE OBRA DETERMINADA

AÑO: **2022**
CONTRATO NO.**020-2022**
No. Presupuesto: **AMA07-OP00721-P000-M**

ENTRE: EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS, RNC [No.430-04253-6] institución del Estado Dominicano creada en virtud de **La Ley** 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios, de fecha 17/07/2007, con domicilio y asiento social en **C/ Duarte No. 359**, Sector Landia, Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, debidamente representado por su Alcalde **CRISTIAN ENCARNACION**, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0582396-7, domiciliado y residente en este municipioquien para los fines del presente Contrato, se denominará **LA ENTIDAD CONTRATANTE**. Debidamente representado por el **ING.RUDDY MATEO JIMENEZ,** dominicano, mayor de edad, Soltero, titular de la cedula de identidad y electoral NO.001-1082606-2, domiciliado(a) y residente en la C/ JOSE REYES, RESIDENCIAL INESPRE EDIFICIO 14, APTO. 302, HATO NUEVO,MANO GUAYABO, STO DGO, D. N. Quien para los fines del presente Contrato, se denominara **"EL CONTRATISTA"**. Para referirse a ambos se les denominará **LAS PARTES.**

PREÁMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la COMPARACION DE PRECIOS.

POR CUANTO: El Reglamento No.543-12, que regula la Ley 340-06, establece en el Art.58 que "En caso de contrataciones de obras por montos inferiores al umbral mínimo establecido para la comparación de precios, deberá utilizarse el procedimiento por comparación de precios."

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 1, establece además que: *Comparación de Precios es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores.*

POR CUANTO: El Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selección del Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratación.

POR CUANTO: El Órgano Rector, emitió la resolución No.01-2021, mediante la cual aprobó los umbrales para este año, siendo el umbral para la Comparación de Precios un monto que va desde la suma de RD$98,574,934.00 hasta un monto de RD$394,299,732.00 para la contratación de obras y tomando en cuenta lo dispuesto por el Art.58 del reglamento 543-12.

POR CUANTO: El monto al cual asciende la presente obra está por debajo del umbral tope.-

POR CUANTO: En fecha Dieciséis (16) de Marzo del año **2022**, el **AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, procedió a hacer una convocatoria amplia a los proveedores inscritos en el registro de proveedores del Estado, en el portal transaccional del sistema nacional de contrataciones públicas de la Republica Dominicana.

POR CUANTO: Que el día Dieciséis (16) Marzo del año 2022, fue adjudicada la Obra, a través del portal del Órgano Rector y que además cumplió con las especificaciones del pliego de condiciones. Contrato de Ejecución de Obra: **PARA LA AMA-CCC-CP-2022-0003, CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LAS ESMERALDA, CORRESPONDIENTE A LA ETAPA I; PERTENECIENTE A LAS ACERAS, CONTENES, BADENES, RELLENOS, ALCANTARILLADOS, IMPRIMICION, SEÑALIZACION DE CALLES, PUENTES, DEL PLAN-PRO ASFALTO, DE (REFERENCIA: AMA-CCC-CP-2022-0003).**

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES: Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que expresa a continuación: **Certificado de recepción definitiva**: El o los certificados expedidos por el supervisor a **EL CONTRATISTA** al final del o de los periodos de garantía, en el que se declare que **EL CONTRATISTA** ha cumplido sus obligaciones contractuales. **Contratista**: Nombre de la persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutará el objeto del Contrato. **Contrato**: El presente documento **Coordinador:** Persona designada como tal por **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** para realizar las funciones de coordinación de todas las actividades relacionadas con la Obra y que tengan incidencia en la ejecución del Contrato. **Desglose de precios unitarios**: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado. **Emplazamiento**: Los terrenos proporcionados por **AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** en que deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamiento. **Entidad Contratante**: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS, Instalación:** Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporación a la Obra. **Lista de precios**: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que **EL CONTRATISTA** presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del Contrato de precio unitario. **Monto del Contrato**: El importe señalado en el Contrato. **Obras**: Las obras que deban realizarse, con carácter temporal o permanente, con arreglo al Contrato. **Periodo de Garantía**: El período estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha de aprobación provisional, durante el cual **EL CONTRATISTA** se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las indicaciones del supervisor. **Planos detallados**: Los planos proporcionados por **EL CONTRATISTA** de acuerdo a la solicitud de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** y aprobados por la Supervisión para la ejecución de las obras. **Plazos:** Los plazos del Contrato que empezará a contar a partir del día siguiente a la fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el último día del plazo coincidiere con un día festivo, el plazo expirará al final del día laborable siguiente al último día de plazo. **Presupuesto Detallado**: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio unitario correspondiente. **Representante del Supervisor**: Cualquier persona física o jurídica designada como tal con arreglo al Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el cumplimiento de las funciones que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante, toda referencia que se haga al primero se entenderá hecha al segundo. **Sub-Contratista**: Persona natural o jurídica, o asociación de estas, la cual celebra Contrato directamente con **EL CONTRATISTA**, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecución de la obra. **Supervisor**: Persona natural o jurídica de Derecho Público, competente, designada por (**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**), responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el diseño, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construcción del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien (**el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**), puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al Contrato. **Especificaciones Tecnicas**: Condiciones exigidas por (**el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**), para la realización de las Obras.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO: Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrínseca del mismo: a) El Contrato propiamente dicho., b)Pliegos de Condiciones Específicas ,c)Especificaciones Tecnicas y de Construccion., d)Calculos Estructurales., e)Planos Aprobados por el Ayuntamiento correspondiente., f)Presupuesto., g)Planes de Manejo Ambiental., h)Cronograma de Ejecución de Obras., i)Garantías ,y j)Documentos ofertados ,a saber: Poliza de fianza., Fianza de fiel cumplimiento o ejecucion ,Informe de ficha tecnica., Informe final., Acta de comprobacion con traslado de notario., Registro de participante., oferta económica., certificacion de impuestos internos., fianza de licitación o mantenimiento de oferta., presupuesto., Presentacion de oferta., Registro de proveedor del estado., Plan de trabajo., Equipos del oferente., certificación de impuestos internos.,

ARTÍCULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO: **EL CONTRATISTA** se compromete a ejecutar con todas las garantías de hecho y de derecho, de acuerdo con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demás anexos que forman parte integral del presente Contrato. La Obra que se describe a continuación, **CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN DIFERENTES CALLES DEL SCTOR LAS ESMERALDA, CORRESPONDIENTE A LA ETAPA I; PERTENECIENTE A LAS ACERAS, CONTENES, BADENES, RELLENOS, ALCANTARILLADOS, IMPRIMICION, SEÑALIZACION DE CALLES, PUENTES, DEL PLAN-PRO ASFALTO, DE (REFERENCIA: AMA-CCC-CP-2022-0003).** **EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programación general acordada y establecida previamente entre **LAS PARTES** (Cronograma de Ejecución de Obra), la cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato.

ARTÍCULO 4.- MONTO DEL CONTRATO: **LAS PARTES** convienen que el monto total a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma de **(RD$5, 521,422.21) CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VENINTIDOS PESOS CON 21/100 CENTAVOS MONEDA LEGAL NACIONAL,** En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan Las partidas, sub-partidas y el costo general de la Obra.

ARTÍCULO 5.- FORMA DE PAGO: Los pagos se harán de la siguiente manera: Un primer pago o anticipo correspondiente al 20% del valor total de la obra, cuya suma tiene un valor de **(RD$ 1,104,284.44) UN MILLON CIENTOS CUATRO MIL DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 44 /100 CENTAVOS MONEDA LEGAL NACIONAL,** Este pago se hará después de la firma del contrato . EL **CONTRATISTA** utilizara el Anticipo únicamente para operaciones relacionada con la ejecución de la obra, la suma restante será pagada en pagos parciales a el **CONTRATISTA**, mediante cubicaciones periódicas por obra realizada y certificada por la supervisión., El monto de la primera cubicación realizada por el **CONTRATISTA** deberá exceder o por lo menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo o Avance Inicial., Podrán cubicarse Obras adicionales elaboradas como ordenes de Cambio , y serán pagadas èn la medida en que sean ejecutadas ,previo acuerdo de precios entre **LAS PARTES** . Estas Obras adicionales serán regidas por las condiciones de este contrato a menos que sea acordado de manera diferente entre las **PARTES**.

ARTÍCULO 6.- TIEMPO DE EJECUCIÓN: **EL CONTRATISTA** se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a más tardar **CINCO (05)** días después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Artículo **05**, y deberá entregarla totalmente terminada y a satisfacción de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** en un plazo no mayor de **SESENTA (60)** días calendario, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato. **EL CONTRATISTA** deberá entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la Ruta Crítica de Ejecución de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecución establecido.

ARTÍCULO 7.- COMPENSACIÓN POR DEMORA: Si **EL CONTRATISTA** no entrega la Obra en el plazo convenido en el Artículo 7 de este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, **EL CONTRATISTA** adeudará al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, como justa indemnización por daños y perjuicios, una compensación correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para la terminación del Contrato. Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de la Obra, y serán descontadas del pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a **EL CONTRATISTA**. El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios, no exonerará a **EL CONTRATISTA** de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto **EL CONTRATISTA** declara que queda constituido en mora por el sólo vencimiento del plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

ARTÍCULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO: Ni el **AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** ni **EL CONTRATISTA** serán responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato

si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situación que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, Huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: a) Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte., b) Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. c) Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato. La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, **EL CONTRATISTA** no concluye sus labores en el plazo establecido, **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** extenderá el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual **EL CONTRATISTA** no pudo cumplir, debido únicamente a esta causa. **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendrá derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Si **EL CONTRATISTA** dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido dentro del periodo especificado, se considerará que ha renunciado a su derecho en relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS: Queda convenido que **EL CONTRATISTA** no tendrá derecho a reclamar incrementos de precios durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra.

ARTÍCULO 10.- SUPERVISIÓN: La Supervisión representará por el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** y será intermediaria entre ésta y **EL CONTRATISTA**, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato. **EL CONTRATISTA** permitirá que el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** o su representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTÍCULO 11.- NO RELACIÓN LABORAL: LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la Republica Dominicana. **EL CONTRATISTA** acuerda, por este medio, liberar al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** de toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecución del presente Contrato.

ARTÍCULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA: En un plazo de quince (15) días después de constituirse la Garantía de Fiel Cumplimiento que dispone el Artículo [**18**] **EL CONTRATISTA** suministrara al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** y al Supervisor un ejemplar en copia dura y otro electrónico de los planos elaborados para la ejecución de El Contrato, así como las Especificaciones Técnicas definitivas, presupuesto y otros documentos de El Contrato. En el momento de expedirse el Certificado de Garantía, o en el momento de la recepción definitiva, **EL CONTRATISTA** suministrará a **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** y al Supervisor todos los planos, en copia dura y electrónica, como construido (**As Built**) y cualquier otro documento requiendo por **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** y El Supervisor.

ARTÍCULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA ejecutará y concluirá las Obras y subsanará cualquier deficiencia de las mismas identificadas por el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** con el cuidado y la diligencia debidos, y en Riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato. **El CONTRATISTA** será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de la obra, respondiendo por los errores de interpretación incurridos durante la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva por parte de la Entidad Contratante. **EL CONTRATISTA** se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando **EL CONTRATISTA** considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan El Contrato, deberá notificarlo a El Supervisor en un plazo de treinta (30) días a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecución de la orden administrativa no se suspenderá como consecuencia de dicha notificación. **EL CONTRATISTA,** ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecución de tales trabajos, en este último caso, **EL CONTRATISTA** quedará exento de responsabilidad. Asimismo, **EL CONTRATISTA** será responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta. **EL CONTRATISTA** respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en el Estado Dominicano. Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institución privada o pública, para la realización de los trabajos de construcción y ejecución de El Proyecto, cuya obtención sea usualmente responsabilidad de un contratista general, deberán ser obtenidas por **EL CONTRATISTA**.

ARTÍCULO 14.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA dirigirá personalmente las Obras o nombrará a un representante suyo para que lo haga. El representante de **EL CONTRATISTA** tendrá plena autoridad para adoptar cualquier decisión que sea necesaria para la ejecución de las Obras, para recibir y llevar a cabo órdenes administrativas. En cualquier caso, será responsabilidad de **EL CONTRATISTA** cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y según el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas.

ARTÍCULO 15.- APROBACIÓN DEL PERSONAL: La aceptación de la Oferta por parte del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** se considera como acuerdo con el personal propuesto. Con relación a cualquier otro personal de **EL CONTRATISTA** deberá someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** para su revisión y aprobación. Si el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** no lo objeta dentro de los primeros diez (10) días de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestión ha sido aprobado.

ARTÍCULO 16.- REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PERSONAL: EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa autorización del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** la cual no será negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de **EL CONTRATISTA** sea necesario el reemplazo de cualquier personal, **EL CONTRATISTA** se compromete a reemplazarlo por una persona con semejantes aptitudes y experiencia. **El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo. **PÁRRAFO: EL CONTRATISTA** deberá entregar a El **Supervisor** del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** un listado con cada una de las personas que trabajarán en el período de construcción acordado. Este personal deberá estar debidamente identificado como empleado de **EL CONTRATISTA**, y dicha identificación deberá considerar los siguientes datos personales: a) Nombre completo., b) Cédula de Identidad Personal,.c)Cargo ó responsabilidad., d)Dirección. e) Teléfono. Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTÍCULO 17.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de las Obras como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y molestias a personas y Propiedades resultantes de contaminación, ruido y otros derivados de sus operaciones. **EL CONTRATISTA** se asegurará de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al Terreno durante el

periodo del Contrato estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley. La seguridad del área de la Obra durante el período de construcción es responsabilidad de **EL CONTRATISTA**. Es responsabilidad de **EL CONTRATISTA** asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia relacionadas con el público y la seguridad de la construcción, así como obedecer todas las regulaciones establecidas por el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** es obligación acatar é implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la Obra y/o ejecución de trabajos: a)Uso de casco de seguridad., b)Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura., c)Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de protección., d)Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores. ,e) Uso de andamios seguros. f) Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo. Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberán cumplir completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** cooperara en lo concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se permitirán menores en los lugares de trabajo en ningún momento. El Supervisor del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** podra expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas. **EL CONTRATISTA** cumplirá en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construcción.

ARTÍCULO 18.- GARANTÍA DE ANTICIPO: Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, **EL CONTRATISTA** deberá proporcionar una garantía del mismo, constituyendo una póliza de seguro de fidelidad a entera satisfacción del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** por un valor equivalente al monto del avance inicial. La presente garantía se reducirá automaticamente y en la misma proporción en que el anticipo se impute a los abonos, y permanecerá en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el Contrato hasta que el ***AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS*** haya recibido del Contratista el reembolso total de ese monto.

ARTÍCULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCIÓN DE CONTRATO: EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposición de la Obra, así como también, por la provisión de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra necesarios para tales fines. Si en cualquier momento o en el curso de la realización de la Obra surgiera o se presentara algún error de disposición, dimensiones o alineación de alguna parte de la Obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento del ***AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS*** o la Supervisión, deberá, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfacción.

ARTÍCULO 20.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato **EL CONTRATISTA** hace formal entrega de una garantía bancaria o una poliza (No 3-1206-9139) De Fecha Doce (12) del mes Abril del 2022, De la Compañía de Seguros APS, por un valor del 4% del monto de RD(220,856.89) de seguros a favor del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 111 y 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha treinta (30) de agosto del dos mil siete (2007), por un valor equivalente al Cuatro por ciento (04%) del monto del Contrato. (cuya póliza para este caso no es exigible de acuerdo al articulo 118 del reglamento 543-12 que establece que las Adjudicaciones que estén por debajo de Diez mil dólares) **PARRAFO I**. Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la ejecución de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTÍCULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL: EL CONTRATISTA será el único responsable por los daños y perjuicios causados a las personas que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, así como también, asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos deberá presentar para la suscripción del presente Contrato la póliza de responsabilidad civil general, correspondiente **EL CONTRATISTA** mantendrá al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamación, compensación, perdidas o Gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios

indemnizables previstos por **EL CONTRATISTA**. Se entiende por obligaciones de indemnización a las reclamaciones, demandas/acciones, pérdidas o pasivos que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedades o muerte de personas, o destrucción de la propiedad física **EL CONTRATISTA** obtendrá y mantendrá un seguro contra pérdidas y reclamaciones que surgieren de fallecimiento o lesión a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo que el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** esté indemnizado.

ARTICULO 22. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS: Al finalizar los trabajos, **EL CONTRATISTA** deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas por el a satisfacción del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** (Garantía de Vicios Ocultos) por un monto equivalente al **Veinte Por Ciento (20%)** de dicho valor a que haya ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra. Esta garantía deberá ser por un (1) año con la finalidad de salvaguardar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**. Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano. **EL CONTRATISTA** también será responsable por los daños que ocasione a las Obras existentes en el terreno desde el momento de su inicio de ejecución y que no sean solucionados por el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** hasta el momento de recibir la Obra terminada.

ARTICULO 23. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: **EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando **EL CONTRATISTA** presente los siguientes documentos: a)Garantía de Vicios Ocultos y de la Calidad de las Obras. b)Certificado de Descargo de la Secretaría de Estado de Trabajo. c)Pago de Liquidación de todos los compromisos de la Seguridad Social, d)Certificación de estar al día con el pago de impuesto Sobre La Renta. e)Comprobante de pagos de las obras de Obra.

ARTICULO 24. IMPUESTOS: **EL CONTRATISTA** no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del presente Contrato y por tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTICULO 25. EQUILIBRIO ECONÓMICO: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se produjere cambios en las leyes, decretos, reglas o relacionados con la moneda nacional que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por **EL CONTRATISTA** para la ejecución de la obra, los pagos y los gastos reembolsables pagables a **EL CONTRATISTA**, en virtud de este Contrato, aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaciones que hayan sufrido la legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional.

ARTICULO 26. SUB-CONTRATACIONES: **EL CONTRATISTA** no podrá ceder el Contrato o cualquier parte de mismo, ni ningún beneficio o participación o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**. El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, no eximirá a **EL CONTRATISTA** de ninguna responsabilidad y obligación establecida por el Contrato, de igual manera, queda entendido que **EL CONTRATISTA** será también responsable de todos los actos, omisiones, faltas, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTICULO 27. RESCISIÓN: **EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**] se reserva el derecho de dar por terminado este contrato en caso de que **EL CONTRATISTA** diera muestras evidentes de incumplimiento de sus obligaciones. **EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL** podrá rescindir por responsabilidad imputada al presente Contrato así como ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si **EL CONTRATISTA** fuese a la quiebra, o si se entendiese contra el una orden de administración judicial, o si emprendiese una petición de declaración en quiebra, o si hiciese algún convenio con sus acreedores, o una cesión a favor de ellos, o si recibiese un mandamiento judicial sobre sus haberes, o si la Superintendencia manifestase por escrito al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** que en su opinión **EL CONTRATISTA** ahora abandonado las Obras, obra

dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) días, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito., c)No está ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o está constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las ordenes emitidas por la Supervisión., d)Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,. e)** Si **EL CONTRATISTA** cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores; f) Si se le asigna un administrador judicial a **EL CONTRATISTA** a causa de su insolvencia. g) Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato De igual modo, podrá procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este Contrato, que a juicio del **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** sean violadas por **EL CONTRATISTA**. En tal caso, el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS,** unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podrá rescindir este Contrato y procederá a evaluar los daños y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a **EL CONTRATISTA** ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTÍCULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO: Constituirá una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, las enunciadas a continuación: a) La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria.

ARTÍCULO 29.-RECEPCIÓN PROVISIONAL: EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS tomará posesión de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas de terminación y se haya expedido un certificado de recepción provisional. Tras la recepción provisional de las Obras, **EL CONTRATISTA** desmantelará y retirará las estructuras provisionales así como los materiales que ya no se utilicen para la ejecución del Contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos, y restablecerá toda modificación en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

ARTÍCULO 30.- CUBICACIÓN DE CIERRE: EL CONTRATISTA producirá una cubicación final o de cierre en los casos anticipados previstos en este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El Contrato. La Supervisión deberá validar la cubicación final dentro de **Sesenta Días** (60) días de recibida, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitará a **EL CONTRATISTA** que realice toda corrección o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicación final, no fuese satisfactoria, **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** deberá determinar el monto a pagar a **EL CONTRATISTA**.

ARTÍCULO 31.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Al expirar el periodo de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el Supervisor extenderá a **EL CONTRATISTA** un certificado de recepción definitiva y remitirá una copia del mismo al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS** con indicación de la fecha en que **EL CONTRATISTA** haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfacción del Supervisor. El Supervisor entregará el certificado de recepción definitiva a más tardar **indicar en letras y números el plazo** días, después de que expire el periodo arriba mencionado, o después de dicho periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfacción del Supervisor toda obra ordenada. Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**, con una copia para **EL CONTRATISTA**.

ARTÍCULO 32.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO: Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre **LAS PARTES**, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por el **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS**.

ARTÍCULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS: LAS PARTES se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al desarrollo del presente Contrato y su interpretación.

ARTÍCULO 34.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley

13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) *y de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).*

RMJ

ARTÍCULO 35.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 36.- IDIOMA OFICIAL: El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los terminos y condiciones del presente documento.

ARTÍCULO 37.- TITULOS: Los titulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado de este Contrato.

ARTÍCULO 38.- LEGISLACIÓN APLICABLE: EL CONTRATISTA realizará sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la República Dominicana.

ARTÍCULO 39.- ELECCIÓN DE DOMICILIO: Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, **LAS PARTES** eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente Contrato, su ejecución y terminación.

ARTÍCULO 40.- ACUERDO INTEGRO: El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre **LAS PARTES**; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una **de LAS PARTES**, y el otro para los fines correspondientes, En el Municipio de Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los Once (11) días del mes de Abril del año Dos Mil Veintidós (11/04/2022).-

Por el Ayuntamiento;-

CRISTIAN ENCARNACION
Contratante

ALCALDIA

Por el Contratista;

ING. RUDDY MATEO JIMENEZ
Contratista

YO, DR. BARTOLO A. LALANE DE LA CRUZ, Notario público de los del número para del Municipio Los Alcamzos, registrado en el Colegio Dominicano de Notarios con el número 7780, con estudio profesional abierto en esta ciudad. Certifico y doy fe que las firmas que aparecen en el presente documento fueron puestas, en mi presencia libre y voluntariamente por los señores: **CRISTIAN ENCARNACION y/o RUDDY MATEO JIMENEZ**, quienes me declararon bajo la fe del juramento que esas son las firmas que ellos acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas, tanto públicas como privadas. En el Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, a los Once (11) días del mes de Abril del año Dos Mil Veintidós (11/04/2022).-

DR. BARTOLO A. LALANE DE LA CRUZ
Notario Público

ING. RUDDY MATEO JIMENEZ

Calle José Reyes, residencial inespre Edificio 14, Apartamento 302, Hato Nuevo Mano guayabo, Municipio Santo Domingo Oeste. Telf. 829-315-6532, CED. 001-1082606-2. E-mail.ing.ruddymateo@gmail.com

Obra: Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, en el sector La Esmeralda. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

Sector: Esmeralda
Ubicación: Los Alcarrizos

PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
2.11	Demolición de aceras en la C/ Ambar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225.80*1.00)*2	451.60	m2	100.00	45,160.00	
2.12	Demolición de contenes en la C/ Ambar, desde la C/ San Marcos hasta la C/ La Pierdra (225,80)*2	451.60	ml	100.00	45,160.00	
2.13	Demolición de aceras en la C/ Cordalina, desde la C/ Ambar hasta el Final (71.40*1.00)*2	142.80	m2	100.00	14,280.00	
2.14	Demolición de contenes en la C/ Cordalina, desde la C/ Ambar hasta el Final (69.80)*2	142.80	ml	100.00	14,280.00	
2.15	Demolición de Baden en la C/ Jade esquina C/ cristal (7*2)	5.60	m3	1,250.00	7,000.00	
2.16	Demolición de Baden en la C/ Gema (4.2*2)	3.36	m3	1,250.00	4,200.00	
2.16	Demolición de Baden en la C/ Respaldo Jade esquina C/ Rubi (7.40*2)	5.92	m3	1,250.00	7,400.00	
2.17	Demolición de Baden C/ Cristal hasta esquina C/ Rubi (6.10*2)	4.88	m3	1,250.00	6,100.00	
2.18	Demolición de Baden en la C/ Cardalina (5.80*2)	4.64	m3	1,250.00	5,800.00	
2..19	Demolición de Baden en la C/ Larimar (4.50 *2)	3.60	m3	1,250.00	4,500.00	
2..2	Demolición de Baden en la C/ Ira (4.60*2)	3.68	m3	1,250.00	4,600.00	
2.21	Demolición de Baden en la C/ Estancia proximo C/ San Marcos (7.5*2)	6.00	m3	1,250.00	7,500.00	**405,300.00**
III-	**RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION**					
3.01	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Pierdra (217.10*1.00*0.10)*2	43.42	m3	550.00	23,881.00	

ING. RUDDY MATEO JIMENEZ

Calle José Reyes, residencial Inespre Edificio 14, Apartamento 302, Hato Nuevo Mano guayabo, Municipio Santo Domingo Oeste. Telf. 829-315-6532. CED. 001-1082606-2. E-mail.ing.ruddymateo@gmail.com

Obra: Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, en el sector La Esmeralda. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

Sector: Esmeralda
Ubicación: Los Alcamzos

PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
I	**PRELIMINARES**					
1.01	Vallas Informativa de la obra	1.00	Ud.	15,000.00	15,000.00	**15,000.00**
II	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
2.01	Demolición de aceras en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Piedra (217.10*1.00)*2	434.20	m2	100.00	43,420.00	
2.02	Demolicion de contenes en la C/ Jade, desde la C/ San Marcos hasta antigua C/ Piedra (217.10)*2	434.20	ml	100.00	43,420.00	
2.03	Demolicion de aceras en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/Piedra (84.70 *1.00)*2	169.40	m2	100.00	16,940.00	
2.04	Demolición de contenes en la C/ Topacio, desde la C/ Jade hasta antigua C/ Piedra (80.70)*2	169.40	ml	100.00	16,940.00	
2.05	Demolición de aceras en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubi (56.9*1.00)*2	113.80	m2	100.00	11,380.00	
2.06	Demolición de contenes en la C/ Gema, desde la C/ Jade hasta C/ Rubi (56.9)*2	113.80	ml	100.00	11,380.00	
2.07	Demolición de aceras en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubi (56.90*1.00)*2	113.80	m2	100.00	11,380.00	
2.08	Demolicion de contenes en la C/ Respaldo Jade, desde la C/ Jade hasta la C/ Rubi (56.90)*2	113.80	ml	100.00	11,380.00	
2.09	Demolición de aceras en la C/ Cristal, desde la C/ Rubi hasta esquina Estancia (182.70*1.00)*2	365.40	m2	100.00	36,540.00	
2.10	Demolicion de contenes en la C/ Cristal, desde la C/ Rubi hasta esquina Estancia (217.10)*2	365.40	ml	100.00	36,540.00	

ING. RUDDY MATEO JIMENEZ

Calle José Reyes, residencial inespre Edificio 14, Apartamento 302, Hato Nuevo Mano guayabo, Municipio Santo Domingo Oeste. Telf. 829-315-6532, CED. 001-1082606-2. E-mail.ing.ruddymateo@gmail.com

Obra: Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ Jade, C/ Topacio, C/ Gema, C/ Respaldo, C/ Cristal, C/ Ambar, C/ Cordalina, en el sector La Esmeralda. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

Sector: Valle Encantado
Ubicación: Los Alcarrizos

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U.	ITBIS	P.U.+ITBIS	SUB-TOTAL	TOTAL
5-	**Badenes con @ de 3/8 a 0.20 mts. (7.80 x 2.00 x 0.60) m**							
a-	Hormigón 180 kg/cm2 (1:2:4)	3.12	m3	5,845.76	1,052.24	6,898.00	21,521.76	
b-	Hormigon Ciclopeo e=0.40 m	8.00	m3	1,826.97	328.86	2,155.83	17,246.64	
c-	Varrillas	2.11	qq	2,966.10	533.90	3,500.00	7,369.60	
d-	Alambre	4.21	lb	47.46	8.54	56.00	235.83	
e-	Mortero 1:4 + 5% desp.	0.02	m³	6,650.25	1,197.05	7,847.30	156.95	
f-	Elaboracion y frotado	20.00	m²	350.00		450.00	9,000.00	**55,530.77**
							Costo/m2	**3,559.66**

Preparado Por:

ING. RUDDY MATEO JIMENEZ
Codia 20925

25 de marzo del 2022
