LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA –

Santo Domingo, D.N.
08 de abril de 2024

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de Avance de ejecución de obra del Remozamiento de un Cementerio en el D.M El Limón Villa González.**

Tengo a bien dirigirme a usted con atención al informe presentado por el supervisor asignado al Remozamiento de un cementerio en el D.M. El Limón de Villa González, Luego de haber revisado cada detalle del mismo validamos que esta se encuentra en un avance del 52% Aproximadamente.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales

Miércoles, 20 de marzo de 2024

INFORME DE OBRA

1. LOCALIZACIÓN

Provincia	Santiago
Municipio	Villa González
Distrito Municipal	El Limón
Barrio y/o sector	Centro de la ciudad

2. PROYECTO

REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO LLAMADO CAMINO AL CIELO

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

LATITUD

19.596461

LONGITUD

70.823020

4. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el remozamiento del cementerio Llamado Camino Al Cielo En El Distrito Municipal El Limón, De Municipio Villa González, Provincia Santiago. El Mismo consiste en materializar las Siguientes actividades:

Construcción de Cuarenta (40) nichos, construcción de fosa común con dimensiones de (2.5 mt de ancho x 2.5 mt de largo por 2 mt de profundidad)

Demolición y reconstrucción de quiosco en concreto. Corte de talud H= 1.50m. construcción de 40 mt lineales de pared frontal, con separación entre columna de 3 mt de distancia. Nota: la pared se construirá con una zapata de muro de gravedad armado para evitar derrumbe de la pared. Construcción de 40 mts lineales de encache para proteger la pared perimetral puesto que está en un área montañosa. También incluye pañete y pintura de los muros.

Construcción de 11 parqueos y Pisos HA E=0.20m malla electrosoldada. D2.3 10x10 pulido con helicoptero-hormigón 210kg/cm2. (área de parqueo)

Reconstrucción de la entrada (En Acera frotada y violinada E=0.10m - 1:2:4 con ligadora)

5. CONDICIONES DEL TERRENO

El terreno es de relieve irregular, con taludes no perfilados, por lo que se implementó el corte y tala de árboles y maleza para la limpieza del terreno y se procedió a perfilar el mismo.

6. INFORME DE AVANCE

El avance se estima en un 52% de su ejecución.

	Reporte De Avance De Proyectos En Ejecución (REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO LLAMADO CAMINO AL CIELO)
	Actividades
1	**PRELIMINARES - ÁREA GENERAL**
2	Letrero En Obra
3	Remoción Empalizada
4	Demoliciones
5	Carga Y Bote Bote De Material
6	**CONSTRUCCION DE 11 PARQUEOS**
7	Movimiento De Tierra
8	Relleno De Nivelación Para Ampliación De Área General E=0.10m
9	Relleno En Acera E=0.10m (Pasarelas Internas)
10	Hormigón Armado
11	Pintura
12	**CONSTRUCCION DE ACERAS**
13	Hormigón Simple En Acera Frotada Y Violinada E=0.10m - 1:2:4 Con Ligadora
14	**PRELIMINARES - CONSTRUCCIÓN DE NICHOS (40 UNDS)**
15	Movimiento De Tierra De Los Nichos
16	Hormigón Armado De Los Nichos
17	Muros De Bloques De Los Nichos
18	Terminación De Superficie De Los Nichos
19	Pintura De Los Nichos
20	**HERRERÍA**
21	Puertas De Acceso (2 UNDS)
22	Baranda En Rampa De Acceso
23	**PISO**
24	Porcelanato De Exterior (0.40x0.40m)
25	Adoquín Gris En Rampa De Acceso
26	**JARDINERIA**
27	Jardineria En General
28	**PRELIMINARES - CONSTRUCCION DE FOSA COMUN**
29	Movimiento De Tierra
30	Hormigón Armado
31	Muros De Bloques
32	Terminación De Superficie
33	**PRELIMINAR - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL**
34	Movimiento De Tierra
35	Hormigón Armado
36	Muros De Bloques
37	Terminación De Superficies
38	Pintura

Reporte De Avance De Proyectos En Ejecución (Remozamiento Del Cementerio Llamado Camino Al Cielo)			
Actividades	% Pres	Avance % Pres	Status
PRELIMINARES - ÁREA GENERAL			
Letrero En Obra	1.0%	1.0%	
Remoción Empalizada	0.5%	0.5%	
Demoliciones	1.5%	1.5%	
Carga Y Bote Bote De Material	2.0%	2.0%	
CONSTRUCCION DE 11 PARQUEOS			
Movimiento De Tierra	3.0%	3.0%	
Relleno De Nivelación Para Ampliación De Área General E=0.10m	1.0%	1.0%	
Relleno En Acera E=0.10m (Pasarelas Internas)	3.0%	3.0%	
Hormigón Armado	6.0%		
Pintura	1.0%		
CONSTRUCCION DE ACERAS			
Hormigón Simple En Acera Frotada Y Violinada E=0.10m - 1:2:4 Con Ligadora	15.0%	5.0%	en ejecución
PRELIMINARES - CONSTRUCCIÓN DE NICHOS (40 UNDS)			
Movimiento De Tierra De Los Nichos	0.1%	0.1%	
Hormigón Armado De Los Nichos	9.0%	9.0%	
Muros De Bloques De Los Nichos	4.4%	4.4%	
Terminación De Superficie De Los Nichos	5.5%	5.5%	
Pintura De Los Nichos	1.0%		
HERRERÍA			
Puertas De Acceso (2 UNDS)	4.5%	3.0%	ejecución
Baranda En Rampa De Acceso	2.5%	1.0%	ejecución
PISO			
Porcelanato De Exterior (0.40x0.40m)	2.5%		
Adoquín Gris En Rampa De Acceso	2.5%		
JARDINERIA			
Jardineria En General	8.0%		
PRELIMINARES - CONSTRUCCION DE FOSA COMUN			
Movimiento De Tierra	1.0%	1.0%	
Hormigón Armado	3.0%	2.0%	ejecución
Muros De Bloques	1.0%	1.0%	
Terminación De Superficie	1.0%	1.0%	
PRELIMINAR - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL			
Movimiento De Tierra	2.6%	2.6%	
Hormigón Armado	8.0%		
Muros De Bloques	6.0%	4.0%	ejecución
Terminación De Superficies	2.0%		
Pintura	1.4%		
	100.0%	**51.58%**	

7. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

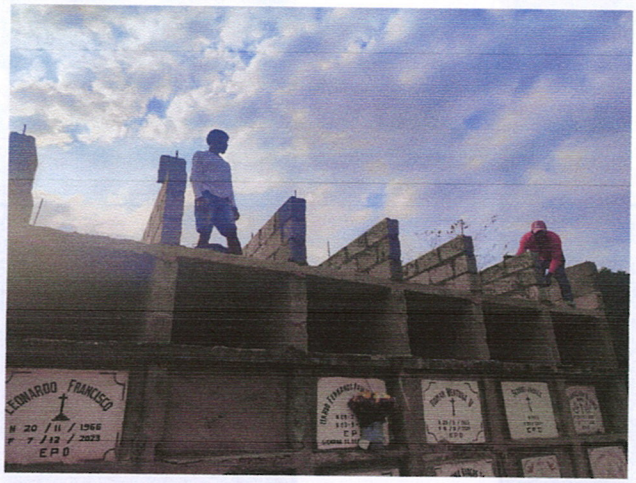

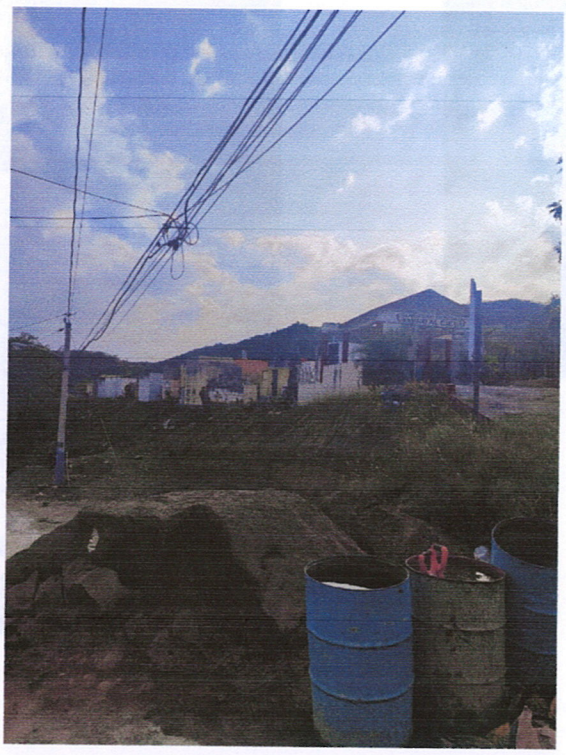

7. OBSERVACIONES

8. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:

Ayuntamiento Distrito Municipal El Limón
GESTION 2020-2024
SINDICATURA
RNC: 430057592
Villa González, R. D.

ANTHONY ISIDRO ALMONTE LÓPEZ
Codia: 43217
Cedula: 094-0023263-4
SUPERVISOR

JOSÉ LUIS SANTOS JIMÉNEZ
ALCALDE
