LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA

Santo Domingo, D.N.
01 de diciembre de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de Avance de Sabana Iglesia.**

En la visita técnica realizada el 13 de enero de 2023 se validó la ejecución de 994.40 metros cuadrados de aceras y 1,177.60 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del "Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales".

La supervisión externa ha validado la ejecución de 234.2 metros cuadrados de aceras y 234.2 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1,228.6 metros cuadrados de aceras y 1,411.8 metros lineales de contenes, lo que corresponde al 88 % de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales

CONTRALORIA 26 ENE 2024

LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 250901
REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: SANTIAGO
MUNICIPIO: SABANA IGLESIA
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de enero de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Edward Acosta

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	El Flaire, C/Rancho Don Elias	38.00	0.80	1	38.00	1	30.4	38
TRAMO B	El Flaire, C/Central	146.00	0.81	1	136.30	1	118.26	136.3
TRAMO C	El Flaire, C/Central	40.00	0.80	1	57.00	1	32	57
TRAMO D	El Flaire, C/Central	90.10	0.84	1	90.10	1	75.684	90.1
TRAMO E	Monte la zanja Arriba, C/Principal	68.80	1.00	1			68.8	
TRAMO F	MONTE LA ZANJA ARRIBA, C/PRINCIPAL	431.80	1.00	1	431.8	1	431.8	431.8
TRAMO G	Joya Rincón, C/Principal	91.90	1.09	1	118.3	1	100.171	118.3
TRAMO H	Zalaya, Callejo Don José				167.3	1		167.3
TRAMO I	Zalaya, Av. Principal	104.00	1.32	1	138.8	1	137.28	138.8
TRAMO J								
Total							**994.40**	**1177.60**

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado	RD$	4,054,219.90	
Monto desembolsado	RD$	4,054,219.90	(100%)
Avance de obra	103.79%		

CONTRALORÍA
26 ENE 2023
Unidad [illegible] Interna

Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686

LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: SANTIAGO
MUNICIPIO: SABANA IGLESIA
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de enero de 2023

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 994.40 metros cuadrados de aceras y 1,177.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. La calidad de las aceras y contenes construidos cumplen con las normas constructivas para este tipo de obras.

CONTRALORÍA 26 ENE 2023

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—





Suministra los datos de este reporte,

ING. EDWARD ACOSTA
Técnico

Técnico

CONTRALORIA
26 ENE

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:	SANTIAGO
MUNICIPIO:	SABANA IGLECIA
DISTRITO MUNICIPAL:	SABANA IGLECIA
BARRIO Y/O SECTOR:	

MALECON SABANA IGLECIA



2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local ☐
b. Contratista ☐

Razón Social	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLECIA
RNC ó Cédula:	430008435

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes:
b. Incluye demoliciones de tramos:

c. Incluye badenes:
d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A Lado Izquierdo	CALLE PRICIPAL MALECON DE SABANA IGLESIA	19°19'23.45"N	70°45'7.70"O	19°19'26.96"N	70°45'0.74"O	234.2	1.00	234.2	**234.2**	**234.**

AYUNTAMIENTO DE SABANA IGLESIA
ALCALDÍA
Fundado 1990
CONTRALORÍA
26 ENE 2021

SERVACIONES Y RECOMENDACIONES

234.2 m2 de Aceras y 234.2 m de Contenes

5- FOTOGRAFÍAS DE LA CALLE A INTERVENIR

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:	YABERLIN VENTURA TORIBIO
CÉDULA:	094-0024487-8
CODIA:	40742
FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Valida y aprueba los datos suministrados,

CONTRALORÍA 26 ENE


AYUNTAMIENTO DE SABANA IGLESIA
Fundado 1990
ALCALDÍA

Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



CONTRALORIA
26 ENE 2024

AYUNTAMIENTO DE SABANA IGLESIA * ALCALDÍA * Fundado 1990

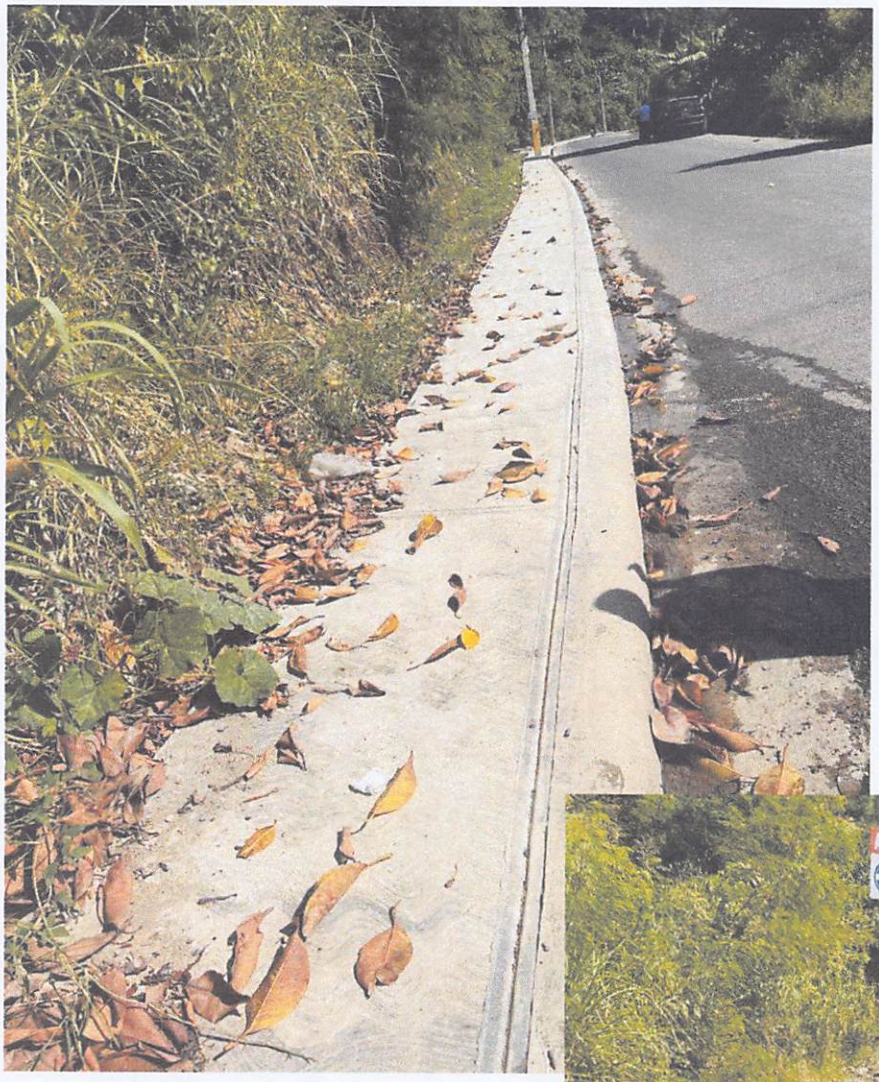


MALECON DE SABANA IGLESIA




AYUNTAMIENTO DE SABANA IGLESIA
Fundado 1990
ALCALDÍA

CONTRALORIA
26 ENE 20


MALECON DE SABANA IGLESIA

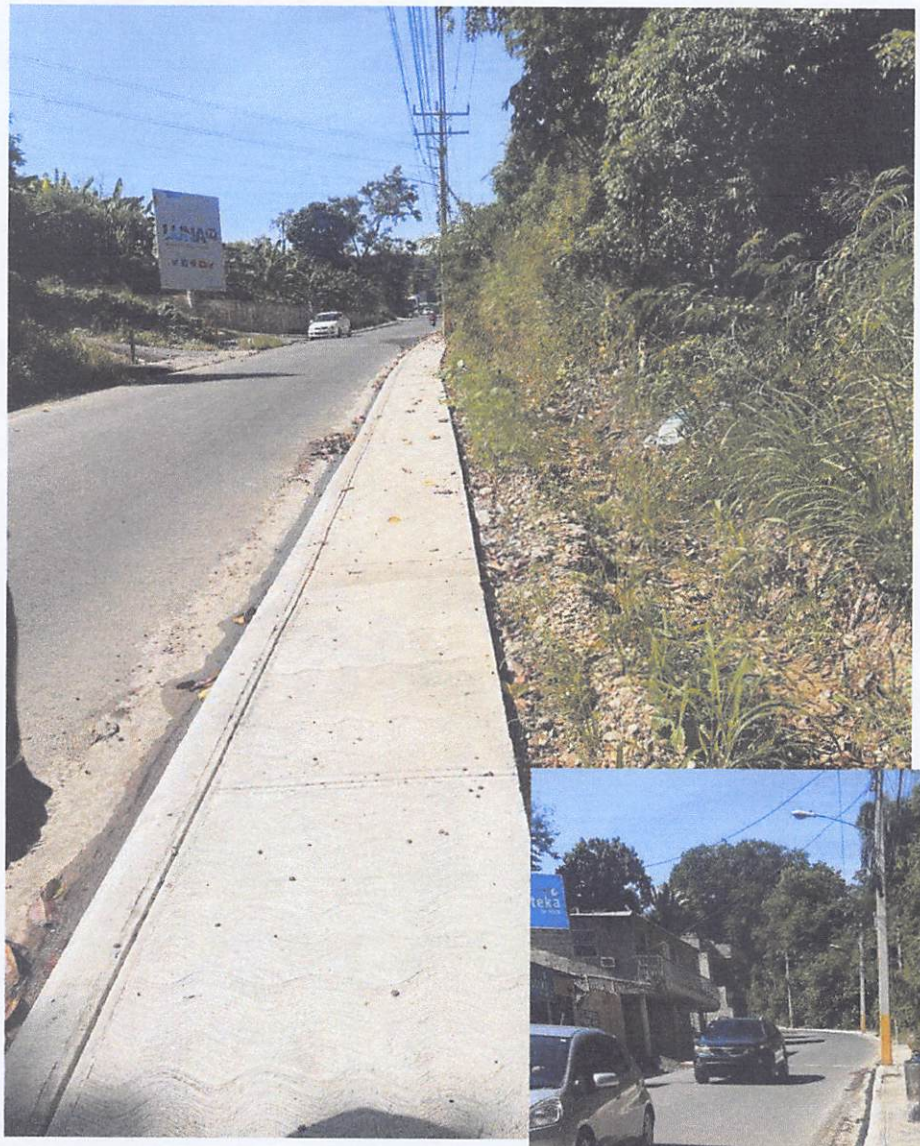

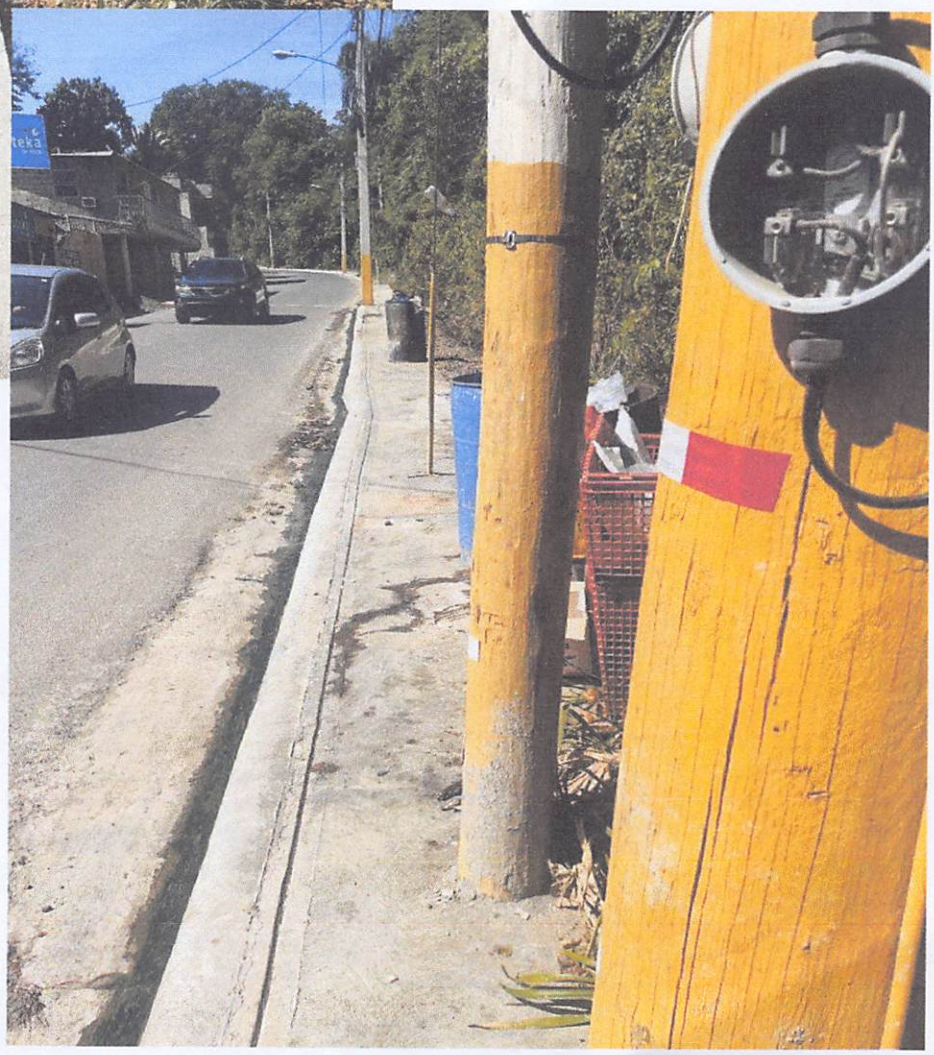

CONTRALORIA
26 ENE 2021

AYUNTAMIENTO DE SABANA IGLESIA
Fundado 1990
ALCALDÍA

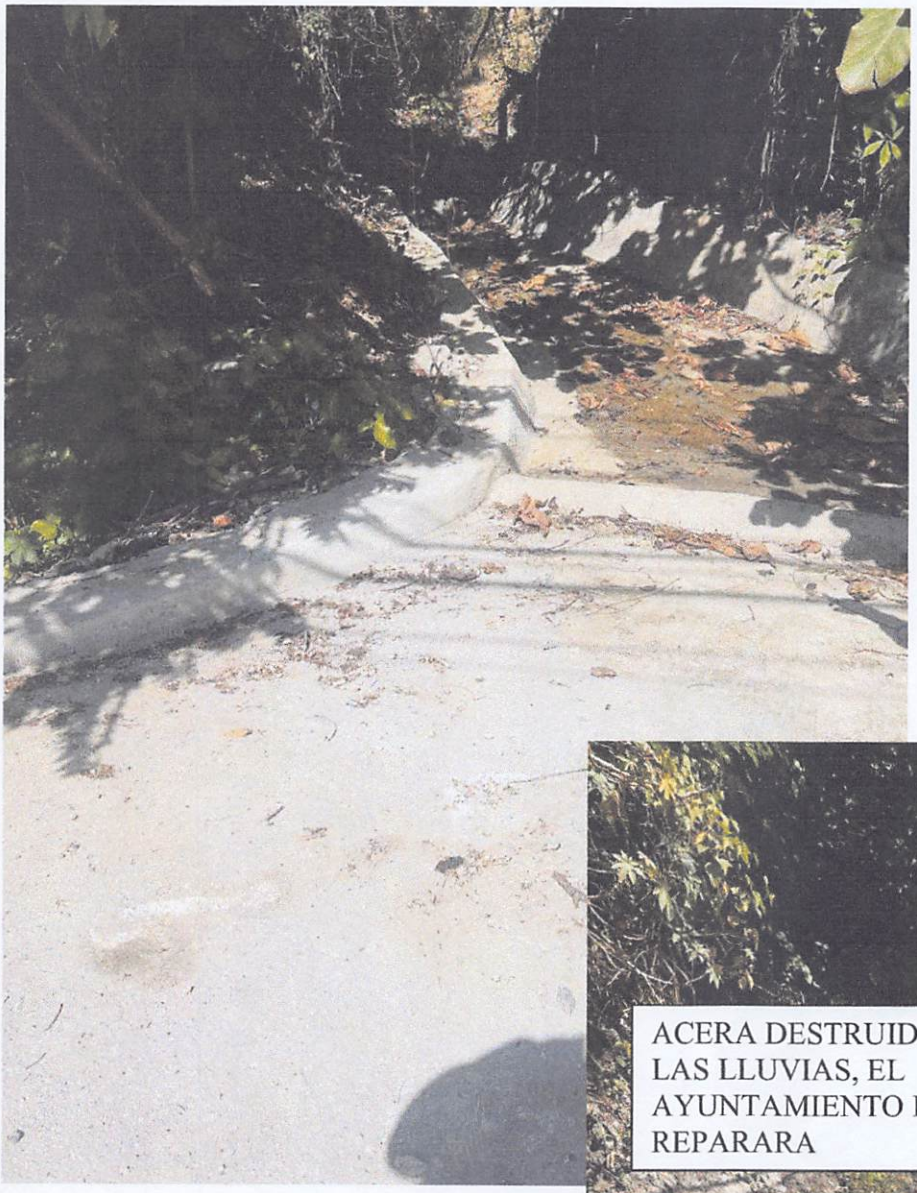


MALECON DE SABANA IGLESIA

CONTRALORÍA 26 ENE 2021



ACERA DESTRUIDA POR EL LAS LLUVIAS, EL AYUNTAMIENTO LA REPARARA

AYUNTAMIENTO DE SABANA IGLESIA * Fundado 1990 * ALCALDÍA

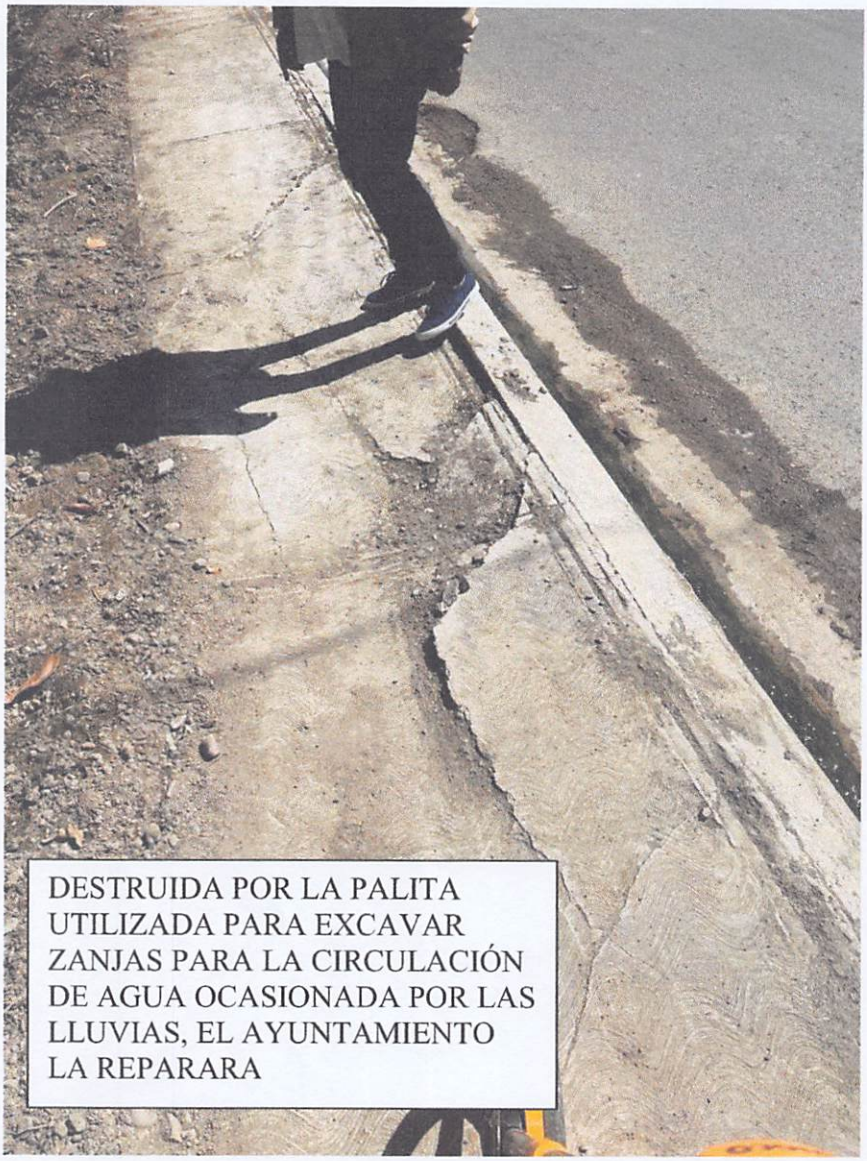

DESTRUIDA POR LA PALITA UTILIZADA PARA EXCAVAR ZANJAS PARA LA CIRCULACIÓN DE AGUA OCASIONADA POR LAS LLUVIAS, EL AYUNTAMIENTO LA REPARARA

MALECON DE SABANA IGLESIA

CONTRALORIA
26 ENE 2021
AYUNTAMIENTO DE SABANA IGLESIA
Fundado 1990
ALCALDÍA
