LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA

# PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 25-26

## INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACERAS Y CONTENES

## CIERRE DE PROYECTO

Fecha de visita técnica: 6 de agosto de 2026

### 1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

**Región:** ENRIQUILLO
**Provincia:** BAHORUCO
**Municipio:** GALVÁN
**Distrito Municipal:** -
**Barrio y/o Sector:** GALVÁN, CABEZA DE AGUA Y SECTOR BUENOS AIRES

### 2. CONTRATISTA DE LA OBRA

**Nombre/Razón Social:** CONSTRUCCCIÓNES SILFA LUCIANO SRL,

**RNC o Cédula:** 132426462


### 3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

a. Construcción de aceras ☑
b. Construcción de contenes ☑
c. Reconstrucción de aceras ☐
d. Reconstrucción de contenes ☐
e. Construcción de obra conexa ☐ Especificar: _____
f. Reconstrucción de obra conexa ☐ Especificar: _____
g. Elementos de accesibilidad ☐ Especificar: _____
h. Arborización ☐

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Galván

Nombre de Calle: 13 de marzo y paseo de los profesores

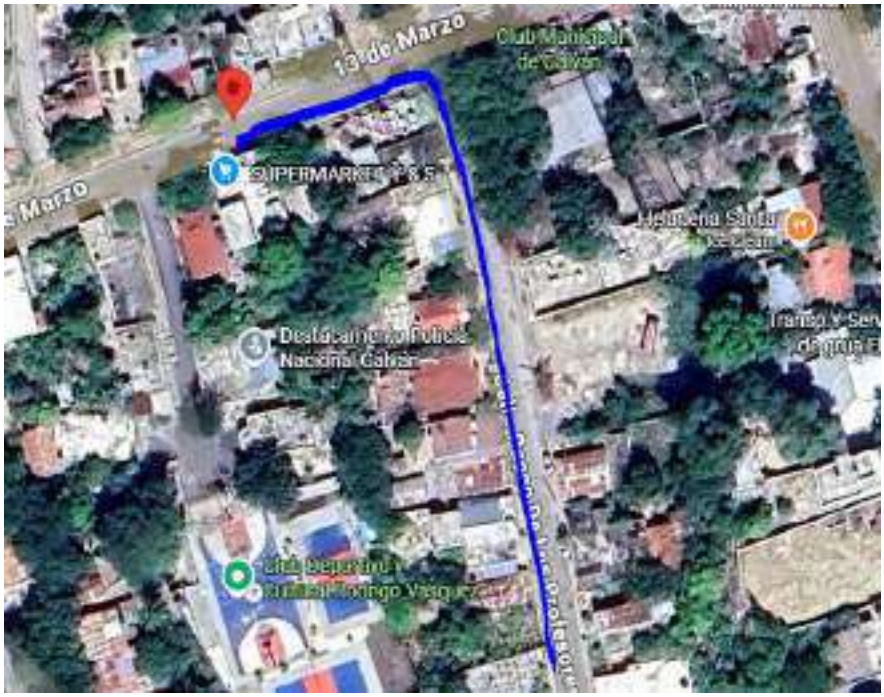



inicio
18.50342
-71.341

final
18.50226
-71.34017

Galván

Nombre de Calle: nuestra señora de Fatima

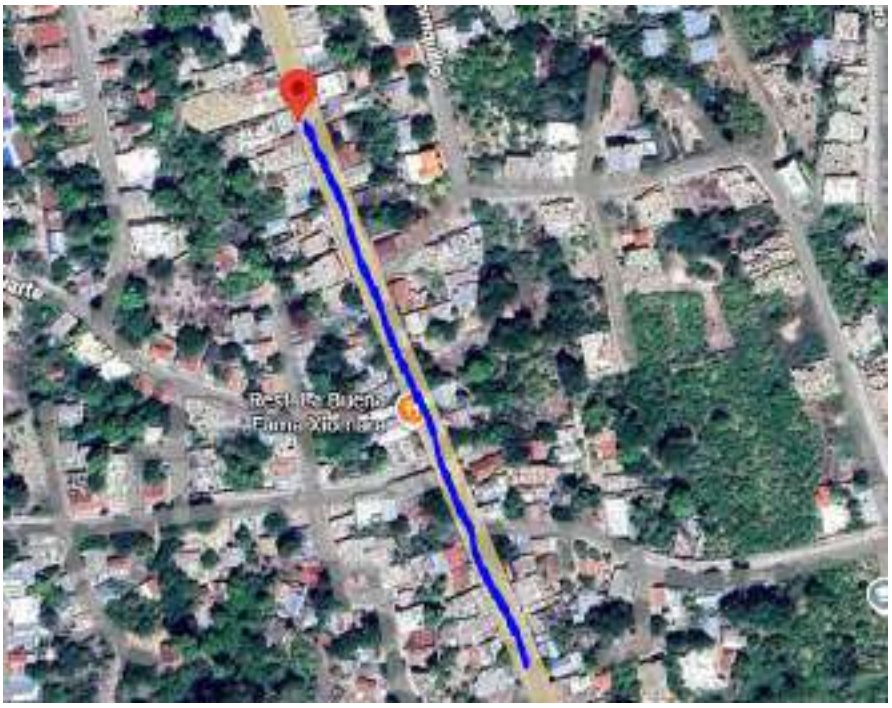

inicio
18.50262
-71.33951

final
18.50034
-71.33772

Cabeza de agua

Nombre de Calle: s/n



inicio
18.496873
-71.33672

final
18.496868
-71.33639

Buenos Aires

Nombre de Calle: 3



inicio
18.50559
-71.34173

final
18.506654
-71.34175

## 5. LEVANTAMIENTO

| | | INICIO | | FINAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMOS | BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE | LATITUD | LONGITUD | LATITUD | LONGITUD | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE LA ACERA (m) | TOTAL DE ACERAS ($m^2$) | TOTAL DE CONTENES (m) |
| Tramo A | Sector Galván / Calle 13 de marzo y Paseo de los profesores | 18.503420 | -71.341000 | 18.502260 | -71.340170 | 310.10 | 1.19 | 369.02 | 325.30 |
| Tramo B | Sector Galván/ Calle nuestra señora de Fatima | 18.502620 | -71.339510 | 18.500340 | -71.337720 | 346.10 | 1.38 | 477.62 | 346.10 |
| Tramo C | Sector Cabeza de agua/ Calle A | 18.496873 | -71.336720 | 18.496868 | -71.336394 | 188.60 | 1.11 | 209.69 | 228.80 |
| Tramo D | Sector Buenos Aires/ Calle 3 | 18.505590 | -71.341730 | 18.506654 | -71.341747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.70 |
| Tramo E | | | | | | | | 0.00 | |
| Tramo F | | | | | | | | 0.00 | |
| Total | | | | | | | | 1,056.33 | 1,450.90 |

Nota: Los tramos indicados como ***ambos lados*** tienen la volumetria de ambos lados de las aceras y/o contenes.

Ejecución fisica de obra 122.8% (estimado en base a las cantidades aceras y contenes, no incluye obras conexas ni partidas de terracería)

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Documento faltante : carta de inicio de la obra.

Las aceras y contenes ejecutados cumplen con la terminación requerida, evidenciando una adecuada calidad en su ejecución.

CIERRE FISICO DE OBRA:
La obra presenta un 122.8%, correspondiente a la ejecución fisica:

Aceras: 1,056.33 $m^2$ ejecutados.

Contenes: 1,450.90 ml ejecutados.

## 6. FOTOGRAFIAS DE LAS CALLES INTERVENIDAS

Galván

Nombre de Calle: 13 de marzo y paseo de los profesores



Nombre de Calle: 13 de marzo



Nombre de Calle: paseo de los profesores



Nombre de Calle: paseo de los profesores





Nombre de Calle: nuestra señora de Fatima



Nombre de Calle: nuestra señora de Fatima





Buenos Aires

Nombre de Calle: 3



Buenos Aires

Nombre de Calle: 3





Buenos Aires

Nombre de Calle: Jose Santana



Las informaciones y otros insumos para la elaboración de este informe han sido suministrados por el gobierno local, en calidad de entidad ejecutora de los fondos transferidos desde el Ministerio de Hacienda y Economía para la ejecución de los proyectos de aceras y contenes, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26. El presente informe ha sido elaborado a requerimiento de Liga Municipal Dominicana, en calidad de entidad supervisora, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26.

Por la Liga Municipal Dominicana

Supervisor responsable del proyecto: RICHARD ENRIQUE CABRERA CLARA

CODIA: 28893

Firma y sello: 
