LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA

PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 25-26

INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACERAS Y CONTENES

CIERRE DE PROYECTO

Fecha de visita técnica: 3 de noviembre de 2026

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: CIBAO NORDESTE
Provincia: DUARTE
Municipio: SAN FRANCISCO DE MACORÍS
Distrito Municipal: JAYA
Barrio y/o Sector: EL RINCÓN

2. CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre/Razón Social: Grocio Jose Mercedes Aquino

RNC o Cédula: 056-0060666-8


3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

a. Construcción de aceras ☐
b. Construcción de contenes ☑
c. Reconstrucción de aceras ☐
d. Reconstrucción de contenes ☐
e. Construcción de obra conexa ☐ Especificar: _____
f. Reconstrucción de obra conexa ☐ Especificar: _____
g. Elementos de accesibilidad ☐ Especificar: _____
h. Arborización ☐

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Rincón


Nombre de Calle: s/n

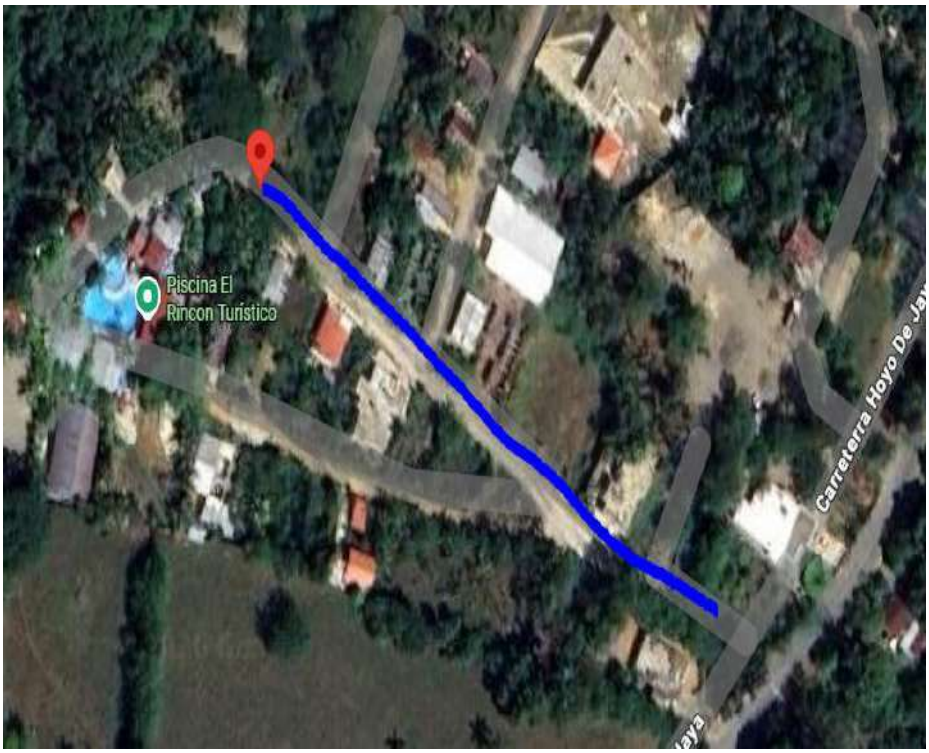

inicio
19.32559
-70.24441

final
19.32637
-70.24573


Nombre de Calle: Principal

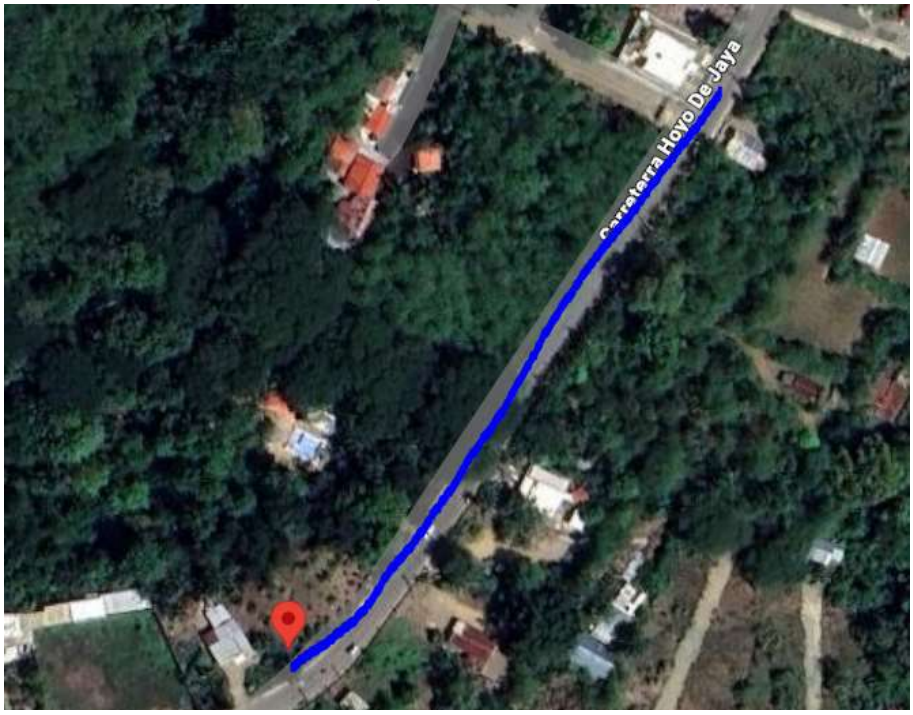

inicio
19.32207
-70.24666

final
19.32049
-70.24778

Nombre de Calle: s/n

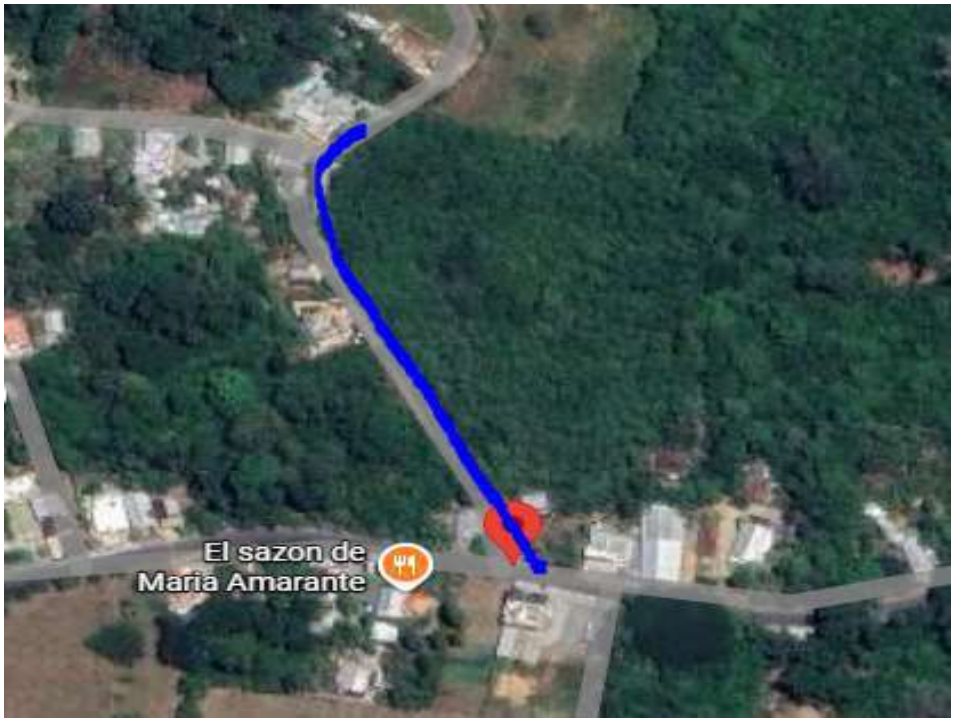

inicio
19.34132
-70.22045

final
19.34337
-70.22105

5. LEVANTAMIENTO

		INICIO		FINAL					
TRAMOS	BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE	LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (m^2)	TOTAL DE CONTENES (m)
Tramo A	Sector El Rincón / Calle A (ambos lados)	19.325590	-70.244410	19.326370	-70.245730			0.00	713.80
Tramo B	Sector X / Calle PRINCIPAL	19.322070	-70.246660	19.320490	-70.247780			0.00	429.80
Tramo C	Sector X / Calle A	19.341320	-70.220450	19.343370	-70.221050			0.00	845.00
Tramo D								0.00	
Tramo E								0.00	
Total								**0.00**	**1,988.60**

Nota: Los tramos indicados como ***ambos lados*** tienen la volumetria de ambos lados de las aceras y/o contenes.

Ejecución fisica de obra 98.3% (estimado en base a las cantidades aceras y contenes, no incluye obras conexas ni partidas de terracería)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Los contenes ejecutados, cumplen con la terminación requerida.

CIERRE FISICO DE OBRA:
La obra presenta un 98.3 %, correspondiente a la ejecución fisica:

Contenes: 1,988.60 ml ejecutados.

No costruyeron acera aunque estaba en el presupuesto de ejecución, por lo que se recomienda realizar la respectiva orden de cambio que sustente y justifique administrativamente y el cierre financiero la obra.

6. FOTOGRAFIAS DE LAS CALLES INTERVENIDAS

El Rincón

Nombre de Calle: s/n



Nombre de Calle: s/n



Nombre de Calle: s/n



Nombre de Calle: s/n





Nombre de Calle: s/n



Las informaciones y otros insumos para la elaboración de este informe han sido suministrados por el gobierno local, en calidad de entidad ejecutora de los fondos transferidos desde el Ministerio de Hacienda y Economía para la ejecución de los proyectos de aceras y contenes, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26. El presente informe ha sido elaborado a requerimiento de Liga Municipal Dominicana, en calidad de entidad supervisora, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26.

Por la Liga Municipal Dominicana

Supervisor responsable del proyecto: RICHARD ENRIQUE CABRERA CLARA

CODIA: 28893



Firma y sello: _____
