LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA

PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 25-26

INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACERAS Y CONTENES

CIERRE DE PROYECTO

Fecha de visita técnica: 11 de noviembre de 2026

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: CIBAO NOROESTE
Provincia: DAJABÓN
Municipio: LOMA DE CABRERA
Distrito Municipal: -
Barrio y/o Sector: PALO COLORADO

2. CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre/Razón Social: INGENIERIA GDC S.R.L.

RNC o Cédula: 133042673


3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

a. Construcción de aceras	☐		
b. Construcción de contenes	☑		
c. Reconstrucción de aceras	☐		
d. Reconstrucción de contenes	☐		
e. Construcción de obra conexa	☐	Especificar:	Puente en alcantarilla tubular /canaleta
f. Reconstrucción de obra conexa	☐	Especificar:	
g. Elementos de accesibilidad	☐	Especificar:	
h. Arborización	☐		

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Palo Colorado

Nombre de Calle: s/n

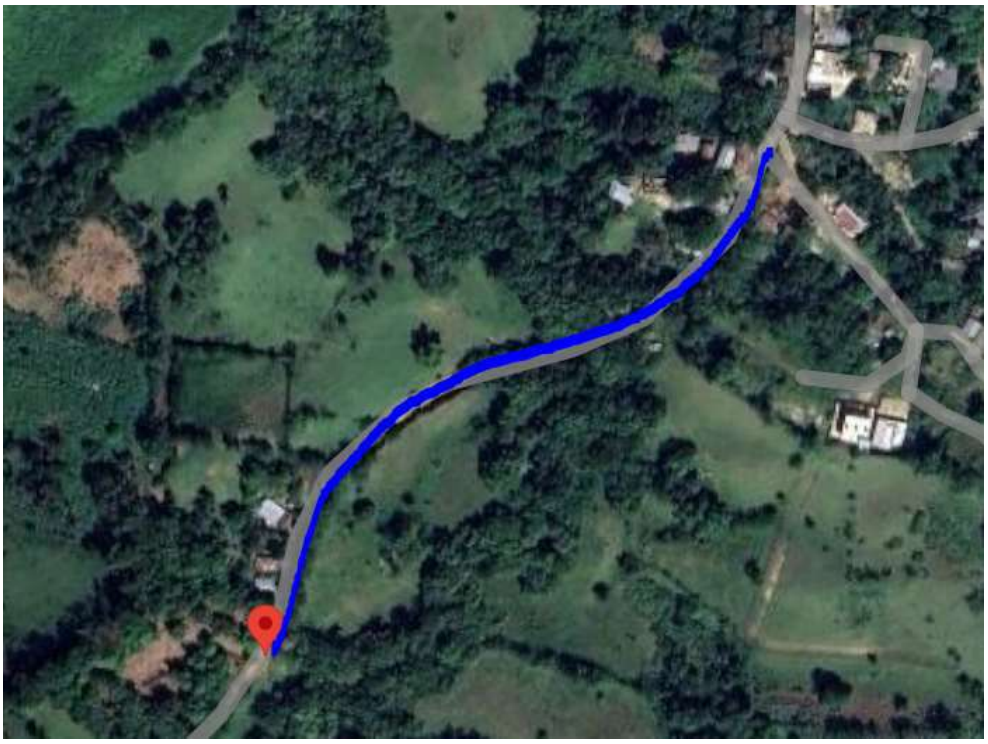

inicio
19.41643
-71.61674

final
19.41430
-71.61897

5. LEVANTAMIENTO

		INICIO		FINAL					
TRAMOS	BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE	LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (m^2)	TOTAL DE CONTENES (m)
Tramo A	Sector palo colorado / Calle A (ambos lados)	19.416430	-71.616740	19.414300	-71.618970			0.00	651.20
Tramo B	Sector X / Calle A							0.00	
Tramo C								0.00	
Tramo D								0.00	
Total								**0.00**	**651.20**

Nota: Los tramos indicados como ***ambos lados*** tienen la volumetria de ambos lados de las aceras y/o contenes.
Ejecución fisica de obra 108.5% (estimado en base a las cantidades aceras y contenes, no incluye obras conexas ni partidas de terracería)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Cierre de Obra:
Los contenes fueron ejecutandos conforme a las especificaciones técnicas y a la ficha de referencia constructiva establecida. La obra presenta un cierre físico aproximado del 108.5%

observación: este proyecto fue objeto de orden de cambio debido a que parte de los fondos fueron utilizado para la construcción de un puerten en alcantarilla tubular y no ejecutaron toda la volumetria de conten proyectadas en el primer presupuesto contratado.
El contrato pesenta un error en el monto, al tener diferentes montos en la cantidad estipulada en letras y la cantidad estipulada en numeros, representando una diferencia de 4,000 pesos entre ambos cantidades. De acuerdo al presupuesto rpesentado el monto es de 3,999,561.14. Por lo que la cantidad real deberia ser la colocada en letras. Al mismo tiempo notamos que el valor del incial calculado se realizo en base al monto incorrecto.

6. FOTOGRAFIAS DE LAS CALLES INTERVENIDAS

Palo Colorado

Nombre de Calle: s/n



Nombre de Calle: s/n





Nombre de Calle: s/n



Nombre de Calle: s/n





Las informaciones y otros insumos para la elaboración de este informe han sido suministrados por el gobierno local, en calidad de entidad ejecutora de los fondos transferidos desde el Ministerio de Hacienda y Economía para la ejecución de los proyectos de aceras y contenes, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26. El presente informe ha sido elaborado a requerimiento de Liga Municipal Dominicana, en calidad de entidad supervisora, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26.

Por la Liga Municipal Dominicana

Supervisor responsable del proyecto: RICHARD ENRIQUE CABRERA CLARA

CODIA: 28893



Firma y sello: _____
