LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA

PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 25-26

INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACERAS Y CONTENES

CIERRE DE PROYECTO

Fecha de visita técnica: 29 de septiembre de 2026

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: EL VALLE
Provincia: ELÍAS PIÑA
Municipio: PEDRO SANTANA
Distrito Municipal: RÍO LIMPIO
Barrio y/o Sector: ENTRADA DEL DISTRITO MUNICIPAL (CERRO PINO)

2. CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre/Razón Social: ARVANIN INGENIERIA & ARQUITECTOS,SRL

RNC o Cédula: 132-61320-1

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

a. Construcción de aceras ☑
b. Construcción de contenes ☑
c. Reconstrucción de aceras ☐
d. Reconstrucción de contenes ☐
e. Construcción de obra conexa ☑ Especificar: Muro de contencion en saco
f. Reconstrucción de obra conexa ☐ Especificar:
g. Elementos de accesibilidad ☐ Especificar:
h. Arborización ☐

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

ENTRA AL DISTRICTO MUNICIPAL (CERRO PINO)

Nombre de Calle: Principal



5. LEVANTAMIENTO

		INICIO		FINAL					
TRAMOS	BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE	LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (m^2)	TOTAL DE CONTENES (m)
Tramo A	Entrada del Distrito Municipal (Cerro Pino) / Calle Principal (ambos lados)					1,064.30	1.00	1,064.30	1,064.30
Total								**1,064.30**	**1,064.30**

Nota: Los tramos indicados como ***ambos lados*** tienen la volumetria de ambos lados de las aceras y/o contenes.

Ejecución fisica de obra 101.4% (estimado en base a las cantidades aceras y contenes, no incluye obras conexas ni partidas de terracería)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En fecha 29 de septiembre de 2026, se realizó la inspección de campo correspondiente a los trabajos de Construcción de Aceras y Contenes del Distrito Municipal de Río Limpio, provincia Elías Piña, con el propósito de verificar las condiciones físicas y las cantidades ejecutadas, tomando como referencia la documentación contractual y la Cubicación No. 4.

Durante el levantamiento se verificó la ejecución de aproximadamente 1,064.30 ML de contenes y 1,064.30 M^2 de aceras. Las cantidades verificadas presentan una variación mínima de aproximadamente 1.36% respecto a las cantidades originalmente planificadas, diferencia que, por su reducida magnitud, no representa una incidencia significativa para la parte contratante.

Asimismo, durante la inspección se pudo verificar la realización del muro de contención en saco, correspondiente a una cantidad de 72.00 M^3, el cual se encuentra contemplado tanto en el presupuesto como en la Cubicación No. 4.

En cuanto a la revisión económica, se verificó que el total de la documentación presupuestaria y de la Cubicación No. 4 asciende a RD$3,591,529.60, mientras que el monto contractual establecido es de RD$3,608,816.00, representando una diferencia de RD$17,286.40. Este aspecto se deja señalado para fines de control y referencia documental.

En conclusión, conforme a lo observado durante la visita de inspección, los trabajos presentan condiciones satisfactorias de ejecución, terminación y funcionalidad, verificándose en campo las principales partidas contempladas en el proyecto, incluyendo las aceras, contenes y el muro de contención en saco.

6. FOTOGRAFIAS DE LAS CALLES INTERVENIDAS

Entrada del Distrito Municipal (Cerro Pino)


Nombre de Calle: Principal



Entrada del Distrito Municipal (Cerro Pino)

Nombre de Calle: Principal



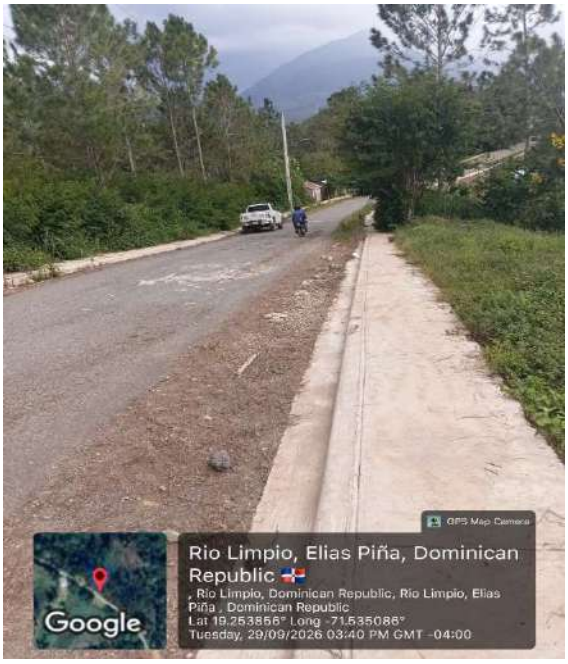


Entrada del Distrito Municipal (Cerro Pino)

Nombre de Calle: Principal



Entrada del Distrito Municipal (Cerro Pino)

Nombre de Calle: Principal

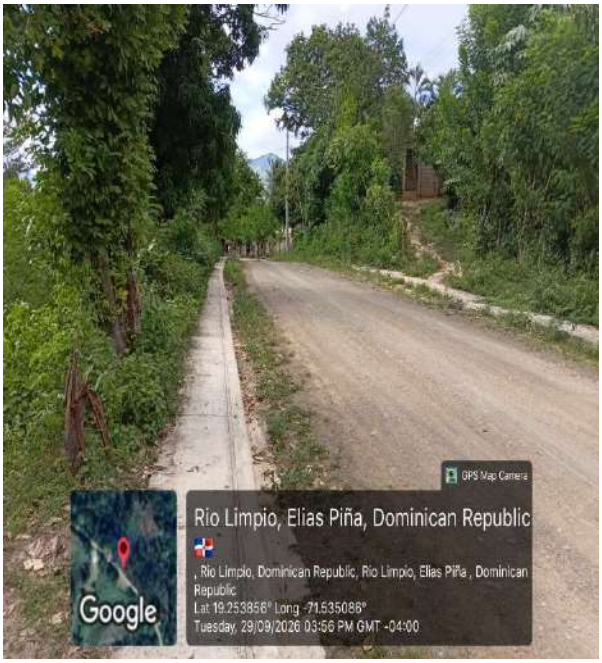



Entrada del Distrito Municipal (Cerro Pino)

Nombre de Calle: Principal



Las informaciones y otros insumos para la elaboración de este informe han sido suministrados por el gobierno local, en calidad de entidad ejecutora de los fondos transferidos desde el Ministerio de Hacienda y Economía para la ejecución de los proyectos de aceras y contenes, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26. El presente informe ha sido elaborado a requerimiento de Liga Municipal Dominicana, en calidad de entidad supervisora, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26.

Por la Liga Municipal Dominicana

Supervisor responsable del proyecto: STAYLIN MENDOZA HEREDIA

CODIA: 48530

Firma y sello: _____

