LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA

PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 25-26

INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACERAS Y CONTENES

CIERRE DE PROYECTO

Fecha de visita técnica: 17 de septiembre de 2026

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: CIBAO SUR
Provincia: SÁNCHEZ RAMÍREZ
Municipio: COTUÍ
Distrito Municipal: COMEDERO ARRIBA
Barrio y/o Sector: Comedero Arriba

2. CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre/Razón Social: MICHAEL CASTILLO FELIZ

RNC o Cédula: 402-223-40643-6

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

a. Construcción de aceras ☑
b. Construcción de contenes ☑
c. Reconstrucción de aceras ☐
d. Reconstrucción de contenes ☐
e. Construcción de obra conexa ☐ Especificar: _____
f. Reconstrucción de obra conexa ☐ Especificar: _____
g. Elementos de accesibilidad ☐ Especificar: _____
h. Arborización ☐

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Comedero

Nombre de Calle: Juan Sanchez Ramirez

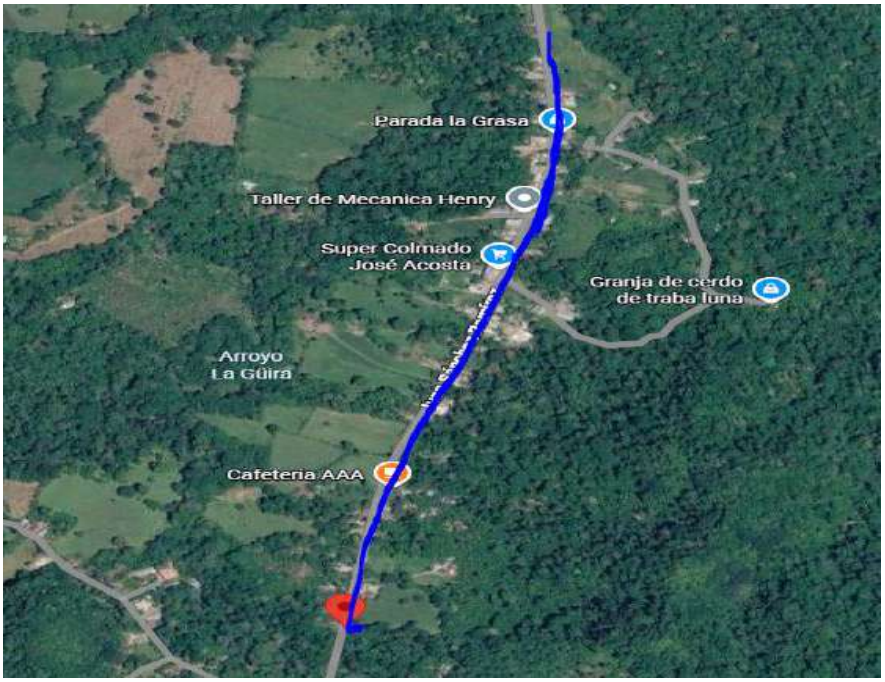

5. LEVANTAMIENTO

		INICIO		FINAL					
TRAMOS	BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE	LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (m^2)	TOTAL DE CONTENES (m)
Tramo A	Sector comedero arriba / Calle Juan Sanchez Ramirez (ambos lados)	19.028800	-70.315790	19.039400	-70.313590	1,047.90	0.99	1,040.44	1,088.70
Tramo B	Sector X / Calle A							0.00	
Tramo C								0.00	
Tramo D								0.00	
Total								**1,040.44**	**1,088.70**

Nota: Los tramos indicados como ***ambos lados*** tienen la volumetria de ambos lados de las aceras y/o contenes.
Ejecución fisica de obra 142.8% (estimado en base a las cantidades aceras y contenes, no incluye obras conexas ni partidas de terracería)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Las aceras y contenes ejecutados, cumplen con la terminación requerida, evidenciando una adecuada calidad en su ejecución.

CIERRE FISICO DE OBRA:

La obra presenta un 142.8%, correspondiente a la ejecución fisica:

Aceras: 1,040.44 m^2 ejecutados.

Contenes: 1,088.70 ml ejecutados.

6. FOTOGRAFIAS DE LAS CALLES INTERVENIDAS

Comedero

Nombre de Calle: Juan Sanchez Ramirez



Nombre de Calle: Juan Sanchez Ramirez





Nombre de Calle: Juan Sanchez Ramirez



Nombre de Calle: Juan Sanchez Ramirez





Las informaciones y otros insumos para la elaboración de este informe han sido suministrados por el gobierno local, en calidad de entidad ejecutora de los fondos transferidos desde el Ministerio de Hacienda y Economía para la ejecución de los proyectos de aceras y contenes, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26. El presente informe ha sido elaborado a requerimiento de Liga Municipal Dominicana, en calidad de entidad supervisora, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26.

Por la Liga Municipal Dominicana



Supervisor responsable del proyecto: RICHARD ENRIQUE CABRERA CLARA

CODIA: 28893

Firma y sello: _____
