LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA –

PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 25-26

INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACERAS Y CONTENES

CIERRE DE PROYECTO

Fecha de visita técnica: 5 de octubre de 2026

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: CIBAO NOROESTE
Provincia: MONTE CRISTI
Municipio: GUAYUBÍN
Distrito Municipal: VILLA ELISA
Barrio y/o Sector: Villa Lobos adentro y Hato del Medio

2. CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre/Razón Social: ING. ROBINSON DOMINGOESCARFULLER CONTRERAS

RNC o Cédula: 402-2432637-7


3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

a. Construcción de aceras ☑
b. Construcción de contenes ☑
c. Reconstrucción de aceras ☐
d. Reconstrucción de contenes ☐
e. Construcción de obra conexa ☐ Especificar: _____
f. Reconstrucción de obra conexa ☐ Especificar: _____
g. Elementos de accesibilidad ☐ Especificar: _____
h. Arborización ☐

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


Villa Lobo Adentro

Nombre de Calle: Carret. Villa Lobo

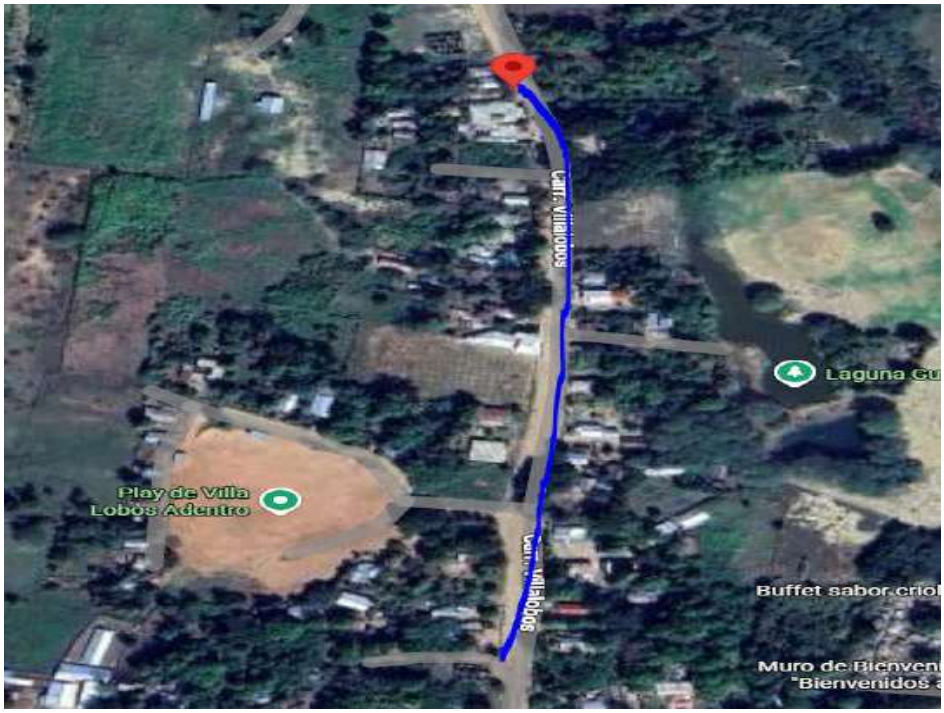

Hato del Medio

Nombre de Calle: Carret. Los limones

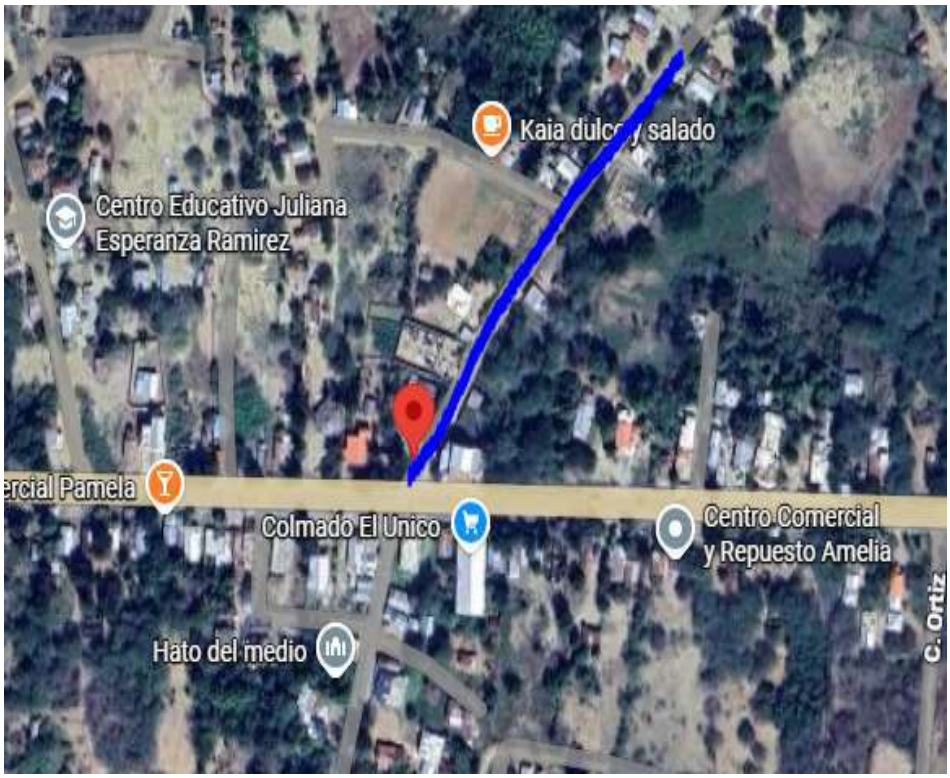

5. LEVANTAMIENTO

		INICIO		FINAL					
TRAMOS	BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE	LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (m^2)	TOTAL DE CONTENES (m)
Tramo A	Sector Villa Lobo adentro / Calle A (ambos lados)	19.678690	-71.283090	19.682050	-71.283030	770.00	0.91	703.57	879.00
Tramo B	Sector Hato del Medio / Calle A	19.694840	-71.315200	19.695850	-71.314470	301.70	1.24	373.75	301.70
Total								**1,077.32**	**1,180.70**

Nota: Los tramos indicados como ***ambos lados*** tienen la volumetria de ambos lados de las aceras y/o contenes.

Ejecución fisica de obra 107.8% (estimado en base a las cantidades aceras y contenes, no incluye obras conexas ni partidas de terracería)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Las aceras y contenes ejecutados, cumplen con la terminación requerida.

CIERRE FISICO DE OBRA:
La obra presenta un 107.8 %, correspondiente a la ejecución fisica:

Aceras: 1,077.32 m^2 ejecutados, con un ancho variable.

Contenes: 1,180.70 ml ejecutados.

6. FOTOGRAFIAS DE LAS CALLES INTERVENIDAS

Villa Lobo Adentro

Nombre de Calle: Carret. Villa Lobo



Nombre de Calle: Carret. Villa Lobo





Nombre de Calle: Carret. Villa Lobo



Hato del Medio

Nombre de Calle: carret. Los Limones



Nombre de Calle: carret. Los Limones



Las informaciones y otros insumos para la elaboración de este informe han sido suministrados por el gobierno local, en calidad de entidad ejecutora de los fondos transferidos desde el Ministerio de Hacienda y Economía para la ejecución de los proyectos de aceras y contenes, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26. El presente informe ha sido elaborado a requerimiento de Liga Municipal Dominicana, en calidad de entidad supervisora, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26.

Por la Liga Municipal Dominicana

Supervisor responsable del proyecto: RICHARD ENRIQUE CABRERA CLARA

CODIA: 28893

Firma y sello: _____
