LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA

PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 25-26

INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACERAS Y CONTENES

CIERRE DE PROYECTO

Fecha de visita técnica: 10 de septiembre de 2026

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: ENRIQUILLO
Provincia: INDEPENDENCIA
Municipio: MELLA
Distrito Municipal: LA COLONIA
Barrio y/o Sector: LA COLONIA Y JAPON

2. CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre/Razón Social: C&C SANTAFERRE, SRL

RNC o Cédula: 1-30-94564-2

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

a. Construcción de aceras ☐
b. Construcción de contenes ☑
c. Reconstrucción de aceras ☐
d. Reconstrucción de contenes ☐
e. Construcción de obra conexa ☐ Especificar: _____
f. Reconstrucción de obra conexa ☐ Especificar: _____
g. Elementos de accesibilidad ☐ Especificar: _____
h. Arborización ☐

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


D.M La Colonia

Nombre de Calle: frente al ayuntamiento; El Play; 2; 3; El Alto



LA COLONIA

Nombre de Calle: Frente al ayuntamiento; El Play; El Alto

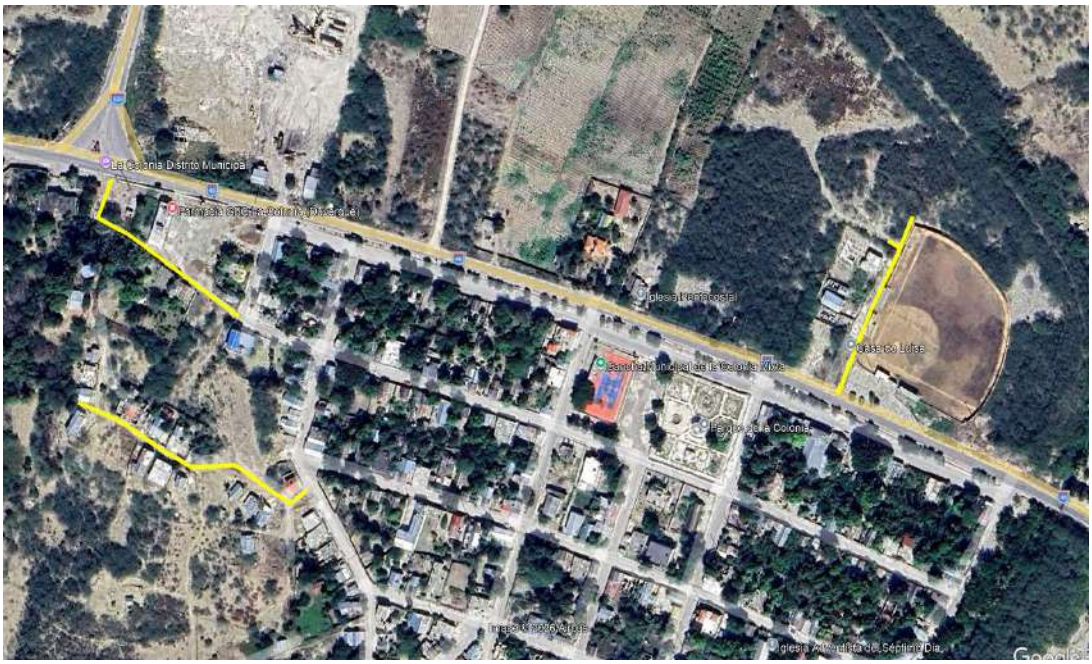

JAPON

Nombre de Calle: 2; 3



5. LEVANTAMIENTO

		INICIO		FINAL					
TRAMOS	BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE	LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (m^2)	TOTAL DE CONTENES (m)
Tramo A	La Colonia / Calle frente al ayuntamiento (ambos lados)	18.371328°	-71.454366°	18.370509°	-71.453504°			0.00	289.50
Tramo B	La Colonia / Calle El Play (ambos lados)	18.370050°	-71.449487°	18.371112°	-71.448979°			0.00	272.60
Tramo C	Japon / Calle 2 (ambos lados)	18.370041°	-71.446013°	18.370796°	-71.444445°			0.00	399.70
Tramo D	Japon / Calle 3 (ambos lados)	18.370675°	-71.444519°	18.370681°	-71.444871°			0.00	72.90
Tramo E	La Colonia / Calle El Alto (ambos lados)	18.369466°	-71.453055°	18.369982°	-71.454580°			0.00	368.00
Total								**0.00**	**1,402.70**

Nota: Los tramos indicados como ***ambos lados*** tienen la volumetria de ambos lados de las aceras y/o contenes.

Ejecución fisica de obra 107.9% (estimado en base a las cantidades aceras y contenes, no incluye obras conexas ni partidas de terracería)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la visita de inspección realizada el 10 de septiembre de 2026 en el Distrito Municipal La Colonia, Municipio de Mella, Provincia Independencia, se verificaron los trabajos correspondientes a la construcción de contenes. La obra contempla una cantidad contractual de 1,300.00 ML, con sección de 0.30 m de altura y 0.45 m de base, por un monto contratado de RD$3,463,347.59. La verificación física permitió constatar que, en términos generales, los trabajos ejecutados presentan condiciones acordes con las partidas contratadas y no se observaron deficiencias visibles en los elementos verificables sobre el nivel del terreno.

De la revisión documental y aritmética de las Cubicaciones No. 1, 2 y 3/Final, se comprobó que estas coinciden con lo establecido contractualmente, alcanzando 1,300.00 ML y el 100% del monto contratado. Asimismo, el cierre financiero presenta correspondencia con el monto contractual, con una diferencia de apenas RD$0.01 atribuible a redondeo.

Durante la verificación en campo se identificó un excedente físico de 102.00 ML de contenes, para un total observado de 1,402.00 ML, equivalente a un 7.85% por encima de la cantidad contratada y ya liquidada. Debido a que el contrato fue ejecutado y cerrado al 100%, este excedente queda fuera del alcance y pago del contrato, por lo que su tratamiento deberá ser asumido y formalizado separadamente por la institución contratante.

Los elementos de obra ubicados bajo el nivel del terreno no fueron verificables mediante inspección visual, al requerir ensayos específicos para su comprobación.

6. FOTOGRAFIAS DE LAS CALLES INTERVENIDAS

La Colonia


Nombre de Calle: Frente Al Ayuntamiento



La Colonia

Nombre de Calle: El Play



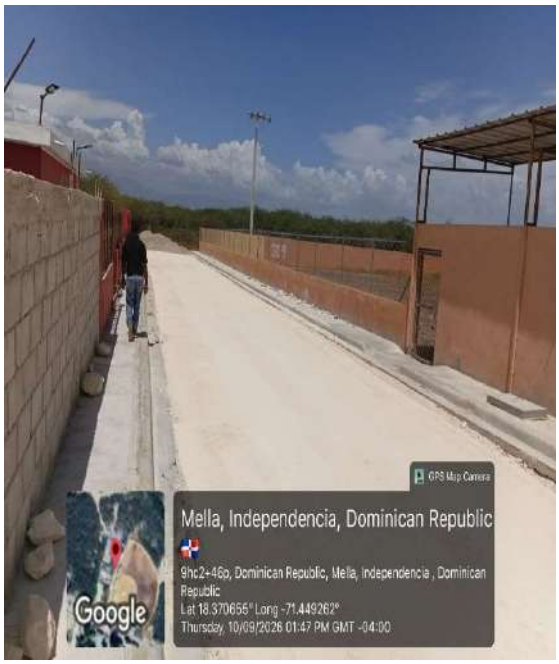

Japon

Nombre de Calle: 2



La Colonia

Nombre de Calle: El Alto





Las informaciones y otros insumos para la elaboración de este informe han sido suministrados por el gobierno local, en calidad de entidad ejecutora de los fondos transferidos desde el Ministerio de Hacienda y Economía para la ejecución de los proyectos de aceras y contenes, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26. El presente informe ha sido elaborado a requerimiento de Liga Municipal Dominicana, en calidad de entidad supervisora, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26.

Por la Liga Municipal Dominicana

Supervisor responsable del proyecto: STAYLIN MENDOZA HEREDIA

CODIA: 48530

Firma y sello: Staylin M. H.

