LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA

Santo Domingo, D.N.
15 de junio de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución del Factor**

La supervisión designada por el CODIA ha validado la ejecución de 6,310 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del "Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales".

La supervisión externa ha validado la ejecución de 1,205 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 7,515 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100 % o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Stephany E. Castro
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales

CODIA

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

INFORMES DE CIERRE DE PROYECTO (ACERAS Y CONTENES)

Quien suscribe, Jose Acosta, CODIA No. 15994, me dirijo a ustedes para informarles, que el gobierno local que mencionáremos a continuación, ha ejecutado el 100% o más de los volumetría según la proyección estimada para el proyecto de Aceras y Contenes, del programa de apoyo municipal de la Liga Municipal Dominicana a los gobiernos locales.

Este reporte de ejecución de cierre se realiza a partir del reporte de levantamiento suministrado.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: Trinidad Sanchez

MUNICIPIO: El Factor

DISTRITO MUNICIPAL:

BARRIO Y/O SECTOR:

IMAGENES


COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES
CODIA
SANTO DOMINGO, R.D.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	ANCHO DE LA CALLE (m)	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
Tramo A	Barrio Lindo					1333.90
Tramo B	Comunidad Barrio Nuevo					1015.80
Tramo C	Barrio PRD					880.30
Tramo D	—					1467.30
Tramo E	—					1032
Tramo F						580.7
Tramo G						
Tramo H						
Tramo I						
Tramo J						
Tramo K						
Tramo L						E. 6,310

Fecha de la visita técnica:

Firma del supervisor CODIA:



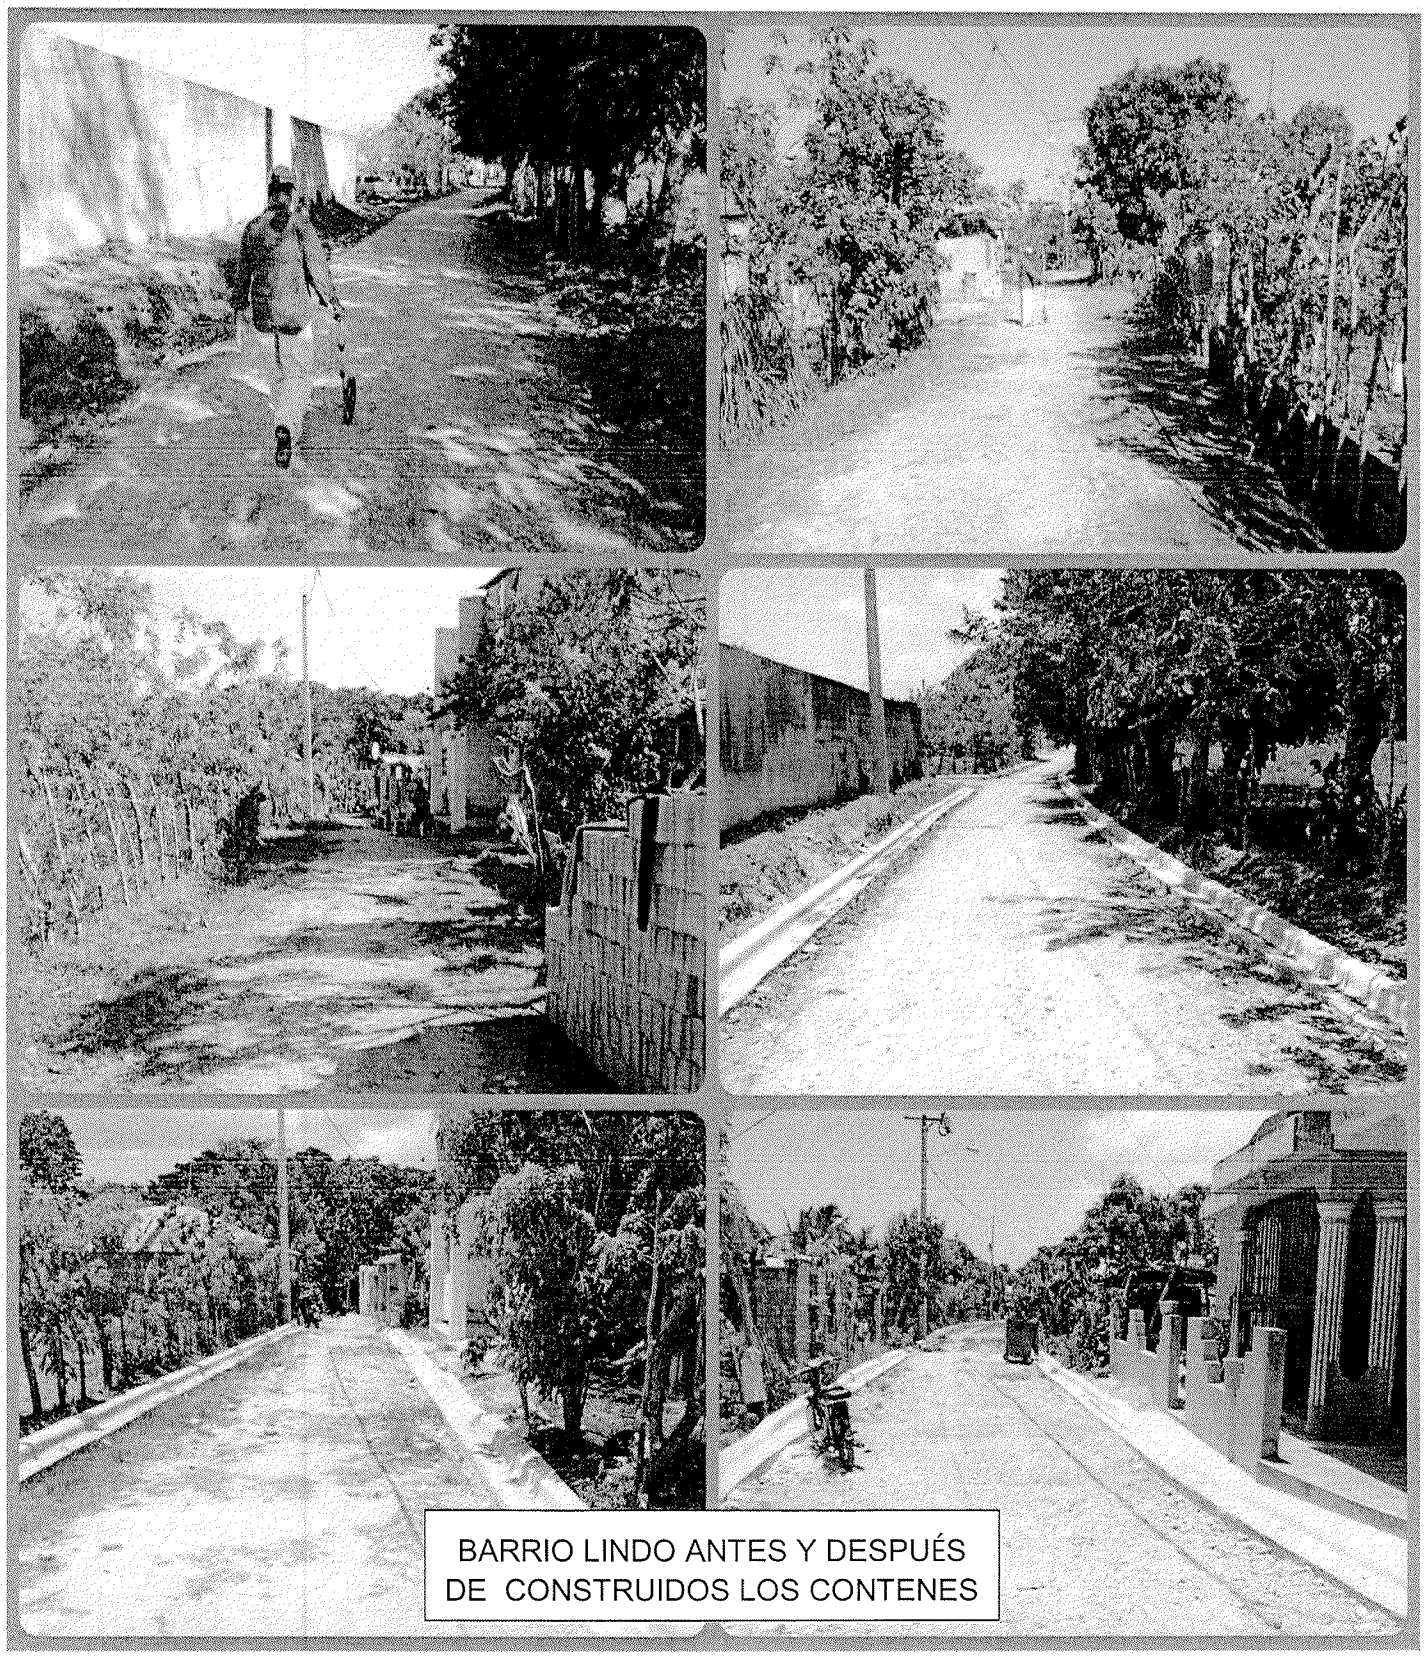

BARRIO LINDO ANTES Y DESPUÉS DE CONSTRUIDOS LOS CONTENES

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: MARIA TRINIDAD SANCHEZ

MUNICIPIO: EL FACTOR

DISTRITO MUNICIPAL: N/A

BARRIO Y/O SECTOR:

RESPALDO CALLE MELLA Y CARRETERA EL FACTOR-CASTILLO

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local [ ]
b. Contratista [X]

Razón Social
RNC ó Cédula:

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes: X
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes:
d. Otros:

CONSTRUCCION DE CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	CARRETERA EL FACTOR-CASTILLO	406379	2134448	406569	2135193			713	SIN ACERAS	713.00
Tramo B	S/N	406877	2136189	406960	2136155			87.00	"	174.00
Tramo C	S/N	406932	2136170	406899	2136250			99.00	"	198.00
Tramo D	S/N	406914	2136171	406905	2136146			25.00	"	50.00
Tramo E		406838	2136143	406837	2136104			35.00	"	70.00
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

1,205

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL FACTOR
R. D. Nacional

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO: Julio C. Espinosa Sp.

CÉDULA: 056 0014007-2

CODIA: 8831

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA: 03/05/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL FACTOR NAGUA, R.D.

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal


PT_final
PT_El Factor
PT_
PT_
PT_
El Factor
PT_
PT_final
PT_
PT_repaldo calle mella
Imagen © 2023 CNES / Airbus
Google Earth


PT_inicial
PT_713
PT_un lado el factor
Panadería Fotográfica Wanda Cabeiton El
ESTACIONAMIENTO SUCURSAL NAGUA
PT_final
PT_
Shell
Imagen © 2023 CNES / Airbus
Google Earth



