LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA–

Santo Domingo, D.N.
1ro de octubre de 2026

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución de El Cercado**

En la visita técnica realizada con fecha de 14 de octubre de 2022 se validó la ejecución de 1,639.78 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del "Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales".

La supervisión realizada por este departamento con fecha del 16 de septiembre de 2026 ha validado la ejecución de 935.80 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 2,575.58 metros lineales de contenes, lo que corresponde al 100% o más de la cantidad de trabajo requerido para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Elizabeth Garcia V.
Técnico
Dirección Asesoría Construcciones Municipales

LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 220301
REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: EL CERCADO
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14 de octubre de 2022
TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Rámirez
2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	BARRIO LO MAESTRO CALLE A				59.59	2		119.18
TRAMO B	BARRIO LO MAESTRO CALLE B				95.55	2		191.1
TRAMO C	BARRIO LO MAESTRO CALLE C				90.20	2		180.4
TRAMO D	BARRIO LO MAESTRO CALLE D				201.60	2		403.2
TRAMO E	BARRIO BROOKLIN (CALLE ONELIA MARIA MONTERO)				104	2		208
TRAMO F	CALLE PRINCIPAL				132.95	2		265.9
TRAMO G	CALLE A				90.9	2		181.8
TRAMO H	CALLE B				45.1	2		90.2
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							0.00	1639.78

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD$ 4,082,743.40
Monto desembolsado RD$ 4,082,743.41 (100%)
Avance de obra 100.71%

Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686

LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: EL CERCADO
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14 de octubre de 2022

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,639.78 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Este municipio construyó por contrato.
2. El alcalde nos informó que solo construyeron contenes para esperar el programa de asfaltado prometido.
3. Lo construido cumple con los parámetro recomendados por la institución.

IMÁGENES



Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686

LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA –

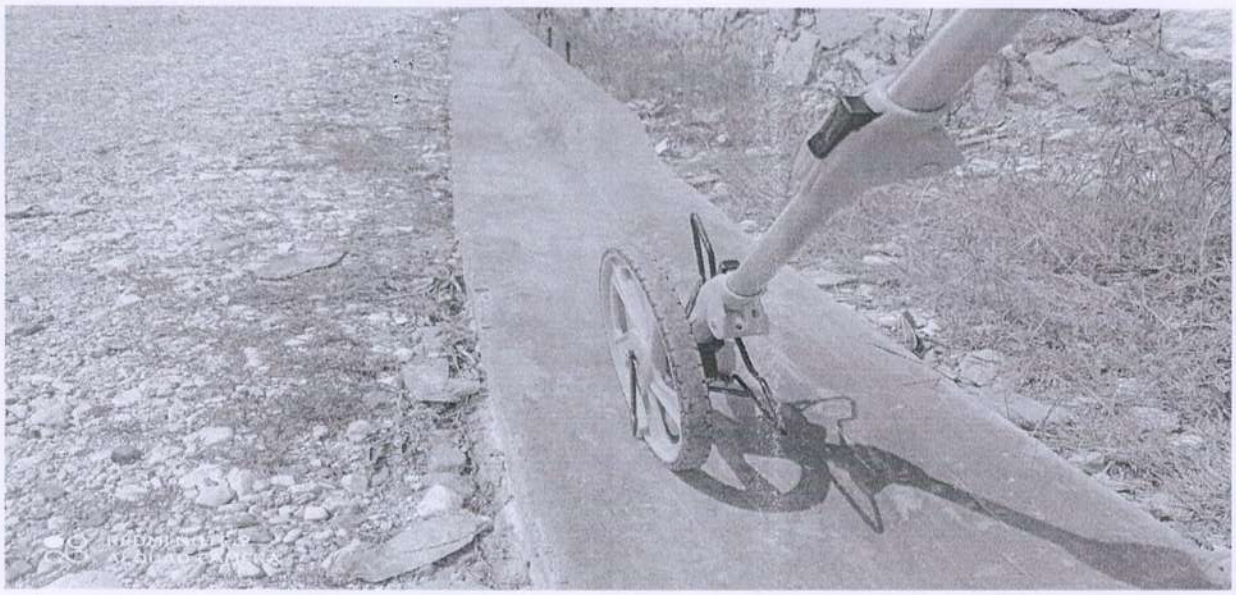

Suministra los datos de este reporte,

ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico

ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico

Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686

LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN DEL 3ER COMPONENTE

CODIGO: 220301
REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: EL CERCADO
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16 de septiembre de 2026
TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTIN MONTERO MONTERO				251.00	1		251
TRAMO B	CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTIN MONTERO MONTERO				116.00	1		116
TRAMO C	CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTIN MONTERO MONTERO				192.80	1		192.8
TRAMO D	CALLE DE LA PRIMARIA PROF. LEONEL MARIA MONTERO MONTERO				188.00	2		376
Total							**0.00**	**935.80**

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD$ 1,730,627.33
Monto desembolsado RD$ 1,730,627.33 (100%)
Avance de obra 135.59%

Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686

LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: EL CERCADO
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16 de septiembre de 2026

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN DEL 3ER COMPONENTE

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 935.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. LOS CONTENES CONSTRUIDOS EN LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTÍN MONTERO MONTERO FUERON EJECUTADOS CON FONDOS PROPIOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, EVIDENCIÁNDOSE DURANTE LA VISITA DE INSPECCIÓN UNA MUY BUENA CALIDAD VISUAL Y UN ACABADO GENERAL SATISFACTORIO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

2. LOS CONTENES CONSTRUIDOS EN EL OTRO TRAMO FUERON EJECUTADOS DURANTE LA GESTIÓN ANTERIOR DEL AYUNTAMIENTO. PARA ESE ENTONCES, LOS TRABAJOS NO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD; NO OBSTANTE, DURANTE LA VISITA DE INSPECCIÓN SE VERIFICÓ QUE LOS CONTENES EXISTENTES AÚN SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES FUNCIONALES Y CUMPLEN CON SU PROPÓSITO.

IMÁGENES





Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686
