LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA

PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 25-26

INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACERAS Y CONTENES

CIERRE DE PROYECTO

Fecha de visita técnica: 7 de septiembre de 2026

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: CIBAO NORDESTE
Provincia: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
Municipio: NAGUA
Distrito Municipal: LAS GORDAS
Barrio y/o Sector: LOS RINCONES DE BOBA Y MATA BONITA

2. CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre/Razón Social: NATANAEL AURELIO GUZMÁN CRUZ

RNC o Cédula: 071-0039575-0


3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

- [x] a. Construcción de aceras
- [x] b. Construcción de contenes
- [ ] c. Reconstrucción de aceras
- [ ] d. Reconstrucción de contenes
- [x] e. Construcción de obra conexa — Especificar: BADÉN
- [ ] f. Reconstrucción de obra conexa — Especificar:
- [ ] g. Elementos de accesibilidad — Especificar:
- [ ] h. Arborización

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Mata Bonita

Nombre de Calle: s/n

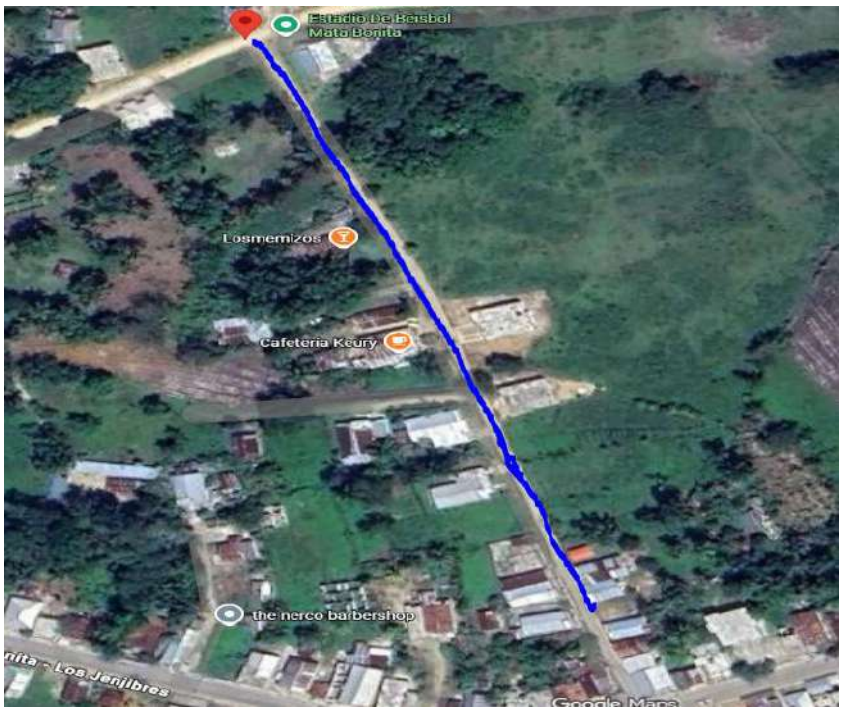


INICIO
19.44427
-70.02433

FINAL
19.44636
-70.02521

Los Rincones de Boba

Nombre de Calle: s/n

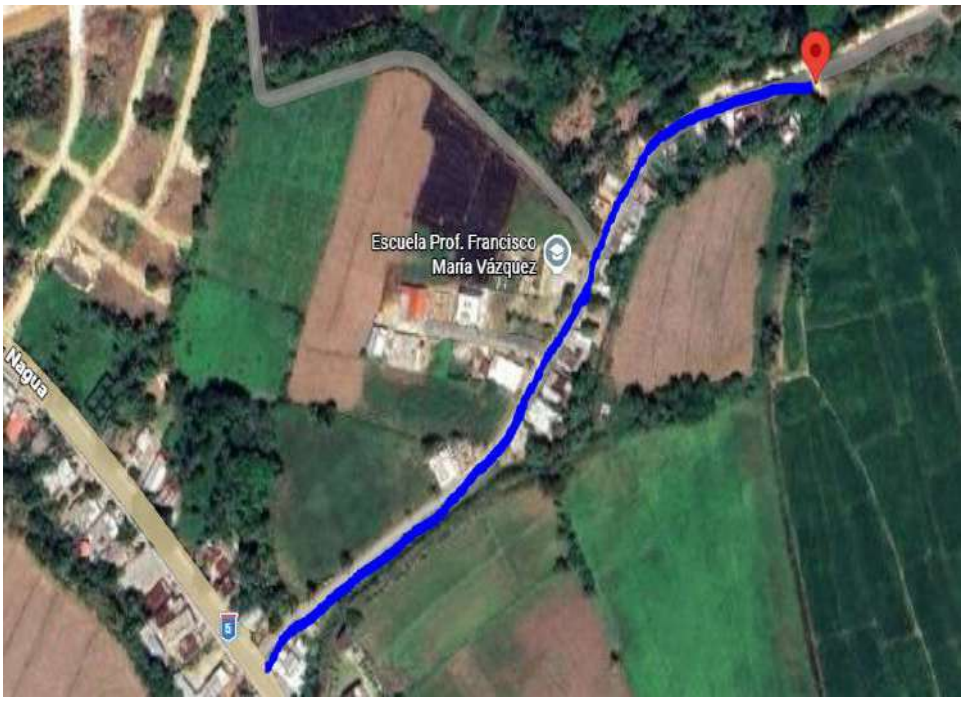

INICIO
19.46695
-69.89149

FINAL
19.46939
-69.88839

5. LEVANTAMIENTO

		INICIO		FINAL					
TRAMOS	BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE	LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (m^2)	TOTAL DE CONTENES (m)
Tramo A	Comunidad de Mata Bonita / Calle A (ambos lados)	19.444270	-70.024330	19.446360	-70.025210	0.00	1.00	0.00	630.40
Tramo B	Sector los Rincones / Calle A	19.466950	-69.891490	19.469390	-69.888390	0.00	1.00	0.00	980.90
Tramo C								0.00	
Tramo D								0.00	
Tramo AH								0.00	
Total								**0.00**	**1,611.30**

Nota: Los tramos indicados como ***ambos lados*** tienen la volumetria de ambos lados de las aceras y/o contenes.

Ejecución fisica de obra 115.1% (estimado en base a las cantidades aceras y contenes, no incluye obras conexas ni partidas de terracería)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIÓN: El presupuesto presenta todos los impuesto de ley incluido.

Cierre de Obra:
Los contenes se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas y a la ficha de referencia constructiva establecida. La obra presenta un cierre físico aproximado del 115.1%

6. FOTOGRAFIAS DE LAS CALLES INTERVENIDAS

Mata Bonita

Nombre de Calle: S/N



Nombre de Calle: S/N



Los Rincones de Boba

Nombre de Calle: S/N



Las informaciones y otros insumos para la elaboración de este informe han sido suministrados por el gobierno local, en calidad de entidad ejecutora de los fondos transferidos desde el Ministerio de Hacienda y Economía para la ejecución de los proyectos de aceras y contenes, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26. El presente informe ha sido elaborado a requerimiento de Liga Municipal Dominicana, en calidad de entidad supervisora, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26.

Por la Liga Municipal Dominicana

Supervisor responsable del proyecto: RICHARD ENRIQUE CABRERA CLARA

CODIA: 28893

Firma y sello: _____

